

EOE 4.2: Incrementar la infraestructura física, tecnológica, informática y el equipamiento necesarios de manera integral en función de la nueva estructura organizacional de la Institución.

META

Incrementar en un 15% de la infraestructura física y la calidad de la misma.

PRODUCTOS

La institución desarrolla su infraestructura física con espacios físicos adecuados y seguros para el desarrollo de las actividades académicas y otras actividades institucionales, atendiendo las necesidades especiales de personas con discapacidad. En el 2019 se ejecutó los siguientes procesos de infraestructura que se encuentran brindando el servicio a toda la Comunidad Universitaria:

Obras de Infraestructura	Monto presupuestado 2019	Descripción	TIPO DE INVERSIÓN
<p>1. Construcción del edificio del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la UNACH</p>	<p>Proyecto en ejecución: (Monto de anticipo) \$1.661.260,7042</p> <p>(Ejecutado de julio a diciembre 2019): \$806.858,24</p> <p>Pagado por incrementos y reajuste de precios: \$43.170,00</p>	<p>Un edificio de 8 pisos + un subsuelo.</p> <p>Planta Subsuelo: 2 bodegas generales y 1 bodega de libros</p> <p>Planta baja: 4 laboratorios (Estimulación Temprana, Química, Biología y Física Matemática)</p> <p>Tercera planta alta: 4 aulas de 30, 1 aula de 40, 1 aula de 15, 1 Oficina de Mantenimiento y monitoreo y 1 Cuarto de telecomunicaciones.</p> <p>Plantas altas 1 a la 6: 20 aulas de 30, 5 aulas de 25, 5 aulas de 40 y 1 oficina.</p> <p>Planta alta 7: 52 cubículos para profesores.</p> <p>Todas las plantas tienen baterías sanitarias para mujeres, hombres y personas con capacidades reducidas.</p>	

2. Liquidación del proyecto de infraestructura: Adecuaciones Nave y Casa del Rosario

Monto presupuestado:
10.704,19

Monto ejecutado:
10.704,19

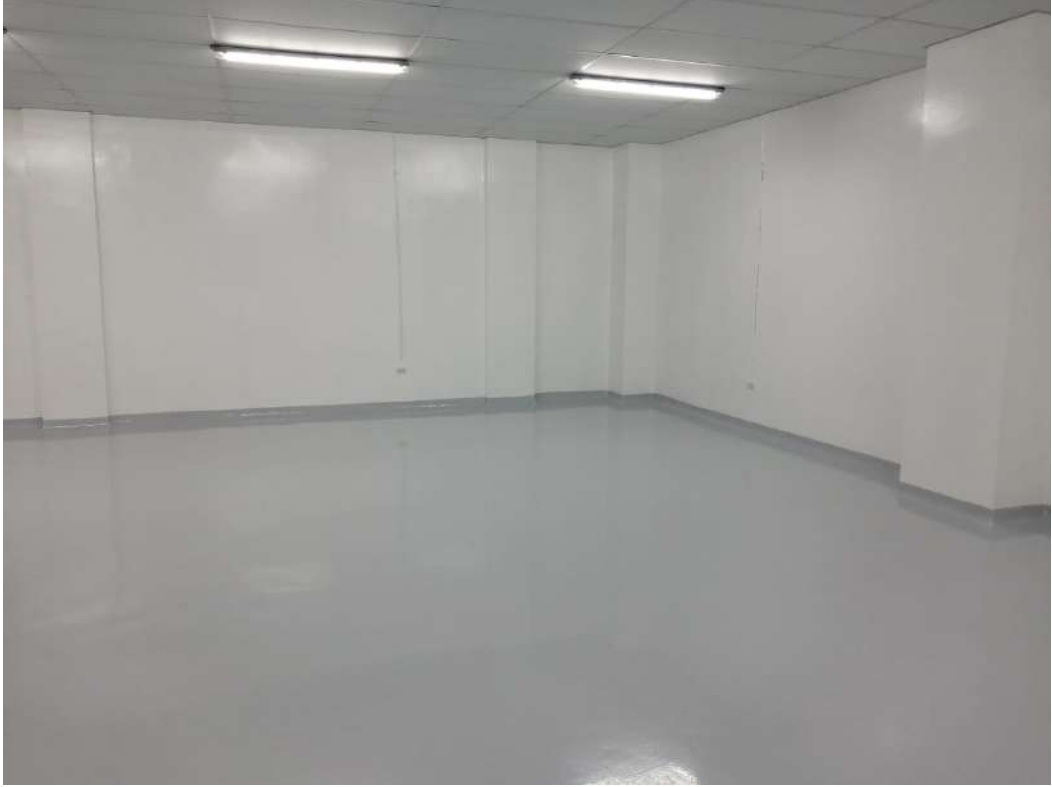
Se liquidaron en su totalidad pagos pendientes correspondientes a esta obra de infraestructura del año 2018:
- Pago de la planilla 2 de liquidación: 10.021,26 USD
- Pago de rubros nuevos (costo + porcentaje) y reajuste: 682,76 USD



<p>3. Liquidación del proyecto de infraestructura : Casa de la Juventud Soñadora</p>	<p>Monto presupuestado: 29.865,50</p> <p>Monto ejecutado: 28.627,82</p>	<p>Se liquidaron en su totalidad pagos pendientes correspondientes a esta obra de infraestructura del año 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pago de la planilla 4 de liquidación: 12.979,53 USD - Pago del contrato complementario N°027-P-UNACH-2019: 3.460,33 USD - Pago de diferencias de cantidades de obras contrato principal: 2.936,26 USD - Pago de planilla (costo + porcentaje): 1.174,50 USD - Pago del contrato principal: 8.077,2 USD 	
<p>Construcción de Parqueaderos y caminerías para el edificio del Bar Comedor Saludable</p>	<p>Monto presupuestado: 57.089,89</p> <p>Monto ejecutado: 31.714,36</p>	<p>Parqueaderos en un área de 1142,25 m2</p> <p>Caminerías en un área de 216,54 m2, proyecto diseñado para complementar la funcionalidad del edificio del Bar Comedor Saludable.</p>	

			
<p>Construcción Nave Taller de Mantenimiento</p>	<p>Monto presupuestado: 67.197,65</p> <p>Monto ejecutado: 61.178,08</p>	<p>Edificio de 1 piso en estructura metálica, con un área de construcción de 630 m2, cubierta de galvalumen y techo translucido, que consta de 1 oficina y espacios destinados para bodega, construido para satisfacer las necesidades del personal de mantenimiento.</p>	

			
<p>Adecuación del Archivo Institucional de la UNACH</p>	<p>Monto presupuestado: 66.971,62</p> <p>Monto ejecutado: 48.571,62</p>	<p>Adecuaciones realizadas en el archivo Institucional del subsuelo del edificio del Bloque L:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colocación de revestimiento con resina epóxica en pisos, muros y losa. - Instalación de cielo raso en 5 bodegas. - Colocación de pisos de cerámica en el corredor. - Mampostería de bloque y Enlucido de estructuras - Colocación de ventanas, persianas, revestimientos en ductos de agua, protección de instalaciones eléctricas, escritorios y estantería. 	

			
<p>Realización del estudio y diseño del Proyecto de Construcción "Laboratorios de Ingeniería de la UNACH 2018" y liquidación del proyecto.</p>	<p>Monto presupuestado: 1'235.041,15</p> <p>Monto ejecutado: 1'235.041,15</p>	<p>1 Estudio para la construcción de los Laboratorios de Ingeniería, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudio Económico - Estudio Ambiental - Estudio de Suelos - Estudio Topográfico - Estudio Arquitectónico - Estudio Estructural - Estudio Hidrosanitario - Estudio Electrónico - Estudio Eléctrico - Detalles Constructivos 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto de obra - Perspectivas - Especificaciones Técnicas <p>Descripción: Proyecto a desarrollarse en un área de 2800.00 m2; consta de 2 naves:</p> <p>1 nave de una planta para Laboratorios de Ingeniería Industrial (área: 344,50 m2) consta de: 1 laboratorio de operaciones unitarias, área CNC, área de máquinas y herramientas, oficina + baño, bodega, lockers y área de circulación, paredes y baños compartidos.</p> <p>Ingeniería Agroindustrial (área: 674,50 m2), consta de: 1 laboratorio de calidad y microbiología + bodega, oficina + baño, 4 áreas tecnificadas, cuarto frío, cuarto de maduración, bodega, área de circulación, paredes y baños compartidos.</p> <p>1 nave de dos plantas para los Laboratorios de Ingeniería Civil con un área de 744.50 m2, consta de: laboratorios geotécnico y topográfico, 6 áreas tecnificadas, 1 aula, bodega, baterías sanitarias, áreas de circulación y un subsuelo de área de 35,93 m2.</p> <p>1 Cuarto de máquinas (área de 27.00 m2)</p> <p>Área total de intervención proyectada: 2446.00 m2.</p>	
<p>Ejecución y liquidación del estudio y diseño del Proyecto de Construcción "Laboratorios de Salud de la UNACH "</p>	<p>Monto presupuestado: 2'342.897,59</p> <p>Monto ejecutado: 2'342.897,59</p>	<p>1 Estudio para la construcción de los Laboratorios de Ingeniería, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudio Económico - Estudio Ambiental - Estudio de Suelos - Estudio Topográfico - Estudio Arquitectónico - Estudio Estructural - Estudio Hidrosanitario - Estudio Electrónico 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Estudio Eléctrico - Estudio Mecánico - Detalles Constructivos - Presupuesto de obra - Perspectivas - Especificaciones Técnicas <p>Descripción: Proyecto a desarrollarse en un área de 1850.00 m2; consta de un edificio de 3 plantas:</p> <p>Planta baja: clínica odontológica (50 sillas), dispensario médico, sala de espera, cubículo de información, cuarto de esterilización, cuarto de quirófano, cuarto de desechos, baños y ascensor.</p> <p>Segunda planta: Laboratorio de microbiología, sala de lectura, laboratorio de prótesis, laboratorio de biomateriales, sala de capacitación, auditorio para 150 personas, sala de profesores, sala de simuladores, sala de patología, cuarto de telecomunicaciones copiadora, baños y ascensor.</p> <p>Tercera Planta: 10 aulas, sala de profesores, baños y ascensor.</p>	 <p style="text-align: right;">LABORATORIOS DE SALUD - ESCUELA DE ODONTOLOGIA - UNACH CAMPUS NORTE</p>
Contratación del servicio de mantenimiento de ocho ascensores incluye repuestos y accesorios de la Universidad Nacional de Chimborazo	Monto presupuestado: 12.916,36 Monto ejecutado: 12.916,36	Mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de la Universidad Nacional de Chimborazo campus norte y campus dolorosa entre los cuales son: Bloque administrativo, Ciencias de la Salud, Ciencias Políticas y Administrativas, Ingeniería, y campus la Dolorosa.	

