



UNACH
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación
Instituto de Investigaciones ICITS

PROYECTO: I012 Generación de saberes locales- sistema de gestión de conocimiento de la provincia

Table with project details including: Líder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, Objetivos Operativos, Viabilidad Técnica, Tipo de Ppto. Externo, Fecha de Última Actualización, Modificado por, Programas Relacionados, Prioridad, Retorno Económico, TIR, VAN, Estimado Al Fin Del Proyecto, Fecha de Inicio - Fecha de Fin, Fecha de Fin Base, Fecha del siguiente Hito.


DATOS GENERALES

Table with sections: Descripción (SITUACIÓN ACTUAL, PROPÓSITO, COMPONENTES), Beneficios Cualitativos, Restricciones (COSTO, TIEMPO, ALCANCE).

Progress bar showing phases: Fase Actual, Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución (highlighted), Cierre, Completado, Congelado, Cancelado.


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.51 %
Fecha de Inicio: 02/05/2013 Fecha de Fin: 31/07/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

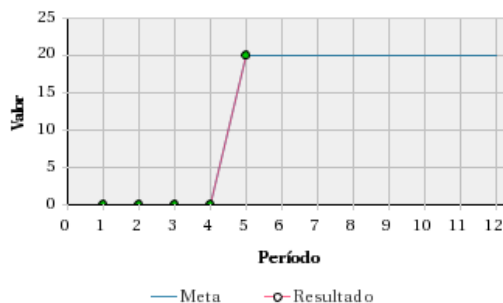

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
	Avance real acumulado											
	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %							
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
diciembre: fueron instalados los equipos, El equipo técnico destinado al proyecto fue asignado a otras funciones en la institución	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:49 PM
noviembre: fueron cancelados los equipos	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:48 PM
octubre: El equipo técnico destinado al proyecto fue asignado a otras funciones en la institución	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:48 PM
mayo a septiembre: El equipo técnico destinado al proyecto fue asignado a otras funciones en la institución	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:47 PM
"Generación de Saberes Locales" es un programa de largo plazo para insertar a la Universidad en los procesos de gestión de conocimiento de la provincia de Chimborazo. Constituir a la Universidad en un centro especializado en la obtención, creación, organización, capitalización y difusión del conocimiento en el territorio.	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:46 PM




Problemas cerrados: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Organizacional.9. Otros. Daño en redes y sistemas informáticos de la UNACH CAUSARÍA la imposibilidad de poner en funcionamiento el sistema que se plantea realizar	08/05/2014	Ronny Santiago Echeverría Benalcazar	20 %	50	10	1/1
2	Organizacional.9. Otros. La UNACH no asume la operación del Sistema de Gestión del Conocimiento CAUSARÍA la imposibilidad de operar del proyecto	08/05/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	10 %	70	7	0/1
3	Organizacional.4. Jurídico. No se establece la normativa para el uso del Sistema de Gestión de Conocimiento CAUSARÍA dificultades en la incorporación del Sistema a la actividad académica e investigativas de la Institución	08/05/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	10 %	70	7	0/1

Riesgos cerrados: 0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Equipamiento IMPLEMENTADO	4. Ejecución	31/05/2014		31/05/2014		Sí	20.0
2	Base de datos en ACTIVADA	4. Ejecución	30/06/2015	30/06/2015			No	50.0
3	Página web del Sistema HABILITADA	5. Cierre	30/07/2015	30/07/2015			No	30.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de proyectos de investigación incorporados al sistema	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2014	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	83,668.92 **
Costo Total:	138,553.92
Total Devengado:	61,471.20
% Costo Total Devengado:	44.37 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 44.37 %

Perfil Económico 2014

	Años Previos	Año Actual (2014)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	71,811.80	11,857.12	83,668.92
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	71,811.80	11,857.12	83,668.92
Ppto. Codificado	0.00	71,811.80	0.00	71,811.80
Planeado - Codificado (2014)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	71,811.80	0.00	71,811.80
Ppto. Devengado	0.00	61,471.20	0.00	61,471.20
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	71,811.80	0.00	71,811.80
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	85.60 %	0.00 %	85.60 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2014

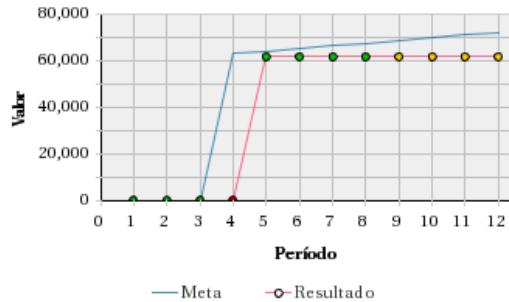

Presupuesto Mensual 2014

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Abr	62,817.34	0.00	62,817.34	0.00	0.00 %	●	0.00 %
May	1,124.31	61,471.20	63,941.65	61,471.20	96.14 %	●	85.60 %

Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	1,124.31	0.00	65,065.96	61,471.20	94.48 %		85.60 %
Jul	1,124.31	0.00	66,190.27	61,471.20	92.87 %		85.60 %
Ago	1,124.30	0.00	67,314.57	61,471.20	91.32 %		85.60 %
Sep	1,124.31	0.00	68,438.88	61,471.20	89.82 %		85.60 %
Oct	1,124.31	0.00	69,563.19	61,471.20	88.37 %		85.60 %
Nov	1,124.30	0.00	70,687.49	61,471.20	86.96 %		85.60 %
Dic	1,124.31	0.00	71,811.80	61,471.20	85.60 %		85.60 %
Total	71,811.80	61,471.20					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos.
4	Incrementar el rigor científico de los resultados del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional, la implementación del Reglamento de Movilidad Docente y la implementación del Reglamento para la Selección de Profesionales con Titulación PhD.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Evidencias_de_equipamiento_.rar	Evidencia de Recepción de equipamiento informático	06/06/2014
2	PÁGINA_WEB_SISTEMA.pdf	PAGINA WEB SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	20/11/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	Director del proyecto
