

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

<b>* Campo requerido</b>	
<b>Tipo de Programa:</b>	<b>*</b> Institucionales ▼
<b>CUP:</b>	91800000.1214.7354
<b>Programa:</b>	<b>*</b> Acreditación Institucional
<b>Fecha de Inicio:</b>	<b>*</b> 01/05/2014 📅 (dd/mm/aaaa)
<b>Fecha de Fin:</b>	<b>*</b> 31/12/2016 📅 (dd/mm/aaaa)
<b>Gerente del Programa:</b>	<b>*</b> Paula Aguayo, Geovanny Marcelo ▼
<b>Entidad Responsable:</b>	UNACH
<b>Propósito del Programa:</b>	<b>*</b> Financiar un grupo de proyectos del plan de mejoras
<b>Beneficios del Programa:</b>	<b>*</b> Buscar la reacreditación de la UNACH.
<b>Beneficiarios:</b>	<b>*</b>

Comunidad Universitaria

**Supuestos y restricciones  
para la administración del  
programa:**

Cumplimiento total de todos los componentes del programa Acreditación institucional:

- C7. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicación de Libros
- C8. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS: Compra de libros - Bibliotecas virtuales.
- C9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicaciones indexadas, Servicio de Capacitación, Pasajes al exterior, Viáticos y subsistencias al exterior.
- C10. CONTRATACIÓN PHD
- C11. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación

**Fecha de última  
actualización:**

09/05/2016 (dd/mm/aaaa)

**Modificado por:**

Argüello Merino, Verónica del Pilar

Regresar

Aceptar

Ficha Descriptiva

**Ejecución**

Perfil Económico


TIR/VAN

Archivos anexos


Participantes

Proyectos


**Programa:** Acreditación Institucional  
**Fecha de Inicio:** 01/05/2014  
**Fecha de Fin:** 31/12/2016



Transcurrido: 78.59 %



Avance real acumulado: 88.88 %



% Costo Total Devengado: 0.0

Mostrar Resúmenes Ejecutivos

**Proyectos a incluir:**

**ATENCIÓN:** Existen proyectos con fechas de inicio/fin fuera de las del programa. Se marcan con el nombre en ROJO. Revise la ficha correspondiente para mayor detalle.

\* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

# Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización	No.	Proyecto	Fase Actual	2014 →	2015 →	2016 →	Ponderación	Avance Ponderado	Ficha Informativa de Proyecto
Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Ejecución	44.0 44.0 	80.0 75.0 	100.0 75.0 <input type="checkbox"/>	0.0376	2.82 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	Ejecución	32.0 32.0 	100.0 100.0 	100.0 100.0 <input type="checkbox"/>	0.5778	57.78 %	
Vicerrectorado Administrativo	I003	Reestructuración de perfiles y puestos	Ejecución	60.0	100.0		0.0000	0.00 %	

>Departamento de Administración de Talento Humano		de los servidores universitarios. 01/04/2014 - 29/05/2015		60.0 	60.0 <input type="checkbox"/>				
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I004	Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución. 02/01/2014 - 30/04/2015	Ejecución	60.0 	100.0 60.0 <input type="checkbox"/>		0.0001	0.00 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005	Contrato Docentes Facultades 01/03/2014 - 31/12/2014	Ejecución	100.0 84.0 			0.2777	23.33 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	Ejecución	70.0 70.0 	100.0 100.0 		0.0105	1.05 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Ejecución	75.0 25.0 	75.0 25.0 <input type="checkbox"/>	100.0 25.0 <input type="checkbox"/>	0.0019	0.05 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	Ejecución	50.0 50.0 	100.0 75.0 	100.0 75.0 <input type="checkbox"/>	0.0944	7.08 %	
							1.00	92.11 %	

8 Registro(s) en total.

Duración Promedio: 21 meses Máxima: 32 meses Mínima: 10 meses

[Regresar](#)

 Organización: UNACH | Titular: Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay

 Menú |  Gestión de Programas |  Gestión de Programas



Ficha Descriptiva

Ejecución

**Perfil Económico**

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

**Programa:** Acreditación Institucional  
**Fecha de Inicio:** 01/05/2014  
**Fecha de Fin:** 31/12/2016

**Costo Total:**

**Perfil económico del Programa**

AÑO	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado
2014 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Proyectos a incluir:**

**Perfil económico de los proyectos afiliados**

Año	Proyectos	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado	Estimado a fin de año	Variación (Prog. - Est.)
2014	8	6,497,413.57	4,477,413.57	0.00	4,307,413.57	2,227,903.82	0.00	4,177,413.57
2015	7	1,267,174.63	1,017,174.63	0.00	1,267,174.63	610,001.49	0.00	0.00
2016	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>7,824,588.20</b>	<b>5,494,588.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,574,588.20</b>	<b>2,837,905.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4,177,413.57</b>

**Programa**

**Proyectos Afiliados  
(Inversión)**

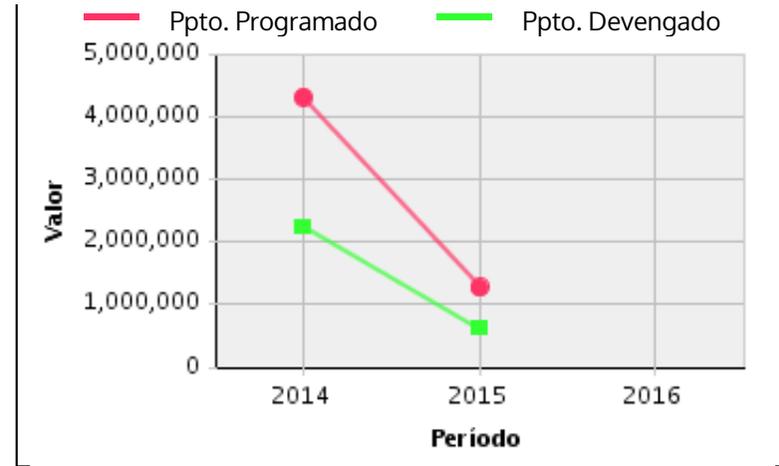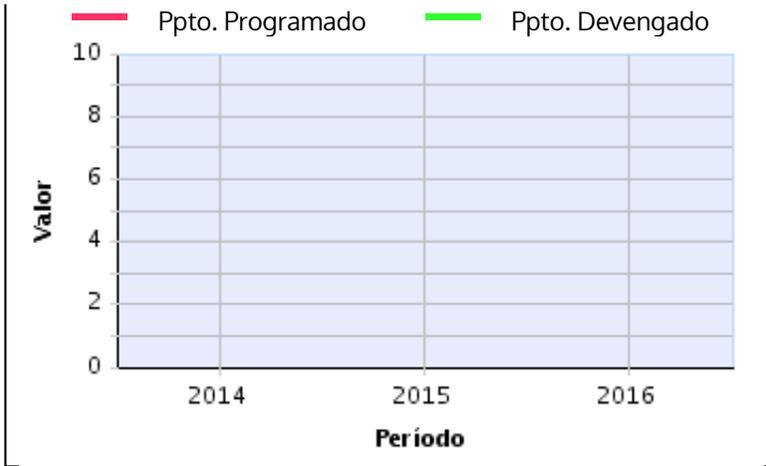

Diferencias entre el programa y los proyectos afiliados					
Año	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado
2014	-6,497,413.57	-4,477,413.57	0.00	-4,307,413.57	-2,227,903.82
2015	-1,267,174.63	-1,017,174.63	0.00	-1,267,174.63	-610,001.49
2016	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	-7,824,588.20	-5,494,588.20	0.00	-5,574,588.20	-2,837,905.31

Regresar

Aceptar

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

**TIR/VAN**

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

**Programa:** Acreditación Institucional  
**Fecha de Inicio:** 01/05/2014  
**Fecha de Fin:** 31/12/2016

**Proyectos a incluir:**

\* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual  
 # Proyectos alineados a objetivos matriciales

<u>Organización</u> 	No.	<u>Proyecto</u>	Año Inicial	Año Final	Tipo de Ppto. Externo	<u>Costo Total</u>	<u>TIR</u>	<u>VAN</u>
Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	2014	2016		200,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	2014	2016	Recursos Propios	2,400,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I003	Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios.	2014	2015	Recursos Propios	0.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I004	Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución.	2014	2015	Recursos Propios	0.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005	Contrato Docentes Facultades	2014	2014	Recursos Propios	3,687,413.57	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	2014	2015		70,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	2014	2016		10,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	2014	2016		505,000.00	0.00 %	0.00
<b>Total</b>			2014	2016		6,872,413.57	0.00 %	

8 Registro(s) en total.

[Regresar](#)

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

Programa: Acreditación Institucional  
Fecha de Inicio: 01/05/2014  
Fecha de Fin: 31/12/2016

Año: 2016 ▼

Tipo de seguimiento: Físico ▼

Proyectos a incluir: Inversión ▼

Fase Actual: Ver Todos ▼

Organización 	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de Avance	Fase Actual	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Indicadores				Detalle 
													
UNACH >Dirección de Planificación	1001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Argüello Merino, Verónica del Pilar	0.00 % <input type="checkbox"/>	75.00 % <input type="checkbox"/> 	Ejecución	01/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	1002	Contratación PhD	Reyes Silva, Carlos Patricio	0.00 % <input type="checkbox"/>	100.00 % <input type="checkbox"/> 	Ejecución	01/05/2014	31/12/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	1024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 % <input type="checkbox"/>	25.00 % <input type="checkbox"/> 	Ejecución	01/05/2014	30/05/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	1034	PM Mejoramiento de la producción científica	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 % <input type="checkbox"/>	75.00 % <input type="checkbox"/> 	Ejecución	05/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	

0.00 %

0 0 0 0

4 Registro(s) en total.

[Regresar](#)



UNACH

Dirección de Planificación

PROYECTO: 1001 PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales

Table with project details including Lider del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, Objetivos Operativos, Viabilidad Técnica, Tipo de Ppto. Externo, Fecha de última actualización, Modificado por, Programas Relacionados, Prioridad, Retorno Económico, TIR, VAN, Estimado Al Fin Del Proyecto, Fecha de Inicio - Fecha de Fin, Fecha de Fin Base, and Fecha del siguiente Hito.

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACIÓN ACTUAL:

La Universidad Nacional de Chimborazo maneja una estructura jerárquica funcional en la que cada dependencia ha organizado la gestión de sus competencias acorde a sus propias necesidades y criterios.

PROPOSITO: Planificar, implementar y brindar directrices sobre actividades de medición, análisis y seguimiento en los procesos, actividades y resultados del Sistema de Gestión Integral de la Calidad

PRODUCTO: Consolidar las acciones de mejoramiento necesarias para prevenir o corregir las posibles desviaciones y mejorar el desempeño institucional, basado en una gestión por procesos unificada y operativa.

Beneficios Cualitativos

- Mejorar y alinear la realidad operacional al direccionamiento estratégico de la UNACH
Mejorar la ejecución del presupuesto y la calidad del gasto
Mejorar la calidad de los insumos para la toma de decisiones
Enfocar a la administración de la UNACH en las áreas de mayor urgencia e importancia de mejora
Iniciar el desmantelamiento de los procesos burocráticos
Fomentar el trabajo colaborativo dentro de la institución
Mejorar los productos y servicios a la ciudadanía
Mejor comunicación interna
Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes internos y externos
Unificación de procedimientos

Tipo de Beneficiario

- Rectorado
Vicerrectorados
Facultades - Decanatos, Subdecanatos
Directores y Jefes departamentales
Equipo metodológico GPR
Líderes de Proyectos
Responsables de procesos


Restricciones

TIEMPO 7 meses
COSTO 40.000
ALCANCE Diagnóstico institucional, Estructura de un Manual de procesos para UNACH, talleres de trabajo con las Autoridades, Directivos y personal operativo, manuales de operación, Informe ejecutivo final.

Table with project phases: Fase Actual, Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución, Cierre, Completado, Congelado, Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/05/2014 Fecha de Fin: 31/05/2016

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %							
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MARZO 2015:</b>                      Se forma un comité para la evaluación de los productos alcanzados en base a la consultoría mejoramiento integral de procesos institucionales</p>	Argüello Merino, Verónica del Pilar	15/04/2015 - 04:32 PM
<p><b>FEBRERO 2015:</b>                      El 13 de febrero de 2015 se planifica una reunión con el Administrador de Contrato y MAGMASOFT para la entrega formal de los productos alcanzados de la Consultoría. Se firma el Acta entrega - recepción definitiva de servicios, con fecha 13 de febrero de 2015. El 26 de febrero de 2015 se realiza la socialización de los productos - resultados obtenidos en base a la consultoría</p>	Argüello Merino, Verónica del Pilar	15/04/2015 - 04:31 PM
<p><b>ENERO 2015:</b>                      Se realizó el levantamiento de los procesos por parte de la empresa MAGMASOFT con las áreas involucradas:                      - Dirección Financiera                      - Talento Humano                      - Dirección de Planificación                      Se levantó 9 procesos y 31 subprocesos</p>	Argüello Merino, Verónica del Pilar	15/04/2015 - 04:23 PM
<p><b>DICIEMBRE 2014:</b>                      MAGMASOFT remite el Plan de Trabajo para el desarrollo de la consultoría "Mejoramiento integral de los procesos institucionales"                      El 12/12/2014 se lleva a cabo la reunión de trabajo con MAGMASOFT y la UNACH, para la identificación de la arquitectura y el catálogo de procesos, en donde se identifican los procesos comatosos.</p>	Argüello Merino, Verónica del Pilar	15/04/2015 - 04:20 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2014:</b>                      Se elabora los terminos de referencia de la consultoría, los mismos que se entregan a Jefatura de Control de Bienes y Compras Públicas                      Se elabora el contrato N°. 0138-P-UNACH-2014 de la Consultoría Asesoramiento e investigación especializada "Mejoramiento Integral de procesos Institucionales - primera etapa", para la Universidad Nacional de Chimborazo, a cargo del proyecto: Acreditación Institucional de la UNACH</p>	Argüello Merino, Verónica del Pilar	15/04/2015 - 04:14 PM
<p><b>OCTUBRE 2014:</b>                      La Jefatura de Control de Bienes y Compras Públicas solicita los términos de referencia, plazo de ejecución, producto esperado, especialidad profesional, grado de preparación del proveedor, capacidad técnica, rubros de experiencia mínima requerida para la contratación de la consultoría según el Art. 37.- Ejercicio de la Consultoría.                      La empresa MAGMASOFT emite la propuesta para la UNACH.</p>	Argüello Merino, Verónica del Pilar	15/04/2015 - 11:11 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2014: Se tramita desde la Dirección de Planificación el proceso # 550-DPI	Argüello Merino, Verónica del Pilar	06/10/2014 - 10:02 PM
AGOSTO 2014: Se solicita ante las instancias correspondientes se tramite el pedido para la contratación con la empresa consultora.	Argüello Merino, Verónica del Pilar	06/10/2014 - 10:01 PM
JULIO 2014: Se remitió al Departamento de Evaluación y Acreditación los instrumentos de planificación para la inclusión del POA, PAC y PPC Se programó una reunión con la empresa consultora, pero no se pudo ejecutar por múltiples reuniones de los involucrados. Aprobación de la reforma presupuestaria de los Instrumentos de Planificación con la inclusión del proyecto de Mejoramiento de Procesos Institucionales.	Argüello Merino, Verónica del Pilar	06/10/2014 - 09:55 PM
JUNIO 2014: Se solicitó la implementación en los instrumentos de planificación dentro del proyecto de Acreditación Institucional	Argüello Merino, Verónica del Pilar	06/10/2014 - 09:50 PM
MAYO 2014: El proyecto fue definido, aprobado y tramitado ante las Instancias correspondientes. Se tamitó una reunión en la ciudad de Quito con la empresa consultora e-Strategia Company Se revisó el proyecto ante las instancias correspondientes para la aprobación del Proyecto	Argüello Merino, Verónica del Pilar	06/10/2014 - 09:49 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>Organizacional.9. Otros.</b> Si no postulan empresas consultoras CAUSARIA que el proyecto no se ejecute en el año 2014	23/06/2015	Verónica del Pilar Argüello Merino	70 %	90	63	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición del proyecto REALIZADA	2. Definición	09/05/2014		09/05/2014		Sí	1.0
2	Reunión con la empresa consultora REALIZADA	3. Planeación	15/05/2014		15/05/2014		Sí	0.0
3	Revisión de proyecto REALIZADA	2. Definición	16/05/2014		16/05/2014		Sí	1.0
4	Proyecto TRAMITADO para aprobación	2. Definición	23/05/2014		23/05/2014		Sí	1.0
5	Proyecto APROBADO	3. Planeación	13/06/2014		13/06/2014		Sí	3.0
6	Informe de los Instrumentos de Planificación ENVIADO	3. Planeación	04/07/2014		04/07/2014		Sí	1.0
7	Instrumentos de Planificación APROBADOS	3. Planeación	04/07/2014		04/07/2014		Sí	2.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	Reunión con la empresa consultora REALIZADA	3. Planeación	18/07/2014	18/07/2014			No	0.0
9	Reforma a los instrumentos de Planificación APROBADOS	3. Planeación	22/07/2014		22/07/2014		Sí	1.0
10	Solicitud de contratación REALIZADO	4. Ejecución	29/08/2014		29/08/2014		Sí	2.0
11	Proceso DPI REALIZADO	4. Ejecución	04/09/2014		04/09/2014		Sí	5.0
12	Reunión con la empresa consultora REALIZADA	3. Planeación	15/09/2014	15/09/2014			No	0.0
13	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria REALIZADO	4. Ejecución	02/10/2014		02/10/2014		Sí	9.0
14	T1. Acercamiento con empresas consultoras REALIZADO, emite propuesta	3. Planeación	16/10/2014		27/10/2014		Sí	2.0
15	T1. Terminos de referencia REALIZADO	4. Ejecución	04/11/2014		04/11/2014		Sí	3.0
16	T1. Contrato para asesoría en gestión por procesos REALIZADO	4. Ejecución	12/11/2014		12/11/2014		Sí	3.0
17	T1. Pago del anticipo para la consultoría REALIZADO	4. Ejecución	19/11/2014		19/11/2014		Sí	1.0
18	T1. Recopilación de Información sobre Procesos Institucionales CUMPLIDO	4. Ejecución	12/12/2014		12/12/2014		Sí	9.0
19	T1. Levantamiento de procesos según áreas críticas IDENTIFICADAS	4. Ejecución	16/01/2015		16/01/2015		Sí	12.0
20	T2. Manual de Procesos ENTREGADO	4. Ejecución	13/02/2015		13/02/2015		Sí	14.0
21	T2. Reunión de trabajo para socialización de productos alcanzados REALIZADA	4. Ejecución	26/02/2015		26/02/2015		Sí	5.0
22	Reunión con la delegación designada para la validación del informe REALIZADO	5. Cierre	11/03/2015		11/03/2015		Sí	0.0
23	Entrega del informe complementario de la Empresa MAGMASOFT	4. Ejecución	04/05/2015		04/05/2015		Sí	0.0
24	Manuales de Operación ESTRUCTURADOS	4. Ejecución	30/11/2015	30/11/2015			No	5.0
25	HITOS 2016	5. Cierre	12/01/2016	12/01/2016			No	10.0
26	Informe Final REALIZADO	5. Cierre	12/01/2016	12/01/2016			No	5.0
27	Informe Final PRESENTADO	5. Cierre	31/03/2016	31/03/2016			No	5.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,999.80 **
Costo Total:	200,000.00
Total Devengado:	24,999.80
% Costo Total Devengado:	12.50 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 12.50 %

**Perfil Económico 2016**

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	40,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	40,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		60,000.00		
Ppto. Programado	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Ppto. Devengado	24,999.80	0.00	0.00	24,999.80
Estimado a fin de año	* 24,999.80	0.00	0.00	24,999.80
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	15,000.20	0.00	0.00	15,000.20
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 62.50 %	0.00 %	0.00 %	62.50 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016**



**Presupuesto Mensual 2016**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun							

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la eficiencia en la Gestión de proyectos y procesos, hasta el 2016 MEDIANTE la implementación de la herramienta de gestión Gobierno Por Resultados - UPR
3	Incrementar los niveles de dirección, asistencia técnica, coordinación, seguimiento y supervisión de la planeación estratégica y operativa de la Institución MEDIANTE la implementación de un modelo de gestión por procesos y resultados.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO 12	reunión_consultora_septiembre.PDF	06/10/2014
2	HITO 13	disponibilidad_presupuestaria.PDF	06/10/2014
3	HITO 2	reunión_consultora_mayo.PDF	06/10/2014
4	HITO 6	informe_instrumentos_planificación.PDF	06/10/2014
5	HITO 7	instrumentos_de_planificación_aprobados.PDF	06/10/2014
6	HITO 8	reunión_consultora.PDF	06/10/2014
7	HITO 9	reforma_instrumentos.PDF	06/10/2014
8	Tarea 1 Hito 14	Propuesta_Magmasoft.pdf	15/04/2015
9	Tarea 1 Hito 16	CONTRATO_MAGMASOFT.pdf	15/04/2015
10	Tarea 1 Hito 17	PAGO_ANTICIPO.pdf	15/04/2015
11	Tarea 1 Hito 18	Catalogo_de_procesos.pdf	15/04/2015
12	Tarea 1 Hito 19	Levantamiento_de_Procesos.pdf	15/04/2015
13	Tarea 2 Hito 20	Manual_de_procesos.pdf	15/04/2015



**UNACH**  
**Vicerrectorado Administrativo**  
**Departamento de Administración de Talento Humano**  
**PROYECTO: I002 Contratación PhD**

Líder del Proyecto:	Reyes Silva, Carlos Patricio (creyes@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barba Maggi, María Angélica	Programas Relacionados:	Acreditación Institucional, Plan de Mejora UNACH
Titular:	Coloma Machado, Carlos Arturo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	803,380.43
Tipo de Ppto. Externo:	Recursos Propios	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/05/2014 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	31/03/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Reyes Silva, Carlos Patricio	Fecha del siguiente Hito:	


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<p><b>SITUACIÓN ACTUAL:</b>                  La universidad no cuenta con docentes con el grado de PhD, y las remuneraciones no son competitivas con las que pagan en otras Instituciones.</p> <p><b>PROPÓSITO:</b>                  Contratar docentes y/o investigadores con título de PhD estableciendo un valor que se considere competitivo u atractivo</p> <p><b>PRODUCTO:</b>                  Incrementar el número de docentes con grado de PhD que contribuyan a la Investigación a generar indicadores de la misma para conseguir mejorar los índices de evaluación Institucional con miras a la acreditación.</p>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
INCREMENTAR los Indicadores de evaluación en cuanto al número de docentes con esta categoría académica; fomentar la investigación científica en las diferentes áreas del conocimiento; capacitar a docentes en los procedimientos de investigación y generación de resultados como son las publicaciones en revistas indexadas, revistas científicas y publicación de libros.
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Estudiantes, docentes
<b>Restricciones</b>
<p><b>TIEMPO:</b>                  36 meses de enero 2014 a mayo del 2016</p> <p><b>COSTO :</b>                  2'400.000 DÓLARES</p> <p><b>ALCANCE:</b>                  Consolidar la investigación con una planta de docentes con grado de PhD, con los insumos que las investigaciones generan como publicaciones en revistas indexadas, congresos internacionales, libros publicados.</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 78.67 %  
 Fecha de Inicio: 01/05/2014 Fecha de Fin: 31/12/2016

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2015.- SE PROCEDE A CERRAR EL PROYECTO DE CONTRATACIÓN DOCENTES PHD POR CUANTO LAS CONTRATACIONES SERAN REALIZADAS CON GASTO CORRIENTE CON CARGO AL PROGRAMA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.	Reyes Silva, Carlos Patricio	31/03/2016 - 02:37 PM
OCTUBRE 2015.- SE HA REALIZADO EL PAGO A 42 DOCENTES DE LOS CUALES 27 SON INVESTIGADORES CON GRADO PHD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	Reyes Silva, Carlos Patricio	09/11/2015 - 10:53 AM
SEPTIEMBRE 2015.- SE HA REALIZADO EL PAGO A 18 INVESTIGADORES CON GRADO PHD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	Reyes Silva, Carlos Patricio	09/11/2015 - 10:52 AM
AGOSTO 2015.- SE HA REALIZADO EL PAGO A 18 INVESTIGADORES CON GRADO PHD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	Reyes Silva, Carlos Patricio	21/09/2015 - 03:23 PM
JULIO 2015.- SE HA REALIZADO EL PAGO A 18 INVESTIGADORES CON GRADO PHD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	Reyes Silva, Carlos Patricio	21/09/2015 - 03:23 PM
JUNIO 2015.- SE HA REALIZADO EL PAGO A 19 INVESTIGADORES CON GRADO PHD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	Reyes Silva, Carlos Patricio	30/07/2015 - 03:34 PM
MAYO 2015.- SE HA REALIZADO EL PAGO A 17 INVESTIGADORES CON GRADO PHD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	Reyes Silva, Carlos Patricio	09/06/2015 - 10:56 AM
ABRIL 2015.- Se ha efectuado el pago de las remuneraciones correspondientes al mes en un total de 18 docentes con grado PhD por servicios ocasionales y 2 docentes por honorarios profesionales	Reyes Silva, Carlos Patricio	08/05/2015 - 11:12 AM
MARZO 2015.- Se ha efectuado el pago de las remuneraciones correspondientes al mes en un total de 18 docentes con grado PhD por servicios ocasionales y 2 docentes por honorarios profesionales	Reyes Silva, Carlos Patricio	08/05/2015 - 11:00 AM
Febrero 2015.- Por razones presupuestarias el proyecto de acreditación se ejecutara desde el mes de marzo 2015	Reyes Silva, Carlos Patricio	25/03/2015 - 09:28 AM
Enero 2015.- por razones presupuestarias no se planifica el pago de los docentes con grado PhD desde enero se lo hace para el pago desde el mes de marzo 2015	Reyes Silva, Carlos Patricio	25/03/2015 - 09:26 AM
NOVIEMBRE 2014.- se registra el pago de la remuneración de los docentes con grado de phd correspondiente al mes de noviembre 2014	Reyes Silva, Carlos Patricio	25/03/2015 - 09:25 AM
OCTUBRE 2014.- Se registra el pago de las remuneraciones de docentes con grado de phd del mes de octubre 2014.	Reyes Silva, Carlos Patricio	21/11/2014 - 05:05 PM
SEPTIEMBRE 2014: PAGO A DOCENTES CON GRADO PHD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	Reyes Silva, Carlos Patricio	07/10/2014 - 08:52 AM
AGOSTO 2014.- SE HA PROCEDIDO AL PAGO DE 7 DOCENTES CON EL GRADO DE PHD	Reyes Silva, Carlos Patricio	19/09/2014 - 04:21 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2014.- SE HA PROCEDIDO AL PAGO DE 3 DOCENTES CON EL GRADO DE PHD	Reyes Silva, Carlos Patricio	19/09/2014 - 04:19 PM
JUNIO 2014.- EN EL MES DE JUNIO SE HA COMENZADO CON LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES CON EL GRADO DE PHD PARA LAS DIFERENTES FACULTADES BAJO LAS DOS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN COMO ES HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO DEBIDO A QUE LOS INVESTIGADORES SUPERAN LOS 70 AÑOS DE EDAD. Y POR SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	Reyes Silva, Carlos Patricio	19/09/2014 - 04:17 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>Organizacional.3. Económico.</b> Que las RMU no cumpla con las expectativas de los docentes PhD CAUSARIA falta de Docentes PHD	09/06/2015	Carlos Patricio Reyes Silva	30 %	20	6	0/1
<b>Proyecto.4. Costos.</b> El no contratar el número de docentes PhD CAUSARIA el incumplimiento de metas económicas	09/06/2015	Carlos Patricio Reyes Silva	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	certificación presupuestaria para iniciar el proceso de contratación SOLICITADA	2. Definición	01/06/2014		01/06/2014		Sí	4.0
2	Honorarios del mes de julio 2014 PAGADO	4. Ejecución	15/07/2014		15/07/2014		Sí	4.0
3	Honorarios del mes de agosto 2014 PAGADO	4. Ejecución	15/08/2014		15/08/2014		Sí	4.0
4	Honorarios del mes de septiembre 2014 PAGADO	4. Ejecución	15/09/2014		15/09/2014		Sí	4.0
5	Honorarios del mes de octubre 2014 PAGADO	4. Ejecución	15/10/2014		15/10/2014		Sí	4.0
6	Honorarios del mes de noviembre 2014 PAGADO	4. Ejecución	15/11/2014		15/11/2014		Sí	4.0
7	Honorarios del mes de diciembre 2014 PAGADO	4. Ejecución	15/12/2014		15/12/2014		Sí	4.0
8	Informe del cumplimiento de pago efectuados 2014 PRESENTADO	4. Ejecución	15/12/2014		15/12/2014		Sí	4.0
9	Remuneraciones y Honorarios del mes de enero 2015 PAGADO	4. Ejecución	31/01/2015		31/01/2015		Sí	2.9
10	Remuneraciones y Honorarios del mes de febrero 2015 PAGADO	4. Ejecución	28/02/2015		28/02/2015		Sí	2.9
11	Remuneraciones y Honorarios del mes de marzo 2015 PAGADO	4. Ejecución	31/03/2015		31/03/2015		Sí	2.9

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	Remuneraciones y Honorarios del mes de abril 2015 PAGADO	4. Ejecución	30/04/2015		30/04/2015		Sí	2.9
13	Remuneraciones y Honorarios del mes de mayo 2015 PAGADO	4. Ejecución	31/05/2015		31/05/2015		Sí	2.9
14	Remuneraciones y Honorarios del mes de junio 2015 PAGADO	4. Ejecución	30/06/2015		30/06/2015		Sí	2.9
15	Remuneraciones y Honorarios del mes de julio 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/07/2015		31/07/2015		Sí	2.9
16	Remuneraciones y Honorarios del mes de agosto 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/08/2015		31/08/2015		Sí	2.9
17	Remuneraciones y Honorarios del mes de septiembre 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/09/2015		30/09/2015		Sí	2.9
18	Remuneraciones y Honorarios del mes de octubre 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/10/2015		31/10/2015		Sí	2.9
19	Remuneraciones y Honorarios del mes de noviembre 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/11/2015		30/11/2015		Sí	3.0
20	Cierre 2015	5. Cierre	01/12/2015		31/01/2015		Sí	33.0
21	Remuneraciones y Honorarios del mes de diciembre 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/12/2015		26/12/2015		Sí	3.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de docentes y/o investigadores contratados con título de PhD	—	-	-	-	01/07/2014	-


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	803,380.43 **
Costo Total:	2,400,000.00
Total Devengado:	803,380.43
% Costo Total Devengado:	33.47 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 33.47 %

### Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,382,174.63	0.00	0.00	3,382,174.63
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,382,174.63	0.00	0.00	3,382,174.63
Ppto. Codificado	1,402,174.63	0.00	0.00	1,402,174.63
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado	1,192,174.63	0.00	0.00	1,192,174.63
Ppto. Devengado	803,380.43	0.00	0.00	803,380.43
Estimado a fin de año	* 803,380.43	0.00	0.00	803,380.43
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	388,794.20	0.00	0.00	388,794.20
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 67.39 %	0.00 %	0.00 %	67.39 %

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

13	Incrementar la calidad de entrega de productos y servicios de Talento Humano, MEDIANTE, medición del clima laboral, la implementación de un Plan de capacitación, Implementación de un Sistema de Gestión de Información de Talento Humano, proyecto de Fortalecimiento Institucional, Diseño de un plan de descripción, valoración de puestos, plan de evaluación del desempeño y contratación del personal capacitado.
----	--

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Evidencia de la afectación presupuestaria del mes de diciembre 2014, pago a docentes phd	cedula_presupuestaria_diciembre_2014.pdf	06/02/2015
2	Evidencia de la afectación presupuestaria del mes de noviembre 2014, pago a docentes phd	cedula_presupuestaria_noviembre_2014.pdf	06/02/2015
3	Elaboración de contratos N° 559-DATH-UNACH PAGO POR HONORARIOS ALONSO GARCIA CUR N°9467 MES DE JULIO	hito2.PDF	04/10/2014
4	Elaboración de contratos N° 640; 641; 644; 644-DATH-UNACH PAGO POR HONORARIOS A PINILLA DIEGO; MARCELA GUERENDIAIN; DIGNA PEREZ; GISELA QUINTEROS CUR N°9539;10499;9464 MES DE AGOSTO	hito3.PDF	04/10/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
5	Evidencia de la afectación presupuestaria del mes de octubre 2014, pago a docentes phd	cedula_presupuestaria_octubre_2014.pdf	24/11/2014
6	evidencia de la afectación presupuestaria del mes de septiembre 2014, pago a docentes phd	cedula_presupuestaria_septiembre_2014.pdf	24/11/2014
7	HITO 13.- PAGO A DOCENTES A CONTRATO OCASIONAL Y POR HONORARIOS PROFESIONALES CON GRADO PHD CORRESPONDE A AGOSTO 2015	PAGO_A_CONTRATO_PHD_AGOSTO_2015.pdf	21/09/2015
8	HITO 13.- PAGO A DOCENTES A CONTRATO OCASIONAL Y POR HONORARIOS PROFESIONALES CON GRADO PHD CORRESPONDE A JULIO 2015	PAGO_A_CONTRATO_PHD_JULIO_2015.pdf	21/09/2015
9	HITO 13.- PAGO A DOCENTES A CONTRATO OCASIONAL Y POR HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2015	PAGO_A_CONTRATO_PHD_MAYO_2015.pdf	09/06/2015
10	HITO 13.- PAGO A DOCENTES PHD JUNIO 2015	PAGO_A_CONTRATO_PHD_JUNIO_2015.pdf	30/07/2015
11	NOMINA DE DOCENTES PAGADOS ABRIL 2015 CON CEDULA DE GASTO PRESUPUESTARIO	HITO_12.pdf	08/05/2015
12	PAGO HONORARIOS Y SERVICIOS OCASIONALES MARZO 2015 DOCENTES PHD	HITO_11.pdf	14/04/2015
13	T1 Hito 1 AÑO 2015	CERTIFICACIÓN_PRESUPUESTARIA_2015.pdf	14/04/2015

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Huilca Alvarez, Silvana Paola	Analista 1	Asistente Ejecutiva de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	shuilca@unach.edu.ec	
Reyes Silva, Carlos Patricio	Aprovador	Jefe de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	creyes@unach.edu.ec	
Sanandres Alvarez, María Renata	Analista	Analista de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	rsanandres@unach.edu.ec	
Vinueza Cevallos, Gissela Paola	Verificador	Subjefa de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	gvinueza@unach.edu.ec	



**UNACH**  
**Vicerrectorado de Postgrado e Investigación**  
**Instituto de Investigaciones ICITS**

**PROYECTO: I024** PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional

Líder del Proyecto:	Benitez Pérez, Vicente Eduardo (vbenitez@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	Programas Relacionados:	Acreditación Institucional, Plan de Mejora UNACH
Titular:		Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/05/2014 - 30/05/2016
Fecha de última actualización:	27/11/2015	Fecha de Fin Base:	30/05/2016
Modificado por:	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	Fecha del siguiente Hito:	30/07/2014

### DATOS GENERALES

#### Descripción

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente G023 el 08/05/2014

Convertido del Proyecto de Inversión I003 el 08/05/2014

SITUACIÓN ACTUAL:

Sistema de investigación desligado de las demás áreas

PROPÓSITO:

Mejorar el Plan de Investigaciones

PRODUCTOS:

Integración a los procesos de I+D+i del Instituto de Posgrado y Vinculación

Mejores procesos de investigación identificadas en otras instituciones

Consultoría en planificación estratégica

Planificación articulada al plan estratégico institucional

#### Beneficios Cualitativos

Plan mejorado

#### Tipo de Beneficiario

Universidad

#### Restricciones

TIEMPO: 7 MESES


COSTO: 10.000,00USD

ALCANCE: INSTITUCIONAL

Fase Actual:  Anteproyecto  Definición  Planeación  Ejecución  Cierre  Completado  Congelado  Cancelado


### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/05/2014 Fecha de Fin: 30/05/2016

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

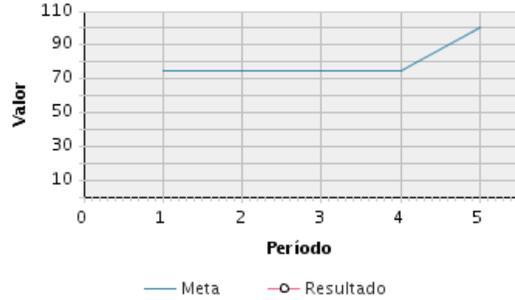

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	75 %	75 %	75 %	75 %	100 %							
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE - OTUBRE:</p> <p>Se continua en la implementación de los reglamentos aprobados por HCI que permiten mejorar la planificación se la investigación, principlamente basados en la resolución 32, 67 y 55</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	27/11/2015 - 11:25 AM
<p>MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2015</p> <p>Durante los meses de Mayo a Agosto se ha reiniciado la consultoria enfocada a realizar la planificación Institucional, puesto que no se ha podido realizar las acciones pertinentes con los nuevos docentes contratados.</p> <p>Se ha presentado los términos de referencia para la contratación d elaconsultoría; así como los documentos de unapropuesta presentada con la finalidad de que se contrate el servicio para realizar la planificación de la investigación institucional.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	27/11/2015 - 11:22 AM
<p>ABRIL 2015</p> <p>Se cuenta con losinstrumentos de planificación aprobados por los departamentos pertinentes, con lo cual se ha iniciado la búsqueda de la persona o institución que pueda realizar la consultoria prevista dentro de este proyecto.</p> <p>En vista que se ha incorporado a la Universidad un docente con título PhD con conocimientos en planificación estratégica, se ha iniciado un acercamiento con el mencionado profesional a fin de determinar la posibilidad de que se involucre dentro de esta propuesta.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	18/09/2015 - 10:02 AM
<p>ENERO - MARZO</p> <p>Se tiene previsto acciones que lleven a la aprobación y habilitación del presupuesto parael año 2015 dentro de la aprtida plan de mejoras</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	11/05/2015 - 11:12 AM
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Debido a que la Universidad ya entra en el proceso de cierre del año fiscal no hasido posible realizar la contratación quedando descartada la consultoria para el año 2014</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	23/03/2015 - 04:17 PM
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Se ha enviado la propuesta a la empresa que esta realizando la consultoria general para la Univrsidad pero no se tuvo respuesta alguna, por lo que se ha buscado otras opciones lograndose a finales mes presentar los papeles de un consultor nacional con experiencia para que pueda realizar el trabajo; dichos documentos fueron presentados al Departamento de control de bienes para que continúe el trámite de contrtación.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	23/03/2015 - 04:14 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p>Se recibe una comunicación de Control de bienes por medio del cual solicita se envíe vía email los términos de referencia, y de igual manera se hace conocer que no se puede contratar consultores extranjeros, razón por la cual se envía la propuesta a la consultora que realiza el trabajo para toda la Universidad con el fin de invitarlos a participar, pero no se ha tenido respuesta ni positiva ni negativa.</p> <p>En vista de la dificultad presentada se está buscando a posibles interesados en realizar la consultoría a fin de cumplir con lo planificado.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	08/12/2014 - 09:29 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2014</b></p> <p>Se realiza el seguimiento respectivo a la contratación de la consultoría, aún no se cuenta con la aprobación para realizar la misma.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	17/11/2014 - 09:47 AM
<p><b>AGOSTO 2014</b></p> <p>Se entregan las propuestas de reglamentos de los diferentes departamentos que conforman el ICITS, los mismos que apuntan a mejorar los procesos de planificación institucional en el ámbito de la investigación.</p> <p>Se realiza la solicitud al Director del Departamento de Evaluación y Acreditación Institucional la contratación de la consultoría encaminada a la mejora de la Planificación Estratégica en el ámbito de la investigación.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	04/10/2014 - 03:44 PM
<p><b>JULIO 2014</b></p> <p>Se define los términos de referencia necesarios para la realización de la consultoría prevista en el proyecto y encaminada a la mejora de la Planificación Institucional.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	04/10/2014 - 03:41 PM
<p><b>JUNIO 2014</b></p> <p>Se ha realizado los instrumentos de planificación POA, PAC, PPC, resumen de partidas 2015 para su aprobación y aplicación en el año en mención.</p> <p>Se obtuvo la certificación presupuestaria misma que determina que los recursos económicos se encuentran dentro del Proyecto de acreditación Institucional.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	04/10/2014 - 03:38 PM
<p><b>MAYO 2014</b></p> <p>Durante este mes se ha preparado los instrumentos de planificación POA, PAC, PPC, resumen de partidas 2014, para su aprobación y posterior aplicación.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	04/10/2014 - 03:35 PM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p><b>Proyecto.2. Alcance.</b></p> <p>La no contratación de la consultoría CAUSARÍA no contar con el Informe de consultoría en el ámbito de la Planificación Estratégica para la revisión y reestructuración de la Estrategia de Investigación Institucional</p>	05/10/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	60 %	60	36	0/1
<p><b>Proyecto.2. Alcance.</b></p> <p>La no visitas a otras Universidades con mejores resultados en el tema de investigación CAUSARÍA una Propuesta de mejora en la planificación de la investigación no adecuada</p>	04/10/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	10 %	20	2	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	certificación Presupuestaria EMITIDA	3. Planeación	16/06/2014		16/06/2014		Sí	10.0
2	Contrato de consultoría en el ámbito de la Planificación Estratégica para la revisión y reestructuración de la Estrategia de Investigación Institucional FIRMADO ( HITO PLAN DE MEJORAS)	4. Ejecución	30/07/2014	30/07/2014			No	10.0
3	Revisión de la Planificación de Investigación 2014 - 2018 (HITO PLAN DE MEJORAS) ELABORADA	4. Ejecución	30/07/2014		30/07/2014		Sí	15.0
4	Aprobación de la Planificación 2014 - 2018 APROBADA (HITO PLAN DE MEJORAS)	4. Ejecución	30/09/2014	30/09/2014			No	25.0
5	Informe de consultoría en el ámbito de la Planificación Estratégica para la revisión y reestructuración de la Estrategia de Investigación Institucional	4. Ejecución	30/09/2014	30/09/2014			No	0.0
6	Informe final de consultoría APROBADO	5. Cierre	19/12/2014	19/12/2014			No	10.0
7	Propuesta de cambio al sistema por el H Consejo Universitario APROBADA	4. Ejecución	19/12/2014	19/12/2014			No	5.0
8	Implementación de la Planificación de Investigación 2014 - 2018	4. Ejecución	30/05/2016	30/05/2016			No	25.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	10,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

### Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Ppto. Codificado	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

3	Incrementar la eficiencia operacional del Instituto de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes MEDIANTE el mejoramiento de la estructura y operación administrativa del Sistema de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes, de la planificación de la investigación institucional, el fortalecimiento del Observatorio de Investigación y Desarrollo Tecnológico, la creación de Centros de Investigación por Áreas del Conocimiento y la ejecución de los programas, proyectos y actividades de investigación aprobados a través de los mismos.
---	--

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ANEXO RIESGO 2	terminos_de_referencia_para_consultoria.PDF	05/10/2014
2	ANEXO RIESGO 2	Pedido_de_consultoria.PDF	05/10/2014
3	GENERAL. matriz financiera 2014 - 2015	Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx	01/06/2015
4	HITO 1	POA_ICITS_PLAN_DE_MEJORAS_2014_LEGALIZADO_(2).PDF	05/10/2014
5	HITO 1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION 2015	APROBACION_RESOLUCION_REFORMA_PLAN_MEJORAS_UNACH-2015.pdf	31/05/2015
6	hito 10. resoluciones HCI, 32, 67	Resolución_32_67_C.I._2014-NUCLEOS_DE_INVEST..PDF	27/11/2015
7	hito 10. resoluciones HCI, 55	Resolucion_055-C.I.-2014-11-04.PDF	27/11/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
8	HITO 2 Ofico enviado al Dep de evaluación y acreditación Institucional a fin de que se inicie el proceso de contratación d ela consultoría	Of._586-ICITS-2015.PDF	18/09/2015
9	HITO 2 propuesta para contratación de la consultoría	Proyecto_Consutoría_CI_UNACH.docx	18/09/2015
10	HITO 2 TDR para contratación de la consultoría	TDR_Plan_estrategico_Investigación_2015.docx	18/09/2015
11	HITO 3	Proyecto_de_Creación_del_la_Unidad_de_Publicaciones_y_Políticas_Intelectual.pdf	06/10/2014
12	HITO 3	PROYECTO_DE_CREACIÓN_DE_LA_UNIDAD_DE_GESTIÓN_DE_PROYECTOS.pdf	06/10/2014
13	HITO 3	Proyecto_creación_U_Gestión_de_la_Investigación.pdf	06/10/2014
14	HITO 3	CENTRO_DE_ESTADÍSTICA_E_INFORMACIÓN_GEOGRÁFICA.pdf	06/10/2014
15	HITO 3	BORRADOR_REESTRUCTURACIÓN_ICITS.pdf	06/10/2014

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barahona Rivadeneira, Diego Javier	DIRECTOR DEL PROYECTO	Director del Instituto de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes	dbarahona@unach.edu.ec	



**UNACH**  
**Vicerrectorado de Postgrado e Investigación**  
**Instituto de Investigaciones ICITS**

**PROYECTO: I034 PM** Mejoramiento de la producción científica

Líder del Proyecto:	Benitez Pérez, Vicente Eduardo (vbenitez@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	Programas Relacionados:	Acreditación Institucional, Plan de Mejora UNACH
Titular:		Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	72,283.40
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/05/2014 - 31/05/2016
Fecha de última actualización:	18/09/2015	Fecha de Fin Base:	31/05/2016
Modificado por:	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	Fecha del siguiente Hito:	18/12/2015


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
Mejoramiento de la producción científica por parte de los Docentes Investigadores de la Universidad Nacional de Chimborazo
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Docentes Investigadores de la Universidad Nacional de Chimborazo
<b>Restricciones</b>
COSTO 505 000 USD TIEMPO: 31/05/2016 RESTRICCIONES: Con el proyecto se espera incrementar la producción científica d ela UNACH a nivel de docentes investigadores titulares, con el fin de mejorar la acreditación institucional

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 05/05/2014      Fecha de Fin: 31/05/2016

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



**Porcentaje de Avance**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JULIO -AGOSTO</b></p> <p>Durante los meses de Julio y Agosto se han continuado recptando solicitudes de docentes para participar en congresos como ponentes por parte de docentes de la UNACH, con los siguientes resultados:</p> <p><b>JULIO :</b>                      Investigación regional Revista Nacional 1                      Ponencias 10: 8 internacionales; 2 Nacionales                      Producción Científica 1 Internacional</p> <p><b>AGOSTO:</b>                      Ponencias 10: 5 internacionales; 5 Nacionales                      Producción Científica 1 Internacional</p> <p>En la gestión realcionada con la impresión y publicación de libros se tiene hasta el mes de Agosto los siguientes resultados:</p> <p>Libros Aprobados por evaluadores internos 2                      Libros aprobados por pares externos 3                      Libros aprobados para impresión 3                      Libros impresos 2</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	18/09/2015 - 11:19 AM
<p><b>MAYO - JUNIO 2015</b></p> <p>Durante el año 2015 hasta el mes de junio se ha tenido la siguiente producción Científica:</p> <p>Ponencias: 32                      Libros ó capítulos de libros 1                      Artículos en revistas regionales 8                      Artículos Científicos 13</p> <p>En el caso de ponencias que han sido presentadas en más de un evento se ha contado una sola de ellas.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	18/09/2015 - 10:16 AM
<p><b>ABRIL 2015</b></p> <p>Se ha recibido los instrumentos de planificación sellados y autorizados por las autoridades competentes, con l ocual se han iniciado los trámites respectivos para que los docentes puedan salir a relaizar exposiciones y/ó presentar artículos científicos o libros a ser publicados</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	24/06/2015 - 09:09 AM
<p><b>ENERO - MARZO</b></p> <p>Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo se tiene previsto la revisión de los instrumentos de planificación con el fin de que se realice la habilitación de las cuentas dentro del proyecto institucional Plan de mejoras.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	11/05/2015 - 11:01 AM
<p><b>DICIEMBRE</b></p> <p>Durante el año 2014 se ha logrado la siguiente producción científica por parte de los docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo:</p> <p>Congresos o Seminarios: 89                      Producción Científica: 9                      Latindex: 2                      Libros: 2 capitulos de libros publicados.</p> <p>Estainformación de acuerdo a los archivos e informe del Observatorio de Investigación.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	23/03/2015 - 04:20 PM
<p><b>Noviembre 2014</b></p> <p>Durante este mes se ha realizado un corte con el fin de determinar el número de artículos publicados y participación como expositores en congresos científicos por parte de los docentes de la UNACH durante el mes de noviembre obteniendo los siguientes resultados:</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	06/01/2015 - 03:57 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización								
Número de artículos en Latindex 7 Número de artículos en Congresos y Seminarios 79 Número de artículos científicos en Scopus e ISI WEB KNOWLEDGE 2 Libros: 2 capítulos en libros										
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Durante este mes se activo el micrositio Docentes dentro de la página WEB de investigación, donde se encuentra determinado el flujograma para la presentación de artículos, libros y exposiciones en congresos científicos, además se encuentra el formulario para la presentación de los mismos y poder registrarlos dentro del archivo institucional.</p> <p>Adicionalmente se ha realizado un corte con el fin de determinar el número de artículos publicados y participación como expositores en congresos científicos por parte de los docentes de la UNACH obteniendo los siguientes resultados:</p> <table> <tr> <td>Número de artículos en Latindex</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Número de artículos en Congresos y Seminarios</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Número de artículos científicos en Scopus e ISI WEB KNOWLEDGE</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Número de libros revisados por pares</td> <td>0</td> </tr> </table>	Número de artículos en Latindex	1	Número de artículos en Congresos y Seminarios	26	Número de artículos científicos en Scopus e ISI WEB KNOWLEDGE	6	Número de libros revisados por pares	0	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	17/12/2014 - 08:54 AM
Número de artículos en Latindex	1									
Número de artículos en Congresos y Seminarios	26									
Número de artículos científicos en Scopus e ISI WEB KNOWLEDGE	6									
Número de libros revisados por pares	0									
<p>INFORME MAYO - AGOSTO 2014</p> <p>El mejoramiento de la producción científica, permitirá brindar el acompañamiento al personal académico de la UNACH en los diversos mecanismos de difusión de la producción científica.; Se ha entregado los instrumentos de planificación referentes al plan de mejoras, al departamento de evaluación y acreditación, donde consta el presupuesto asignado para el mejoramiento de la producción científica.</p> <p>Una vez que se cuenta con la cédula presupuestaria se ha procedido a solicitar al Departamento de Acreditación Institucional que se proceda con la contratación de una consultoría para mejorar la producción científica; se está esperando la aprobación y contratación de la consultoría para iniciar con los procesos de capacitación.</p> <p>Se han realizado reuniones con PhD que laboran en la UNACH con el fin de determinar las acciones a seguir para mejorar la producción científica.</p> <p>Se ha generado una encuesta online dirigida a los docentes de la UNACH con el fin de conocer sus aportes científicos determinando tipo de documentos generados, área científica y temas abordados; esto con el fin de poder delinear un mecanismo de manera que permita que estos documentos se plasmen en artículos científicos y producción científica.</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	22/09/2014 - 11:46 AM								

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>Proyecto.2. Alcance.</b> la baja producción científica de personal académico de la UNACH CAUSARÍA una pérdida de recursos, contar con un índice de producción científico adecuada	05/10/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	30 %	50	15	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Asesoramiento para la selección del mecanismo de publicación REALIZADO (PLAN DE MEJORAS)	4. Ejecución	31/05/2014		31/05/2014		Sí	15.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	Presentación de instrumentos de planificación ENTREGADOS	3. Planeación	13/06/2014		10/06/2014		Sí	5.0
3	Artículos en revistas indexadas PUBLICADO (PLAN DE MEJORAS)	4. Ejecución	19/12/2014		19/12/2014		Sí	10.0
4	Edición y Publicación de libros revisados por pares y revistas indexadas DESARROLLADO ( PLAN DE MEJORAS)	4. Ejecución	19/12/2014		19/12/2014		Sí	10.0
5	Exposición de artículos con estructura científica en Congresos y Seminarios DESARROLLADO (PLAN DE MEJORAS)	4. Ejecución	19/12/2014		19/12/2014		Sí	10.0
6	Planificación 2015 APROBADO	4. Ejecución	20/02/2015		20/02/2015		Sí	25.0
7	Planificación 2016 APROBADO	4. Ejecución	18/12/2015	18/12/2015			No	25.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	72,283.40 **
Costo Total:	505,000.00
Total Devengado:	72,283.40
% Costo Total Devengado:	14.31 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 14.31 %

**Perfil Económico 2016**

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
Ppto. Codificado	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
Ppto. Devengado	72,283.40	0.00	0.00	72,283.40
Estimado a fin de año	* 72,283.40	0.00	0.00	72,283.40
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	432,716.60	0.00	0.00	432,716.60
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 14.31 %	0.00 %	0.00 %	14.31 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016**



**Presupuesto Mensual 2016**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun							

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ANEXO RIESGO 1	Encuesta_para_el_TALLER_DE_ACOMPAÑAMIENTO_PARA_05/10/2014	05/10/2014
2	GENERAL. CURS 2014	CUR_ENE-DIC_2014_ACREDITACIÃ#N.pdf	18/02/2015
3	GENERAL. matriz financiera 2014 - 2015	Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx	01/06/2015
4	HITO 1	FORMULARIO_PARA_LA_PRESENTACIÓN_DE_PUBLICACIONES_CIENTÍFICAS.docx	05/10/2014
5	HITO 1	micrositio_personal_academico.docx	05/10/2014
6	HITO 1	flujograma_presentacion_articulos.docx	05/10/2014
7	HITO 2	POA_ICITS_PLAN_DE_MEJORAS_2014_LEGALIZADO_(2).PDF	17/06/2014
8	HITO 3, 4 y 5 resumen publicaciones	reporte_produccion_intelectual_II_Semestre_2014.PDF	17/12/2014
9	HITO 4	Solicitud_de_recursos_para_la_publicación_de_libros_revisados.pdf	05/10/2014
10	HITO 5	Solicitud_para_participar_en_Congresos_Seminarios_Nacionales_Internacionales.PDF	05/10/2014
11	HITO 6 INSTRUMENTOS D EPLANIFICACION APROBADOS	APROBACION_RESOLUCION_REFORMA_PLAN_MEJORAS_UNACH-2015.pdf	14/05/2015

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barahona Rivadeneira, Diego Javier	Director del proyecto	Director del Instituto de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes	dbarahona@unach.edu.ec	
