

Organización: UNACH

Titular: Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay

Menú

Gestión de Proyectos

Portafolio de Proyectos

Año:

Tipo de seguimiento:

Proyectos a incluir: Vertical Matricial (Externos) Ver Todos








Ver por: [Seleccionar Proyectos Clave](#)

Fase Actual:

[Optimizar](#)

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

| Organización  | No. | Proyecto | Líder del Proyecto | Ppto. | Porcentaje | Fase | Fecha de | Indicadores | | | | Detalle  |
|--|--------|--|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | | Devengado | de avance | Actual | Fin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Vicerrectorado Académico >Centro de Tecnologías Educativas | 1002 | Equipamiento Técnico UNACH | Delgado Altamirano, Jorge Edwin | 0.00 % | 10.00 % | Ejecución | 31/12/2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Vicerrectorado Académico >Dirección Académica | 1004 # | Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de la UNACH | Guffante Naranjo, Tania María | 0.00 % | 100.00 % | Ejecución | 30/12/2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano | 1001 | Fortalecimiento Institucional | Reyes Silva, Carlos Patricio | 0.00 % | 83.50 % | Ejecución | 31/12/2016 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS | 1016 | Becas Cuarto Nivel PhD | Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto | 15.98 % | 90.00 % | Ejecución | 31/12/2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS | 1035 | Becas Cuarto Nivel - Maestrías e incentivos a producción intelectual | Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto | 0.00 % | 50.00 % | Ejecución | 31/12/2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

5.94 %

0 2 0 0

5 Registro(s) en total.



UNACH
Vicerrectorado Académico
Centro de Tecnologías Educativas
PROYECTO: I002 Equipamiento Técnico UNACH

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Delgado Altamirano, Jorge Edwin (jdelgado@unach.edu.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Ríos Rivera, Anita Cecilia | Programas Relacionados: | Plan de Mejora UNACH |
| Titular: | Delgado Altamirano, Jorge Edwin | Prioridad: | 2 |
| Tipo de Proyecto: | Tecnología | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 91800000.1222.7357 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 2 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,815,692.03 |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 10/03/2014 - 31/12/2016 |
| Fecha de última actualización: | 29/11/2015 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2016 |
| Modificado por: | Delgado Altamirano, Jorge Edwin | Fecha del siguiente Hito: | 03/11/2014 |

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL:

La institución durante los últimos dos años a través del proyecto de inversión "Equipamiento Técnico de la Universidad Nacional de Chimborazo", ha implementado los siguientes proyectos:

- Backbone de fibra óptica en el campus MsC Edison Riera
- Data center
- Equipamiento laboratorios de cómputo de Centro de Tecnologías Educativas
- Equipamiento e implementos deportivos para el Centro de Cultura Física
- Mobiliario para CTE, Biblioteca y Centro de Cultura Física
- Equipos de videoconferencia
- Telefonía IP en los campus MsC Edison Riera y La Dolorosa
- Equipamiento multimedia: pizarras interactivas, proyectores laboratorios de cómputo CTE, scanner alto desempeño Biblioteca
- Servidores Sistema Nacional de Información
- Sistema de almacenamiento storage

Sin embargo por la creciente demanda de servicios informáticos y cobertura de internet para el 2014 y 2015 es necesario emprender los siguientes proyectos:

- Ampliación de la red inalámbrica en los campus universitarios
- Ampliación de telefonía IP
- Ampliación de cobertura de internet comercial y red avanzada
- Contratación de bases de datos especializadas. e-books, recurso bibliográfico
- Servidores para repositorios digitales
- Equipamiento laboratorios
- Mobiliario

PROPOSITO:

Proveer de infraestructura tecnológica, redes y comunicaciones para las dependencias académicas y administrativas para apoyo al desarrollo de las actividades académicas e investigación

ALCANCE

El proyecto de equipamiento técnico permitirá a la institución disponer de una infraestructura tecnológica, equipamiento de laboratorios, bibliotecas que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades académicas e investigación con criterios de calidad

PRODUCTO:

Proyecto de equipamiento para dependencias académicas y administrativas

Beneficios Cualitativos


Cobertura de servicios informáticos, e interconectividad en las dependencias académicas y administrativas de los campus universitarios: Norte, Centro y Sur

| |
|---|
| Tipo de Beneficiario |
| Comunidad universitaria docentes, estudiantes y administrativos |
| Restricciones |
| TIEMPO: La implementación del proyecto es de 22 meses |
| RECURSOS: Leyes y normativas a nivel de educación superior, |
| PRESUPUESTO: 4000000 Usd |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.74 %
 Fecha de Inicio: 10/03/2014 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

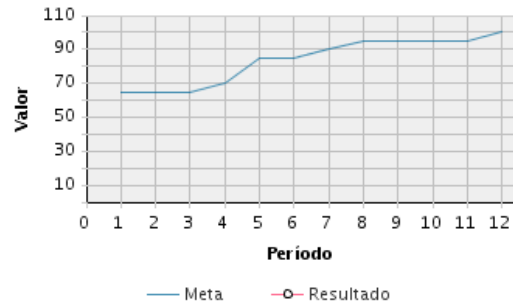

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2016 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 65 % | 65 % | 65 % | 70 % | 85 % | 85 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| No hay información disponible | | |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| Si no se adquiere Equipamiento Técnico CAUSARÍA que algunos proyectos no se realicen | 20/03/2014 | Jorge Edwin Delgado Altamirano | 40 % | 90 | 36 | 0/0 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---------------|--------------------|----------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | T1 - Requerimientos de infraestructura tecnológica POA PAC PPC 2014 | 3. Planeación | 01/06/2014 | | 01/06/2014 | ● | Sí | 5.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 2 | T3 - Procesos de contratación pública | 4. Ejecución | 01/07/2014 | | 01/07/2014 | | Sí | 5.0 |
| 3 | T3 - Ejecución proyecto de equipamiento | 4. Ejecución | 03/11/2014 | 03/11/2014 | | | No | 15.0 |
| 4 | Evaluación y validación | 4. Ejecución | 28/11/2014 | 28/11/2014 | | | No | 5.0 |
| 5 | Liquidación contratos | 4. Ejecución | 31/12/2014 | 31/12/2014 | | | No | 5.0 |
| 6 | T15 -1 Requerimientos de infraestructura tecnológica POA, PAC PPC 2015 | 3. Planeación | 05/01/2015 | 27/03/2015 | | | No | 5.0 |
| 7 | T15 -2 Ejecución proyecto de equipamiento 2015 | 4. Ejecución | 07/09/2015 | 24/06/2016 | | | No | 15.0 |
| 8 | T15 - 4 Liquidación contratos 2015 | 3. Planeación | 04/01/2016 | 29/04/2016 | | | No | 5.0 |
| 9 | T15 -3 Evaluación y validación 2015 | 4. Ejecución | 04/01/2016 | 30/06/2016 | | | No | 5.0 |
| 10 | T16 -1 Requerimientos de infraestructura tecnológica POA, PAC PPC 2016 | 4. Ejecución | 04/04/2016 | 30/09/2016 | | | No | 5.0 |
| 11 | T16 -2 Ejecución proyecto de equipamiento 2016 | 4. Ejecución | 02/05/2016 | 30/09/2016 | | | No | 15.0 |
| 12 | T16 -3 Evaluación y validación 2016 | 4. Ejecución | 04/07/2016 | 30/11/2016 | | | No | 5.0 |
| 13 | T16 -4 Liquidación contratos 2016 | 4. Ejecución | 08/08/2016 | 30/11/2016 | | | No | 5.0 |
| 14 | T16 -5 Cierre proyecto equipamiento | 5. Cierre | 05/12/2016 | 23/12/2016 | | | No | 5.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,815,692.03 ** |
| Costo Total: | 5,472,570.89 |
| Total Devengado: | 1,815,692.03 |
| % Costo Total Devengado: | 33.18 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 33.18 %

Perfil Económico 2016

| | Años Previos | Año Actual (2016) | Años Futuros | Total |
|--|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado | 3,715,537.27 | 2,000,000.00 | 0.00 | 5,715,537.27 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 3,331,692.03 | 2,000,000.00 | 0.00 | 5,331,692.03 |
| Ppto. Codificado | 1,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,000.00 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2016) | | 2,000,000.00 | | |
| Ppto. Programado | 1,948,692.03 | 0.00 | 0.00 | 1,948,692.03 |
| Ppto. Devengado | 1,815,692.03 | 0.00 | 0.00 | 1,815,692.03 |
| Estimado a fin de año | * 1,815,692.03 | 0.00 | 0.00 | 1,815,692.03 |
| Variación Proyectada (Programado - Estimado) | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 |
| % de Ppto. Programado vs. Devengado | * 93.17 % | 0.00 % | 0.00 % | 93.17 % |

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Feb | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Mar | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Abr | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| May | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 0.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2016 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Jul | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Total | 0.00 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 1 | Incrementar la incidencia tecnológica en la universidad MEDIANTE la conformación del Comité de Tecnología, Plan Estratégico de TIC's, reclutamiento de profesionales en el área informática |
| 2 | Incrementar equipos e infraestructura tecnológica acorde a los requerimientos institucionales MEDIANTE la implementación de estándares, normativas institucionales y mejores prácticas internacionales |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | I002 - HITO 1 PAC Proyecto Equipamiento | PAC_abril_2014.pdf | 15/10/2014 |
| 2 | I002 - HITO 1 POA Proyecto Equipamiento | POA_abril_2014.pdf | 15/10/2014 |
| 3 | I002 - HITO 1 Resolución aprobación proyecto inversión | RESOLUCION_PROYECTO_EQUIPAMIENTO.PDF | 05/10/2014 |
| 4 | i002 - HITO 1 Resumen de partidas | RESUMEN_DE_PARTIDAS_abril_2014.pdf | 15/10/2014 |
| 5 | I002 - HITO 2 Contrato P-53-UNACH-2014 | Contrato_053-P-UNACH-2014.PDF | 05/10/2014 |
| 6 | I002 - HITO 2 Contrato P-99-UNACH-2014 | Contrato_099-P-UNACH-2014.PDF | 05/10/2014 |
| 7 | I002 - HITO 2 Procesos de adquisición de equipos, maquinaria a través del proyecto de inversión "Equipamiento Técnico UNACH 2014" para varias dependencias | Oficios_adquisiciones1.PDF | 05/10/2014 |
| 8 | I002 - HITO 2 Procesos de adquisición de equipos, maquinaria a través del proyecto de inversión "Equipamiento Técnico UNACH 2014" para varias dependencias | Oficios_adquisiciones2.PDF | 05/10/2014 |
| 9 | I002 - HITO 3 Adquisición computadoras e impresoras para varias dependencias - catálogo compras públicas | Orden_de_compras_-_Computadoras_e_Impresoras.PDF | 05/10/2014 |
| 10 | I002 - HITO 3 Adquisición copiatoras varias dependencias - catálogo compras públicas | Orden_de_compras_-_copiadoras.PDF | 05/10/2014 |
| 11 | I002 - HITO 3 Contrato 76-P-UNACH-2014 - Planificación de actividades | Reunión_de_Lanzamiento_v1.0.pptx | 05/10/2014 |
| 12 | I002 - HITO 4 Acta P-53-UNACH-2014 | Acta_053-P-UNACH-2014.PDF | 05/10/2014 |
| 13 | I002 - HITO 4 Acta P-53-UNACH-2014 | Acta_099-P-UNACH-2014.PDF | 05/10/2014 |
| 14 | I002 - HITO 5 Acta contrato 0128-P-UNACH-2014 | Contrato_128-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 15 | I002 - HITO 5 Acta contrato 080-P-UNACH-2014 | Acta_080-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 16 | I002 - HITO 5 Acta contrato 080-P-UNACH-2014 | Contrato_080-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 17 | I002 - HITO 5 Acta contrato 085-P-UNACH-2014 | Contrato_085-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 18 | I002 - HITO 5 Acta contrato 098-P-UNACH-2014 | Acta_098-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 19 | I002 - HITO 5 Acta contrato 099-P-UNACH-2014 | Contrato_099-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 20 | I002 - HITO 5 Acta contrato 112-P-UNACH-2014 | Acta_112-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 21 | I002 - HITO 5 Acta contrato 115-P-UNACH-2014 | Contrato_No._115-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 22 | I002 - HITO 5 Contrato 098-P-UNACH-2014 | Contrato_098-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 23 | I002 - HITO 5 Contrato 115-P-UNACH-2014 | Contrato_115-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 24 | I002 - HITO 5 Contrato 132-P-UNACH-2014 | Contrato_132-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|-------------------------------|---------------|
| 25 | I002 - HITO 5 Contrato 148-P-UNACH-2014 | Contrato_148-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 26 | I002 - HITO 5 Acta contrato 052-P-UNACH-2014 | Acta_052-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 27 | I002 - HITO 5 Acta contrato 053-P-UNACH-2014 | Acta_053-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 28 | I002 - HITO 5 Acta contrato 076-P-UNACH-2014 | Acta_076-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 29 | I002 - HITO 5 Acta contrato 099-P-UNACH-2014 | Acta_099-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 30 | I002 - HITO 5 Acta contrato 104-P-UNACH-2014 | Acta_104-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 31 | I002 - HITO 5 Acta contrato 128-P-UNACH-2014 | Contrato_128-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 32 | I002 - HITO 5 Acta contrato 149-P-UNACH-2014 | Acta_149-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 33 | I002 - HITO 5 Contrato 052-P-UNACH-2014 | Contrato_052-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 34 | I002 - HITO 5 Contrato 053-P-UNACH-2014 | Contrato_053-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 35 | I002 - HITO 5 Contrato 076-P-UNACH-2014 | Contrato_076-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 36 | I002 - HITO 5 Contrato 094-P-UNACH-2014 | Contrato_094-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 37 | I002 - HITO 5 Contrato 099-P-UNACH-2014 | Contrato_099-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 38 | I002 - HITO 5 Contrato 104-P-UNACH-2014 | Contrato_104-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 39 | I002 - HITO 5 Contrato 149-P-UNACH-2014 | Contrato_149-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |
| 40 | I002 - PPC Proyecto Equipamiento | PPC_abril__2014.pdf | 15/10/2014 |
| 41 | I002- HITO 5 Acta contrato 094-P-UNACH-2014 | Acta_094-P-UNACH-2014.PDF | 23/03/2015 |



UNACH
Vicerrectorado Académico
Dirección Académica

PROYECTO: 1004 Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de la UNACH

Table with project details including: Líder del Proyecto (Guffante Naranjo, Tania María), Patrocinador Ejecutivo (Ríos Rivera, Anita Cecilia), Titular (Guffante Naranjo, Tania María), Tipo de Proyecto (Brainware - Talento Humano), CUP (91800000.148.7356), Objetivos Operativos (10), Viabilidad Técnica (Alta), Fecha de última actualización (05/07/2016), Modificado por (Guffante Naranjo, Tania María), Programas Relacionados (Plan de Mejora UNACH), Prioridad (1), Retorno Económico (0.00), TIR (0.00 %), VAN (0.00), Estimado Al Fin Del Proyecto (233,250.38), Fecha de Inicio - Fecha de Fin (06/01/2014 - 30/12/2016), Fecha de Fin Base (30/12/2016), Fecha del siguiente Hito (29/07/2016).

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACIÓN ACTUAL:

Por mandato de la LOES, la LOSEP; el Reglamento de Escalafón Docente y el Reglamento de Régimen Académico, las IES, están obligadas a capacitar a sus servidores para que respondan a las exigencias sociales de la educación superior

PROPÓSITO:

Capacitar a los profesores y administrativos para un desempeño eficiente de sus responsabilidades

PRODUCTO:

Docentes y administrativos capacitados

Beneficios Cualitativos

Mejores desempeños de los servidores universitarios en las responsabilidades específicas que cumplen; pues poseerán competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales para ofertaer servicios de calidad a los usuarios

Tipo de Beneficiario

- Docentes
Empleados
Trabajadores
Estudiantes

Restricciones

TIEMPO: dos años


COSTO: 900.000 usd

ALCANCE: Serán beneficiarios de las capacitaciones los docentes, empleados, trabajadores de la UNACH, el proyecto incluye ayudas económicas para cursos nacionales e internacionales; así como material de trabajo.

Progress bar table with phases: Fase Actual, Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución (highlighted), Cierre, Completado, Congelado, Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.13 %
 Fecha de Inicio: 06/01/2014 Fecha de Fin: 30/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

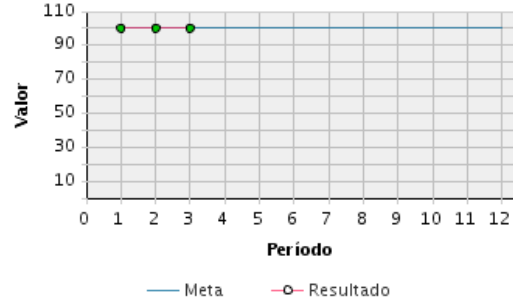

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2016 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>MAYO 2016 CPDIP Planificación de las Jornadas de Capacitación Docente - septiembre 2016 Pedido de elaboración de certificados al Vicerrectorado Administrativo de las Jornadas de Capacitación Docente - marzo 2016. Informe presentando al Vicerrectorado Académico sobre los docentes que asistieron y aprobaron; o no asistieron o reprobaron (pese a haberse inscrito) las Jornadas de Capacitación Docente - marzo 2016.</p> <p>JUNIO 2016 CPDIP Planificación de las Jornadas de Capacitación Docente - septiembre 2016 Pedido de elaboración de certificados al Vicerrectorado Administrativo de cuatro cursos de capacitación realizados por la Dirección General Académica a través del Centro de Perfeccionamiento Docente e Innovación Pedagógica y el Departamento de Evaluación y Acreditación. Reunión con el señor docente investigador PhD. Adalberto Fernández, para Tratar desarrollo y organización del CURSO: "METODOLOGÍAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE" de las Jornadas de Capacitación Docente, septiembre 2016 .</p> | Guffante Naranjo, Tania María | 05/07/2016 - 08:39 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2015 CPDIP Desarrollo de las Jornadas de Capacitación septiembre 2015 Recepción de solicitudes a través del Vicerrectorado Académico para asistencia de los docentes a eventos de capacitación nacionales e internacionales Emisión de informe certificaciones a docentes para asistir a cursos de capacitación nacionales e internacionales Pedido de elaboración de contrato para la PHD. OLGA GLORIA BARBON PÉREZ , como facilitadora del Curso REDISEÑO CURRICULAR OPERACIONALIZACIÓN DIDÁCTICA: DESDE LA INVESTIGACIÓN E INTERCULTURALIDAD. Pedido de elaboración de contrato para el Ms. Héctor Daniel Morocho Lara, como facilitador del Curso "CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCTOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DISEÑO CURRICULAR". Pedido de Elaboración de contrato para la Ing. Paulina Fernanda Bolaños Logroño, como facilitadora del Curso "CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCTOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DISEÑO CURRICULAR". Pedido de Elaboración de contrato para el Mgs. Richard Armando Caiza Castillo , como facilitador del Curso "DISEÑO DE AULAS ICONOGRÁFICAS EN MOODLE VERSIÓN 2.6". Pedido de Elaboración de contrato para el Dr. Urbano Solís Cartas, como facilitador del CURSO "DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR EN LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS".</p> | Guffante Naranjo, Tania María | 04/07/2016 - 09:12 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>OCTUBRE 2015 CPDIP Pedido de Elaboración de contrato para el Ing. CARLOS VOLTER BUENAÑO PESANTEZ , como facilitador del Curso ELABORACIÓN Y MANEJO DE AULAS VIRTUALES Pedido de Elaboración de contrato para el LIC. JORGE NOE SILVA CASTILLO, como facilitador del Curso "ELABORACIÓN Y MANEJO DE AULAS VIRTUALES Pedido de Elaboración de contrato para el Ing. DIEGO GERARDO JAVIER GUERRA CASTELLANOS como facilitador del Curso TOMA DE CONCIENCIA CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD EN LA GESTIÓN ACADÉMICA Recepción de solicitudes a través del Vicerrectorado Académico para asistencia de los docentes a eventos de capacitación nacionales e internacionales Emisión de informe certificaciones a docentes para asistir a cursos de capacitación nacionales e internacionales</p> <p>NOVIEMBRE 2015 CPDIP Pedidos de cancelación de los facilitadores de las jornadas de capacitación - septiembre 2015 Pedido de elaboración de certificados. Pedido a las Unidades Académicas de entrega de certificados</p> <p>DICIEMBRE 2015 CPDIP Pedido de cancelación de facilitador de curso de capacitación. Pedido de cancelación final a coordinadora. Pedido de elaboración de certificados.</p> <p>ENERO 2016 CPDIP Se solicitó al Vicerrectorado de Postgrado e Investigación y al ICITS la colaboración de los señores investigadores para que participen en las Jornadas de capacitación docente - marzo 2016. Se solicitó elaboración de certificados del Curso "Toma de conciencia con los objetivos de calidad en la gestión académica" e "Inducción Microcurricular". Se presentó informe al Vicerrectorado Académico de los cursos desarrollados en el año 2015 A las Unidades Académicas se solicitó el apoyo de los señores docentes, para que participen como Facilitadores de las Jornadas de Capacitación docente - marzo 2016. Se presentó los instrumentos de planificación POA, PAC, PPC, Resumen de Partidas de la Dirección Académica. Elaboración del Plan de Capacitación 2016</p> <p>FEBRERO 2016 CPDIP Se remitió a las Unidades Académicas los certificados de los señores docentes que aprobaron los diferentes cursos organizados en el año 2015. Se solicitó la autorización de la realización de las Jornadas de Capacitación Docente - marzo 2016. Elaboración del Plan de Capacitación 2016</p> <p>MARZO 2016 CPDIP Preparación logística de las Jornadas de Capacitación Docente - marzo 2016 Desarrollo de las Jornadas de Capacitación Docente - marzo 2016 Elaboración del Plan de Capacitación 2016</p> <p>ABRIL 2016 CPDIP Presentación del Plan de Capacitación 2016 Preparación de las Jornadas de Capacitación septiembre 2016 Pedido de elaboración de certificados de las Jornadas de Capacitación - marzo 2016</p> | | |
| <p>JUNIO 2015 CPDIP Desarrollo del Curso de "Epistemología y Diseño curricular ", mismo que se realizará hasta el mes de julio. Pedido de la Elaboración de Contrato para la Mg.s Patricia Bravo como Facilitadora del Seminario Taller "DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA" Desarrollo del Seminario Taller "DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Organización de las Jornadas de Capacitación Docente septiembre 2015 Reuniones con el Vicerrectorado Académico Recepción de solicitudes a través del Vicerrectorado Académico para asistencia de los docentes a eventos de capacitación nacionales e internacionales</p> | <p>Guffante Naranjo, Tania María</p> | <p>18/11/2015 - 11:27 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <p>Emisión de certificaciones a docentes para asistir a cursos de capacitación nacionales e internacionales</p> <p>JUNIO 2015 DATH Recepción y tramitación de solicitudes de los servidores administrativos para cursos de capacitación a nivel nacional. Trámite a las solicitudes de capacitación del personal académico de acuerdo al diagrama de procesos institucional.</p> <p>Julio 2015 CPDIP Desarrollo del Curso de "Epistemología y Diseño curricular ", mismo que se realizará hasta el mes de julio. Desarrollo del Seminario Taller "DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Pedido de la Elaboración de Contrato para la Dra. Carmen Varguillas como Facilitadora del Curso "Criterios para la Articulación de Elementos de la Malla y Evaluación de la Construcción Mesocurricular" Desarrollo Curso "Criterios para la Articulación de Elementos de la Malla y Evaluación de la Construcción Mesocurricular" Organización de las Jornadas de Capacitación Docente septiembre 2015 Reuniones con el Vicerrectorado Académico Pedido de elaboración de contrato para la Mgs. Lourdes Del Carmen Zúñiga Recepción de solicitudes a través del Vicerrectorado Académico para asistencia de los docentes a eventos de capacitación nacionales e internacionales Emisión de certificaciones a docentes para asistir a cursos de capacitación nacionales e internacionales</p> <p>JULIO 2015 DATH Recepción de solicitudes de los servidores administrativos para cursos de capacitación Emisión de certificaciones para las capacitaciones solicitadas por personal administrativo de la Institución. Informe semestral sobre el Proyecto de Capacitación a la Dirección de Planificación Pedido de la Elaboración de Contrato para el Ing. Luis Cabezas como Facilitador del Curso "Estadística II con SPSS"</p> <p>AGOSTO 2015 CPDIP Organización de las Jornadas de Capacitación Docente septiembre 2015 Tramite cancelación de los servicios profesionales prestados por la Mg.s Patricia Cecilia Bravo Mancero, con cedula de ciudadanía No. 060224509-4, como Facilitadora del Seminario Taller "DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA", según Contrato de Trabajo No. 1002-DATH-UNACH-2015, de fecha 30 de julio del 2015. Tramite pago con Liquidación de Servicios Prestados a favor de la DRA. CARMEN SIAVIL VARGUILLAS CARMONA, de nacionalidad Venezolana, con pasaporte No. 119401914, como Facilitadora del CURSO "CRITERIOS PARA LA ARTICULACIÓN Pedido de la Elaboración de Contrato para el Mgs. JEAN CARLOS GARCÍA ZACARIAS como Facilitador del Curso Rediseño Curricular: Sistematización de Experiencias: Una Metodología en Acción Pedido de la Elaboración de Contrato para el Ing. DIEGO BERNARDO PALACIOS CAMPANA como Facilitador del Curso EXCEL AVANZADO Y GOOGLE DOCS</p> <p>AGOSTO 2015 DATH Recepción de solicitudes de los servidores administrativos para cursos de capacitación Emisión de certificaciones para las capacitaciones solicitadas por personal administrativo de la Institución.</p> | | |
| <p>ENERO 2015 CPDIP Elaboración del Plan de Capacitación Trámites para aprobación del Plan de Capacitación Reuniones con la señora Vicerrectora Académica para tratar Plan de Capacitación</p> <p>ENERO 2015</p> | <p>Guffante Naranjo, Tania María</p> | <p>23/09/2015 - 11:09 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <p>DATH Reunión con la señora Vicerrectora Administrativa para tratar Plan de Capacitación-Employados Elaboracion del Plan de Capacitación para el personal administrativo</p> <p>FEBRERO 2015 DATH Reunión con la señora Vicerrectora Administrativa para tratar sobre el Plan de Capacitación Gestionar para la aprobacion del Plan de Capacitación del personal administrativo</p> <p>FEBRERO 2015 CPDIP Reuniones permanentes con la señora Vicerrectora Académica para tratar el Plan de Capacitación docente Elaboración del Plan de Capacitación 2015</p> <p>MARZO 2015 CPDIP Reuniones permanentes con la señora Vicerrectora Académica para tratar el Plan de Capacitación docente Envío del Plan de Capacitación docente Reunión con representante de IBEC tratar curso de inglés en modalidad virtual Desarrollo del Curso de "Aulas Virtuales", en cada una de las Unidades Académicas</p> <p>MARZO 2015 DATH Recepcion de solicitudes de los empleados para la asistencia a eventos de capacitación</p> <p>ABRIL 2015 CPDIP Reunión con representante de IBEC tratar curso de inglés en modalidad virtual Reuniones con la Sra. Vicerrectora Académica a tratar varios temas Desarrollo del Curso de "Epistemología y Diseño curricular ", mismo que se realizará hasta el mes de julio. Pedido de Elaboración de Certificados al Vicerrectorado Administrativo para entregar a los señores(as) docentes Pedido de autorización para la elaboración de Contrato a coordinadora de los cursos que se realizarán en los meses de mayo a noviembre del 2015</p> <p>ABRIL 2015 DATH Plan de Capacitación aprobado Recepcion de solicitudes de los empleados para la asistencia a eventos de capacitación Emisión de informes favorables para la asistencia a eventos de capacitación.</p> <p>MAYO 2015 CPDIP Pedido de Elaboración de Certificados al Vicerrectorado Administrativo para entregar a los señores(as) docentes Reuniones con la Sra. Vicerrectora Académica a tratar varios temas Desarrollo del Curso de "Epistemología y Diseño curricular ", mismo que se realizará hasta el mes de julio. Pedido de Elaboración de Certificados al Vicerrectorado Administrativo para entregar a los señores(as) docentes Pedido de elaboración de contratao a facilitador del Taller "EPISTEMOLOGÍA Y DISEÑO CURRICULAR"</p> <p>MAYO 2015 DATH Recepción de solicitudes de los servidores administrativos para cursos de capacitación Reuniones con el Director de Talento Humano y la Dra. Tania Guffante para la elaboración del Proyecto de Capacitación en el formato del SENPLADES DEL AÑO 2015 Y 2016</p> | | |
| <p>DICIEMBRE 2014 Trámite de pago de Coordinadora. Seguimiento a trámites de pago Distribución de certificados por Unidades Académica</p> | <p>Guffante Naranjo, Tania María</p> | <p>03/02/2015 - 09:31 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Trámites de pago de Facilitadores Trámite de pago de Coordinadora. Seguimiento a trámites de pago Elaboración de certificados Distribución de certificados por Unidades Académica</p> | Guffante Naranjo, Tania María | 03/02/2015 - 09:29 AM |
| <p>OCTUBRE 2014</p> <p>Trámites de pago de Facilitadores Trámite de pago de Coordinadora. Seguimiento a trámites de pago Elaboración de certificados Distribución de certificados por Unidades Académicas</p> | Loza Cevallos, Carlos Augusto | 01/12/2014 - 08:19 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes Distribución de certificados por Unidades Académicas Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Desarrollo de los cursos del mes de septiembre del 2014 Elaboración de certificados</p> | Loza Cevallos, Carlos Augusto | 04/10/2014 - 11:20 AM |
| <p>AGOSTO 2014</p> <p>Desarrollo de los cursos del mes de agosto del 2014 Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámites de contratos de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámite de pedido de pago del servicio de refrigerios Trámite de pedido de certificaciones presupuestarias</p> | Loza Cevallos, Carlos Augusto | 04/10/2014 - 11:13 AM |
| <p>JULIO 2014</p> <p>Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Trámite de pedido de certificaciones presupuestarias Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Pedido de elaboración de certificados Organización de los cursos que se realizarán en los meses de julio a septiembre de 2014 Desarrollo de los cursos del mes de julio</p> | Loza Cevallos, Carlos Augusto | 04/10/2014 - 11:03 AM |
| <p>JUNIO 2014</p> <p>Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Pedido de elaboración de certificados Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámite de pedido de certificaciones presupuestarias</p> | Loza Cevallos, Carlos Augusto | 04/10/2014 - 10:10 AM |
| <p>MAYO 2014</p> <p>Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Elaboración de certificados Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes</p> | Loza Cevallos, Carlos Augusto | 29/09/2014 - 03:20 PM |
| <p>ABRIL 2014:</p> <p>Pedidos de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos internacionales Elaboración y suscripción por parte de las autoridades de certificados de cursos asistidos por los docentes Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes</p> | Loza Cevallos, Carlos Augusto | 05/05/2014 - 09:17 AM |
| <p>MARZO 2014:</p> <p>Se cuenta con la APROBACIÓN del POA-PAC-PPC, y se está iniciando el proceso de contratación de facilitadores. Evaluación de la Capacitación de febrero 2014 Trámites para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales. Primer Quimestre</p> | Loza Cevallos, Carlos Augusto | 03/04/2014 - 10:32 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| FEBRERO 2014: Se ejecutaron las jornadas de capacitación a docentes del 18 al 28 de febrero, al que asistieron unos 400 profesores, 40 horas. Se realizó la evaluación a los facilitadores. | Consultor e-Strategia, José Antonio Villasís | 20/03/2014 - 12:37 PM |
| ENERO 2014: El proyecto de capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores está en fase de implementación. Se espera que se aperture el presupuesto de proyectos por parte del Ministerio de Finanzas. Se planificó las jornadas de capacitación febrero 2014. | Consultor e-Strategia, José Antonio Villasís | 20/03/2014 - 12:32 PM |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| No existe asignación presupuestaria hasta la presente fecha | 05/07/2016 | Tania María Guffante Naranjo | 10 | 10 | 1 | 0/0 |
| Sin presupuesto asignado para el 2016 no se puede contratar a facilitadores | 31/05/2016 | Tania María Guffante Naranjo | 10 | 10 | 1 | 0/0 |
| No se cuenta con asignación presupuestaria para el año 2016 | 30/03/2016 | Tania María Guffante Naranjo | 10 | 10 | 1 | 0/0 |
| No se entregan a tiempo certificados solicitados a Publicaciones a través del Vicerrectorado Administrativo | 03/06/2015 | Tania María Guffante Naranjo | 10 | 10 | 1 | 0/0 |
| No se aprueba en tiempos esperados el presupuesto anual 2015 | 03/06/2015 | Tania María Guffante Naranjo | 10 | 10 | 1 | 0/0 |
| Aprobación del presupuesto anual para el proyecto de inversión 2014 | 03/06/2015 | Tania María Guffante Naranjo | 10 | 10 | 1 | 0/0 |
| No se aprueba en tiempos esperados presupuesto anual 2014 | 03/06/2015 | Carlos Augusto Loza Cevallos | 10 | 10 | 1 | 0/0 |
| Facilitadores no entregan documentos habilitantes para solicitar elaboración de contratos | 03/06/2015 | Carlos Augusto Loza Cevallos | 10 | 10 | 1 | 0/0 |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 8

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| Proyecto.5. Tiempo. Falta de facilitadores CAUSARÍA retraso en la capacitación | 23/06/2014 | Carlos Augusto Loza Cevallos | 20 % | 10 | 2 | 0/1 |
| Organizacional.3. Económico. Falta de asignación de presupuesto para el año 2016 | 05/07/2016 | Tania María Guffante Naranjo | 10 % | 10 | 1 | 0/0 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 1 | Estudio de prioridades para la capacitación del año 2014 del personal REALIZADO | 3. Planeación | 15/01/2014 | | 15/01/2014 |  | Sí | 1.0 |







HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 2 | Diseño y Aprobación del Plan de capacitación del personal APROBADO | 3. Planeación | 30/01/2014 | | 30/01/2014 | | Sí | 1.0 |
| 3 | Selección y Contratación de facilitadores jornadas febrero REALIZADO | 3. Planeación | 10/02/2014 | | 10/02/2014 | | Sí | 1.0 |
| 4 | Trámite de certificación presupuestaria jornadas febrero 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 20/02/2014 | | 20/02/2014 | | Sí | 1.0 |
| 5 | Jornadas de capacitación a docentes febrero 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 1.0 |
| 6 | Evaluación de la Capacitación de febrero 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 28/03/2014 | | 28/03/2014 | | Sí | 1.0 |
| 7 | Trámites para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales.Primer Quimestre EJECUTADO | 4. Ejecución | 28/03/2014 | | 28/03/2014 | | Sí | 1.0 |
| 8 | Pedidos de contrato a facilitadores jornadas febrero 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 01/04/2014 | | 01/04/2014 | | Sí | 1.0 |
| 9 | Ejecución del Plan de Capacitación primer cuatrimestre REALIZADO | 4. Ejecución | 30/04/2014 | | 30/04/2014 | | Sí | 5.0 |
| 10 | Suscripción de contratos a facilitadores febrero 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 30/04/2014 | | 30/04/2014 | | Sí | 1.0 |
| 11 | Pago de contratos a facilitadores jornadas febrero 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 09/05/2014 | | 09/05/2014 | | Sí | 5.0 |
| 12 | Programación Jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 18/06/2014 | | 18/06/2014 | | Sí | 2.0 |
| 13 | Entrega de certificados a docentes que aprobaron jornadas de capacitación febrero 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 30/06/2014 | | 30/06/2014 | | Sí | 3.0 |
| 14 | Selección y Contratación de facilitadores jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 18/07/2014 | | 18/07/2014 | | Sí | 2.0 |
| 15 | Trámite de contratación para facilitadores de jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 25/08/2014 | | 25/08/2014 | | Sí | 2.0 |
| 16 | Desarrollo de jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 29/08/2014 | | 29/08/2014 | | Sí | 5.0 |
| 17 | Trámites para viajes de docentes a eventos nacionales e internacionales segundo cuatrimestre REALIZADO | 4. Ejecución | 29/08/2014 | | 29/08/2014 | | Sí | 2.0 |
| 18 | Evaluación jornadas capacitación agosto 2014 PROGRAMADO | 4. Ejecución | 12/09/2014 | | 12/09/2014 | | Sí | 2.0 |
| 19 | Pago a facilitadores jornadas de capacitación agosto 2014 PROGRAMADO | 4. Ejecución | 15/10/2014 | | 15/10/2014 | | Sí | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 20 | Preparación de estadísticas anuales e informes 2014 REALIZADO | 5. Cierre | 21/11/2014 | | 21/11/2014 | | Sí | 1.0 |
| 21 | Trámites para viajes de docentes a eventos nacionales e internacionales tercer cuatrimestre 2014 REALIZADO | 4. Ejecución | 12/12/2014 | | 12/12/2014 | | Sí | 4.0 |
| 22 | Entrega de certificados a docentes que aprobaron jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO | 5. Cierre | 19/12/2014 | | 19/12/2014 | | Sí | 5.0 |
| 23 | Selección y contratación a facilitadores para la capacitación 2015 primer y segundo semestre REALIZADO | 3. Planeación | 01/01/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 0.0 |
| 24 | Suscripción y pago de contratos a facilitadores 2015 primer semestre y segundo REALIZADO | 3. Planeación | 01/01/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 0.0 |
| 25 | Hitos del 2015 REALIZADO | 6. Post-proyecto | 30/01/2015 | | 30/01/2015 | | Sí | 20.0 |
| 26 | Trámites para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales 2015 primer y segundo semestre REALIZADO | 3. Planeación | 02/02/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 0.0 |
| 27 | Elaboración del Plan de Capacitación 2015 para los docentes e investigadores y personal administrativo REALIZADO | 4. Ejecución | 03/02/2015 | | 31/03/2015 | | Sí | 1.0 |
| 28 | Desarrollo de los cursos conforme "Plan de capacitación" 2015 primer y segundo semestre REALIZADO | 4. Ejecución | 26/02/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 0.0 |
| 29 | Entrega de certificados a docentes que aprobaron los cursos de capacitación primer y segundo semestre 2015 REALIZADO | 3. Planeación | 26/02/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 0.0 |
| 30 | Informes de las capacitaciones del personal administrativo del primer cuatrimestre APROBADOS | 4. Ejecución | 02/03/2015 | | 08/05/2015 | | Sí | 10.0 |
| 31 | Recepción y análisis de oficios para capacitaciones del personal administrativo del primer cuatrimestre 2015 SOLICITADAS | 4. Ejecución | 02/03/2015 | | 12/05/2015 | | Sí | 10.0 |
| 32 | Plan de Capacitación 2015 para los docentes e investigadores y personal administrativo APROBADO | 4. Ejecución | 01/04/2015 | | 24/04/2015 | | Sí | 10.0 |
| 33 | Diseño, elaboración y aprobación del Plan de capacitación 2016 APROBADO | 4. Ejecución | 01/01/2016 | | 29/03/2016 | | Sí | 0.0 |
| 34 | Selección de facilitadores marzo 2016 - REALIZADO | 4. Ejecución | 04/01/2016 | | 29/02/2016 | | Sí | 0.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 35 | Desarrollo de las Jornadas de capacitación - marzo 2016 REALIZADO | 4. Ejecución | 07/03/2016 | | 31/03/2016 |  | Sí | 0.0 |
| 36 | Selección de facilitadores - septiembre 2016 REALIZADO | 4. Ejecución | 18/04/2016 | 31/07/2016 | |  | No | 0.0 |
| 37 | Pedido de elaboración de certificados de aprobación de las jornadas de capacitación Docente marzo 2016 al Vicerrectorado Administrativo REALIZADO | 4. Ejecución | 20/04/2016 | 29/07/2016 | |  | No | 0.0 |
| 38 | Desarrollo de las Jornadas de capacitación - septiembre 2016 REALIZADO | 4. Ejecución | 01/09/2016 | 30/09/2016 | |  | No | 0.0 |
| 39 | Pedido de elaboración de certificados de aprobación de las jornadas de capacitación Docente septiembre 2016 al Vicerrectorado Administrativo REALIZADO | 4. Ejecución | 18/10/2016 | 30/11/2016 | |  | No | 0.0 |
| 40 | Informe anual al Vicerrectorado Académico REALIZADO | 4. Ejecución | 20/12/2016 | 31/12/2016 | |  | No | 0.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 233,250.38 ** |
| Costo Total: | 900,000.00 |
| Total Devengado: | 233,250.38 |
| % Costo Total Devengado: | 25.92 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 25.92 %

Perfil Económico 2016

| | Años Previos | Año Actual (2016) | Años Futuros | Total |
|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Ppto. Planeado | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Codificado | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2016) | | 300,000.00 | | |
| Ppto. Programado | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Ppto. Devengado | 233,250.38 | 0.00 | 0.00 | 233,250.38 |
| Estimado a fin de año | * 233,250.38 | 0.00 | 0.00 | 233,250.38 |
| Variación Proyectada (Programado - Estimado) | 266,749.62 | 0.00 | 0.00 | 266,749.62 |
| % de Ppto. Programado vs. Devengado | * 46.65 % | 0.00 % | 0.00 % | 46.65 % |

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Feb | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Mar | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Abr | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| May | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 0.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2016 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Jul | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Total | 0.00 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 1 | Incrementar las competencias docentes y administrativas MEDIANTE la formación continua, réplica de conocimientos, sensibilización docente y programas de incentivos |

| Objetivos Operativos Matriciales | |
|---|--|
| UNACH >Vicerrectorado Académico >CIT de la Facultad de Ciencias de la Salud | |
| 1 | Incrementar la formación integral de docentes y estudiantes MEDIANTE la aplicación del Modelo Pedagógico y el Código de Ética de la UNACH. |
| UNACH >Vicerrectorado Académico >Centro de Educación Física | |
| 1 | Incrementar la práctica adecuada de la Actividad Física y Deportes, en la comunidad universitaria MEDIANTE las disciplinas ofertadas en el Centro de Educación Física, la motivación del uso adecuado del ocio y la operativización de escenarios deportivos. |
| 2 | Incrementar la sustentabilidad de la vinculación con la sociedad MEDIANTE programas y proyectos sostenibles con participación docente y/o discente alineados al Plan Estratégico de Vinculación con la sociedad. |
| UNACH >Vicerrectorado Académico >Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas | |
| 3 | Incrementar la producción científica docente y/o discente MEDIANTE la implementación del Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y saberes aplicables a la facultad |
| UNACH >Vicerrectorado Académico >Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías | |
| 1 | Incrementar la formación integral de docentes y estudiantes MEDIANTE la evaluación del Modelo Pedagógico. |
| 3 | Incrementar la producción científica docente y/o discente MEDIANTE la regulación del Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes aplicable a la Facultad |
| 4 | Incrementar la sustentabilidad de la vinculación con la sociedad MEDIANTE programas y proyectos sostenibles con participación docente y/o discente alineados al Plan Estratégico de Vinculación con la Sociedad. |
| UNACH >Vicerrectorado Académico >Unidad de Formación Académica y Profesionalización | |
| 1 | Incrementar la formación integral de docentes y estudiantes MEDIANTE la aplicación del Modelo Pedagógico y el Código de Ética de la UNACH. |
| UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano | |
| 13 | Incrementar la calidad de entrega de productos y servicios de Talento Humano, MEDIANTE, medición del clima laboral, la implementación de un Plan de capacitación, Implementación de un Sistema de Gestión de Información de Talento Humano, proyecto de Fortalecimiento Institucional, Diseño de un plan de descripción, valoración de puestos, plan de evaluación del desempeño y contratación del personal capacitado. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|---|--|--|---------------|
| 1 | Plan de Capacitación Aprobado del Personal Administrativo | Hito_32_Plan_de_Capacitación_Aprobado_del_Personal_Administrativo.pdf | 12/05/2015 |
| 2 | Cedula Presupuestaria con corte a septiembre 2014 | Hito_7_-_11_-_17_-_19_-_21_Cedula_presupuestaria.PDF | 15/10/2014 |
| 3 | Certificaciones viajes nacionales e internacionales | hito_26_ _Informes_certificación_viajes_ancionales_e_internacionales.pdf | 10/09/2015 |
| 4 | Consolidados 2015 - eventos de capacitación - ayudas económicas | Hito_23_-_24_-_26_-_28.pdf | 20/11/2015 |
| 5 | CPDIP - Diseño y aprobación del plan de capacitación del personal | Hito_2_-_Diseño_y_Aprobación_del_Plan_de_Capacitación__del_personal.pdf | 14/10/2014 |
| 6 | CPDIP Estudio de Prioridades para la Capacitación del año 2014 del personal | Hito_1_-_Estudio_de_Prioridades_para_la_capacitación_del_año_2014_del_personal.pdf | 14/10/2014 |
| 7 | Curso Criterios para la Articulación de Elementos de la Malla y Evaluación de la Construcción Mesocurricular | hito_23_24_28_29_Curso_Criterios_para_la_Articulación.pdf | 10/09/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 8 | Curso de Prueba de Hipótesis y Modelo Estadísticos con R para Investigación | hito_23_24_28_29_Curso_Prueba_d_Hipotesis.pdf | 18/09/2015 |
| 9 | Curso Epistemología y Diseño Curricular | hito_23_24_28_29Curso_Epistemología_y_Diseño.pdf | 18/09/2015 |
| 10 | Desarrollo de las Jornadas de capacitación agosto 2014 | Hito_16.- _Desarrollo_de_las_jornadas_de_capacitación_agosot_2014.PDF | 15/10/2014 |
| 11 | Desarrollo de las Jornadas de capacitación agosto 2014 | Hito_16.pdf | 15/10/2014 |
| 12 | Elaboración del Plan de Capacitación y pedido de aprobación | Hito_27._Plan_de_capacitación_2015_aprobado.pdf | 12/05/2015 |
| 13 | ENTREGA DE CERTIFICADOS | HITO_29._ENTREGA_DE_CERTIFICADOS_A_FACULTADES.pdf | 23/06/2015 |
| 14 | Entrega de certificados a docentes que aprobaron jornadas de capacitación febrero 2014 | Hito_13.- _Entrega_de_certificados_a_docentes_jornadas_febrero_2014.PDF | 14/10/2014 |
| 15 | Evaluación de la capacitación de febrero 2014 | Hito_6.- _Evaluación_de_la_capacitación_de_febrero_2014.pdf | 14/10/2014 |
| 16 | Evaluación jornadas capacitación agosto 2014 | Hito_18.- _Evaluación_jornadas_capacitación_agosto_2014.pdf | 15/10/2014 |
| 17 | Hito 28. Desarrollo del Plan Curso de Aulas Virtuales | 4._Ejecución_del_Plan_-_Curso_Aulas_Lic._Silva.pdf | 17/04/2015 |
| 18 | Hito 32 y 33 CPDIP.- PLAN DE CAPACITACIÓN 2016 DISEÑO, ELABORADO Y APROBADO | PLAN_DE_CAPACITACIÓN_CPDIP_APROBADO.pdf | 05/07/2016 |
| 19 | Hito 33 CPDIP DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016 | PLAN_DE_CAPACITACIÓN_CPDIP_APROBADO.pdf | 05/07/2016 |
| 20 | Hito 33 Presentación del Plan de Capacitación Anual 2016 al Vicerrectorado Académico | Hito_33_Plan_de_capacitación_2016.pdf | 30/03/2016 |
| 21 | HITO 34 Y 35 SELECCIÓN DE FACILITADORES Y DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN MARZO 2016 1 | PROPUESTA_E_INFORME_CURSO_DE_CAPACITACIÓN_05/07/2016 | 05/07/2016 |
| 22 | HITO 34 Y 35 SELECCIÓN DE FACILITADORES Y DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN MARZO 2016 2 | PROPUESTA_E_INFORME_CURSOS_DE_CAPACITACIÓN_05/07/2016 | 05/07/2016 |
| 23 | HITO 37. CPDIP - PEDIDO DE ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE MARZO 2016 | PEDIDO_DE_ELABORACIÓN_DE_CERTIFICADOS_JORNADAS_DE_CAPACITACIÓN_DOCENTE_MARZO_2016.pdf | 05/07/2016 |
| 24 | HITO 37. CPDIP - PEDIDO DE ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE LOS CURSOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN | PEDIDO_DE_ELABORACIÓN_DE_CERTIFICADOS.pdf | 05/07/2016 |
| 25 | Hito 7- 11 - 19 - 21 | Hito_7_-11_-17_-19_-21.PDF | 16/10/2014 |
| 26 | Hito. 28. 1. Desarrollo del Plan Curso de Aulas Virtuales | 4.1._Ejecución_del_Plan_Curso_Aulas_Dr._Carlos_Buenoño.pdf | 17/04/2015 |
| 27 | Hitos 7 - 11 - 17- 19 - 21 | Hito_7_-11_-17_-19_-21_Certificaciones.PDF | 15/10/2014 |
| 28 | INFORMA AULAS VIRTUALES | HITO_28.3._AULAS_VIRTUALES_-_POLITICAS.pdf | 23/06/2015 |
| 29 | INFORME AULAS VIRTUALES | HITO_28.4._MESOCURRICULO.pdf | 23/06/2015 |
| 30 | INFORME AULAS VIRTUALES | HITO_28._AULAS_VIRTUALES_-_SALUD.pdf | 23/06/2015 |
| 31 | INFORME AULAS VIRTUALES | HITO_28.1.AULAS_VIRTUALES_-_EDUCACIÓN.pdf | 23/06/2015 |
| 32 | INFORME AULAS VIRTUALES | HITO_28.2._AULAS_VIRTUALES_-_INGENIERÍA.pdf | 23/06/2015 |
| 33 | Informe favorable de asistencia a las capacitaciones del Personal Administrativo | Hito_30_Informe_favorable_del_Personal_Administrativo.pdf | 12/05/2015 |
| 34 | Jornadas de capacitación febrero 2014 | Hito_5.- _Jornadas_de_capacitación_a_docentes_febrero_2014.PDF | 14/10/2014 |
| 35 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA UNVERSION | MATRIZ_DE_SEGUIMIENTO_DE_LA_INVERSIÓN.pdf | 22/05/2015 |
| 36 | Personal administrativo capacitado agosto 2015 | HITO_2015_AGOSTO_DATH.PDF | 23/09/2015 |
| 37 | Personal administrativo capacitado julio 2015 | HITO_2015_JULIO_DATH.PDF | 23/09/2015 |
| 38 | Personal administrativo capacitado junio 2015 | HITO_2015_JUNIO_DATH.PDF | 23/09/2015 |
| 39 | Plan de capacitación y su aprobación - CPDIP | Hito_27.pdf | 28/02/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 40 | Programación jornadas de capacitación agosto 2014 | Hito_12.- _Programación_jornadas_de_capacitación_agosto_2014.pdf | 14/10/2014 |
| 41 | Recepción y Análisis de Solicitudes del Personal Administrativo | Hito_31_Recepción_y_Análisis_de_Solicitudes_del_Personal Administrativo.pdf | 20/05/2015 |
| 42 | Registro de Capacitación del personal administrativo 2015 | HITO_2015_DATH_PERSONAL_ADMINISTRATIVO.pdf | 23/09/2015 |
| 43 | Reglamento de Capacitación | Hito_1.pdf | 15/10/2014 |
| 44 | Selección y contratación de facilitadores - Pedidos de contrato a facilitadores - Suscripción de contratos a facilitadores - Pago de contartos a facilitadores jornadas febrer 2014 | Hito_3_-_8_-_10_-_11.PDF | 14/10/2014 |
| 45 | Selección y contratación de facilitadores - Pedidos de contrato a facilitadores - Suscripción de contratos a facilitadores - Pago de contartos a facilitadores jornadas febrer 2014 | Hito_3_-_8_-_10_-_11..PDF | 14/10/2014 |
| 46 | Selección - pago - realización de certificados facilitador segundo semestre 2015 | Hito_23_-_2_5_-_28_-_29.pdf | 20/11/2015 |
| 47 | Selección y contratación de facilitadores - Trámite de contratación para facilitadores - Pago de facilitadores de las jornadas de capacitación agosto 2014 | Hito_14_-_15_-_19.PDF | 15/10/2014 |
| 48 | Seminario Taller Didáctica y Pedagogía para la Enseñanza Universitaria | hito_23_24_28_29Seminario_Taller_Didactica_y_Pedag.pdf | 09/09/2015 |
| 49 | Trámite de certificación presupuestaria jornadas febrero 2014 | Hito_4.- _Trámite_de_certificación_presupuestaria_jornadas_febrero.PDF | 14/10/2014 |
| 50 | Trámite para pedidos de asistencia a cursos nacinales e internacionales primer quimestre - segundo cuatrimestre - tercer cuatrimestre | Hito_7_-_17_-_21..pdf | 14/10/2014 |
| 51 | Trámite para pedidos de asistencia a cursos nacinales e internacionales primer quimestre - segundo cuatrimestre - tercer cuatrimestre | Hito_7_-_17_-_21.PDF | 14/10/2014 |



UNACH
Vicerrectorado Administrativo
Departamento de Administración de Talento Humano
PROYECTO: 1001 Fortalecimiento Institucional

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Reyes Silva, Carlos Patricio (creyes@unach.edu.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Barba Maggi, María Angélica | Programas Relacionados: | Plan de Mejora UNACH |
| Titular: | Coloma Machado, Carlos Arturo | Prioridad: | 1 |
| Tipo de Proyecto: | Brainware - Talento Humano | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 91800000.0000.373857 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,138,371.06 |
| Tipo de Ppto. Externo: | Recursos Propios | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2012 - 31/12/2016 |
| Fecha de última actualización: | 04/07/2016 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2016 |
| Modificado por: | Reyes Silva, Carlos Patricio | Fecha del siguiente Hito: | 31/08/2016 |

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL:
 Actualmente la ley de servicio público, ley orgánica de educación superior establece el pago de una bonificación por jubilación y por renuncia voluntaria, por lo que con la finalidad de garantizar el reconocimiento económico que estas exigen se ha formulado el proyecto de fortalecimiento institucional, este proyecto contempla a los tres regímenes laborales. (LOES, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO)

PROPOSITO
 El cumplimiento oportuno en el pago a los servidores que se acogen al beneficio de la jubilación o renuncia voluntaria.

PRODUCTO
 Pago de la compensación

Beneficios Cualitativos

Con este proyecto se propende al buen vivir de las personas que han dedicado parte de su vida al servicio de la Universidad siendo justo y legal el pago de la indemnización por renuncia voluntaria o por acogerse al beneficio de la jubilación y que de manera oportuna planificaron su retiro.
 Ejecución de partida presupuestaria planificada.

Tipo de Beneficiario

Servidores que se acogen a la jubilación o renuncia voluntaria


Restricciones

Solo los servidores que se encuentran considerados en el presupuesto.
TIEMPO:
 Hasta 31 de diciembre del 2016
COSTO:
 2'500.000.00
ALCANCE:
 Solo los servidores que se encuentran considerados en el presupuesto.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.99 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

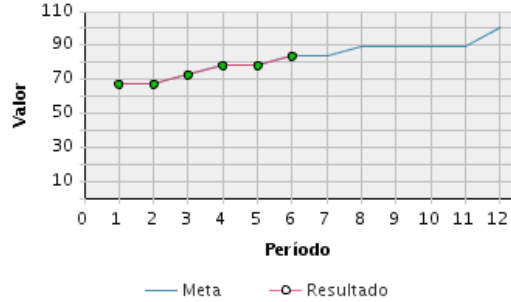

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2016 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 67 % | 67 % | 72 % | 78 % | 78 % | 84 % | 84 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 67 % | 67 % | 72 % | 78 % | 78 % | 84 % | | | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| JUNIO 2016.- Se apertura el proyecto y se realiza el pago al ing. Alfonso Burbano | Reyes Silva, Carlos Patricio | 01/07/2016 - 10:27 AM |
| MAYO 2016.- no se realiza ningún pago no se apertura el proyecto | Reyes Silva, Carlos Patricio | 01/07/2016 - 10:27 AM |
| ABRIL 2016.- no se realiza ningún pago no se apertura el proyecto | Reyes Silva, Carlos Patricio | 01/07/2016 - 10:26 AM |
| MARZO 2016.- no se realiza ningún pago no se apertura el proyecto | Reyes Silva, Carlos Patricio | 01/07/2016 - 10:26 AM |
| FEBRERO 2016.- no se realiza ningún pago no se apertura el proyecto | Reyes Silva, Carlos Patricio | 01/07/2016 - 10:26 AM |
| ENERO 2016.- no se realiza ningún pago no se apertura el proyecto | Reyes Silva, Carlos Patricio | 01/07/2016 - 10:25 AM |
| DICEMBRE 2015.- SE REALIZO PAGO A LINO CASTELO Y NARDO PESANTES | Reyes Silva, Carlos Patricio | 15/01/2016 - 12:03 PM |
| noviembre 2015 SE REALIZO PAGO POR AJUSTE DE CALCULO DOCENTE IRMA GRANIZO | Reyes Silva, Carlos Patricio | 15/01/2016 - 12:03 PM |
| OCTUBRE 2015.- EN EL MES DE OCTUBRE NO EXISTE MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO. | Reyes Silva, Carlos Patricio | 09/11/2015 - 10:32 AM |
| SEPTIEMBRE 2015.- EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO EXISTE MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO. | Reyes Silva, Carlos Patricio | 09/11/2015 - 10:31 AM |
| AGOSTO 2015.- EN ESTE MES NO EXISTEN PAGOS | Reyes Silva, Carlos Patricio | 21/09/2015 - 11:33 AM |
| JULIO 2015.- EN ESTE MES NO EXISTEN PAGOS | Reyes Silva, Carlos Patricio | 21/09/2015 - 11:33 AM |
| JUNIO 2015.- EN ESTE MES SE PAGO RENUNCIAS POR JUBILACIÓN A 2 PERSONAS Y POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS A 2 COMPAÑEROS, ESTOS PAGOS NO ESTUVIERON PROGRAMADOS EBN ESTE MES | Reyes Silva, Carlos Patricio | 30/07/2015 - 03:31 PM |
| MAYO 2015.- EN ESTE MES NO SE PLANIFICÓ EL PAGO DE RENUNCIAS POR JUBILACIÓN O VOLUNTARIAS SIN EMBARGO, SE REALIZÓ EL PAGO A DOS FUNCIONARIAS QUIENES SE ACOGIERON A LA JUBILACIÓN. | Reyes Silva, Carlos Patricio | 09/06/2015 - 10:55 AM |
| ABRIL 2015.- Se ha presentado la renuncia de parte de funcionarios, los cuales serán pagados en el mes de abril | Reyes Silva, Carlos Patricio | 08/05/2015 - 09:29 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| MARZO 2015.- Hasta la presente fecha no existe disponibilidad presupuestaria para el proyecto, se espera que para abril se asigne de parte del Ministerio de finanzas los recursos correspondientes | Reyes Silva, Carlos Patricio | 25/03/2015 - 09:17 AM |
| DICIEMBRE 2014.- Se procede al pago de la bonificación por renuncia de la señora Patricia Mejía así como por jubilación del master Cesar Herrera; además se considera el posible pago de la señora Marielena Espín por renuncia no planificada | Reyes Silva, Carlos Patricio | 25/03/2015 - 09:16 AM |
| NOVIEMBRE 2014.- Se tiene planificado el pago de la bonificación por jubilación de la Sra. Cristina Díaz. | Reyes Silva, Carlos Patricio | 02/12/2014 - 03:01 PM |
| OCTUBRE 2014: Se cancela la bonificación por jubilación a la señora InésChávez. | Reyes Silva, Carlos Patricio | 21/11/2014 - 04:33 PM |
| SEPTIEMBRE 2014: Se realiza el pago de la Bonificación por Jubilación del Economista Luis Sánchez | Reyes Silva, Carlos Patricio | 06/10/2014 - 12:56 PM |
| AGOSTO 2014: No se contemplo pago alguno por periodo de vacaciones | Reyes Silva, Carlos Patricio | 19/09/2014 - 03:57 PM |
| JULIO 2014.- Se ha procedido al pago de la bonificación por jubilación al master Mario Espinoza | Reyes Silva, Carlos Patricio | 19/09/2014 - 03:57 PM |
| junio 2014.- mediante cur de pago N° 4734 se procede a realizar el pago de la bonificación por jubilación de los señores Lic. Cesar Arias, MsC. Miguel Zuñiga | Reyes Silva, Carlos Patricio | 04/07/2014 - 12:37 PM |
| PAGO DE BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN A JOSE SÁNCHEZ Y LUIS VALLEJO, PRESUPUESTO DEVENGADO INFERIOR AL PROGRAMADO POR LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO, AL PAGAR PROPORCIONAL DE AL TIEMPO DE DEDICACIÓN DISMINUYE EL MONTO A INDEMNIZAR CORRESPONDE A MAYO 2014 | Reyes Silva, Carlos Patricio | 29/05/2014 - 10:02 AM |
| MEDIANTE CUR DE PAGO 2618 DEL 15 DE ABRIL 2014 SE PROCEDE AL PAGO DE LA BONIFICACION POR JUBILACION A FAVOR DE LOS DOCTORES LUIS JARA ZAMBRANO Y MIGUEL AVALOS OBREGON | Reyes Silva, Carlos Patricio | 29/05/2014 - 09:58 AM |
| Marzo 2014 se procede al pago de las bonificaciones por jubilación de Robalino Rodrigo, Lara Hernán, pago por renuncia voluntaria Benavides Raúl, mediante cur de pago N° 2140 y 2177 | Reyes Silva, Carlos Patricio | 03/04/2014 - 09:49 AM |
| Por tramites en SENPLADES y Ministerio de Finanzas no se realiza planificación de pagos en el mes de febrero 2014 | Coloma Machado, Carlos Arturo | 27/03/2014 - 04:12 PM |
| Por tramites en SENPLADES y Ministerio de Finanzas no se realiza planificación de pagos en el mes de enero 2014 | Coloma Machado, Carlos Arturo | 27/03/2014 - 04:11 PM |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| Proyecto.1. General. Calculo 0 CAUSARÍA la no ejecución presupuestaria e incumplimiento de metas | 09/06/2015 | Carlos Patricio Reyes Silva | 20 % | 30 | 6 | 0/1 |
| Organizacional.9. Otros. La no presentación de las renuncias CAUSARÍA incumplimeto en ejecución presupuestaria y de metas | 09/06/2015 | Carlos Patricio Reyes Silva | 20 % | 20 | 4 | 1/2 |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|---------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 1 | T1 - Proyecto en el SIPeIP, dictamen de prioridad y aprobación de SENPLADES-MEF, REGISTRADO Y APROBADO | 2. Definición | 02/05/2012 | | 02/05/2012 |  | Sí | 5.0 |



HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 2 | T1 - Presupuestación SOLICITADA Y APROBADA | 3. Planeación | 28/06/2013 | | 28/06/2013 | | Sí | 2.0 |
| 3 | T2 - Nomina de jubilación CALCULADA Y APROBADA | 3. Planeación | 28/06/2013 | | 28/06/2013 | | Sí | 2.0 |
| 4 | T1 - Proforma APROBADA | 3. Planeación | 10/01/2014 | | 10/01/2014 | | Sí | 2.0 |
| 5 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones marzo 2014 PAGADO | 4. Ejecución | 31/03/2014 | | 31/03/2014 | | Sí | 2.0 |
| 6 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones abril 2014 PAGADO | 4. Ejecución | 30/04/2014 | | 28/04/2014 | | Sí | 2.0 |
| 7 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones mayo 2014 PAGADO | 4. Ejecución | 31/05/2014 | | 29/05/2014 | | Sí | 2.0 |
| 8 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones junio 2014 PAGADO | 4. Ejecución | 30/06/2014 | | 30/06/2014 | | Sí | 2.0 |
| 9 | Primer informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2014 | 4. Ejecución | 10/07/2014 | | 10/07/2014 | | Sí | 2.0 |
| 10 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones julio 2014 PAGADO | 4. Ejecución | 31/07/2014 | | 31/07/2014 | | Sí | 2.0 |
| 11 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones septiembre 2014 PAGADO | 4. Ejecución | 30/09/2014 | | 30/09/2014 | | Sí | 2.0 |
| 12 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones octubre 2014 PAGADO | 4. Ejecución | 31/10/2014 | | 31/10/2014 | | Sí | 2.0 |
| 13 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones noviembre 2014 PAGADO | 4. Ejecución | 30/11/2014 | | 30/11/2014 | | Sí | 2.0 |
| 14 | Segundo informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2014 | 5. Cierre | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 3.0 |
| 15 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones diciembre 2014 PAGADO | 4. Ejecución | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 2.0 |
| 16 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones marzo 2015 PAGADO | 4. Ejecución | 31/03/2015 | | 31/03/2015 | | Sí | 6.6 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 17 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones abril 2015 PAGADO | 4. Ejecución | 30/04/2015 | | 30/04/2015 |  | Sí | 9.9 |
| 18 | Primer informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2015 | 4. Ejecución | 01/07/2015 | | 31/07/2015 |  | Sí | 0.0 |
| 19 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones julio 2015 PAGADO | 4. Ejecución | 01/07/2015 | | 31/07/2015 |  | Sí | 6.6 |
| 20 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones octubre 2015 PAGADO | 4. Ejecución | 01/10/2015 | | 30/10/2015 |  | Sí | 3.3 |
| 21 | Registros contables financieros ASENTADOS | 5. Cierre | 01/12/2015 | | 31/12/2015 |  | Sí | 0.0 |
| 22 | Segundo informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2015 | 4. Ejecución | 01/12/2015 | | 31/12/2015 |  | Sí | 0.0 |
| 23 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones diciembre 2015 PAGADO | 4. Ejecución | 01/12/2015 | | 31/12/2015 |  | Sí | 6.6 |
| 24 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones marzo 2016 PAGADO | 4. Ejecución | 31/03/2016 | | 31/03/2016 |  | Sí | 5.5 |
| 25 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones abril 2016 PAGADO | 4. Ejecución | 01/04/2016 | | 30/04/2016 |  | Sí | 5.5 |
| 26 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones junio 2016 PAGADO | 4. Ejecución | 01/06/2016 | | 30/06/2016 |  | Sí | 5.5 |
| 27 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones agosto 2016 PAGADO | 4. Ejecución | 01/08/2016 | 31/08/2016 | |  | No | 5.5 |
| 28 | T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones diciembre 2016 PAGADO | 4. Ejecución | 01/12/2016 | 20/12/2016 | |  | No | 5.5 |
| 29 | Informe de cumplimiento REALIZADO 2016 | 4. Ejecución | 19/12/2016 | 31/12/2016 | |  | No | 5.5 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Numero de renunciaciones pagadas versus número de renunciaciones planificadas |  | 50.00 % | 2 | 1 | 01/01/2014 | Junio |
| 2 | Porcentaje jubilación y/o retiro voluntario |  | 50.00 % | 20 | 10 | 03/03/2014 | Junio |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 1,500,000.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,138,371.06 ** |
| Costo Total: | 3,000,000.00 |
| Total Devengado: | 761,696.06 |
| % Costo Total Devengado: | 25.39 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 25.39 %

Perfil Económico 2016

| | Años Previos | Año Actual (2016) | Años Futuros | Total |
|--|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Ppto. Planeado | 1,013,000.00 | 376,675.00 | 0.00 | 1,389,675.00 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | | | | |
| Ppto. Aprobado Inicial | 1,013,000.00 | 376,675.00 | 0.00 | 1,389,675.00 |
| Ppto. Codificado | 771,000.00 | 376,675.00 | 0.00 | 1,147,675.00 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2016) | | 0.00 | | |
| Ppto. Programado | | | | |
| Ppto. Programado | 1,013,000.00 | 376,675.00 | 0.00 | 1,389,675.00 |
| Ppto. Devengado | 761,696.06 | 0.00 | 0.00 | 761,696.06 |
| Estimado a fin de año | * 761,696.06 | 376,675.00 | 0.00 | 1,138,371.06 |
| Variación Proyectada (Programado - Estimado) | 251,303.94 | 0.00 | 0.00 | 251,303.94 |
| % de Ppto. Programado vs. Devengado | * 75.19 % | 0.00 % | 0.00 % | 54.81 % |

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Feb | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Mar | 54,900.00 | | 54,900.00 | | | | |
| Abr | 15,402.50 | | 70,302.50 | | | | |
| May | 0.00 | | 70,302.50 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 70,302.50 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2016 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Jul | 0.00 | | 70,302.50 | | | | |
| Ago | 251,472.50 | | 321,775.00 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 321,775.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 321,775.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 321,775.00 | | | | |
| Dic | 54,900.00 | | 376,675.00 | | | | |
| Total | 376,675.00 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 13 | Incrementar la calidad de entrega de productos y servicios de Talento Humano, MEDIANTE, medición del clima laboral, la implementación de un Plan de capacitación, Implementación de un Sistema de Gestión de Información de Talento Humano, proyecto de Fortalecimiento Institucional, Diseño de un plan de descripción, valoración de puestos, plan de evaluación del desempeño y contratación del personal capacitado. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | HITO NO GENERADO PARA MAYO | JUBILACIONES_MAYO_2015.pdf | 09/06/2015 |
| 2 | PAGO POR JUBILACIONES Y RENUNCIAS VOLUNTARIAS JUNIO 2015 | JUBILACIONES_JUNIO_2015.pdf | 30/07/2015 |
| 3 | T1 - Hito 1 | Fortalecimiento_Institucional_2014_Dictamen.pdf | 02/12/2014 |
| 4 | T1 - Hito 2 | PRESUPUESTO_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL.pdf | 02/12/2014 |
| 5 | T2 - Hito 3 | Planificación_de_jubilaciones_aprobada.pdf | 02/12/2014 |
| 6 | T2, T3 - Hito 10 | PAGO_BONIFICACION_ESPINOZA_MARIO_CUR_6508_JUNIO_2014.pdf | 02/12/2014 |
| 7 | T2, T3 - Hito 11 | pago_bonificacion_por_jubilacion_Sanchez_CUR_10178_SEPTIEMBRE_2014.pdf | 02/12/2014 |
| 8 | T2, T3 - Hito 12 | PAGO_BONIFICACIÓN_POR_JUBILACION_CHAVEZ_CUR_00582004_OCTUBRE_2014.pdf | 02/12/2014 |
| 9 | T2, T3 - Hito 13 | PAGO_BONIFICACIÓN_JUBILACIÓN_DIAZ_NOVIEMBRE_2014.pdf | 02/12/2014 |
| 10 | T2, T3 - Hito 5 | Pago_de_beneficio_por_jubilacion_Benavides_Lara_Robalillo_CUR_1140_2201_MARZO_2014.pdf | 02/12/2014 |
| 11 | T2, T3 - Hito 6 | PAGO_BONIFICACION_DE_JARA_Y_AVALOS_CUR_2618_ABRIL_2014.pdf | 02/12/2014 |
| 12 | T2, T3 - Hito 7 | pago_bonificaciones_DE_SANCHES_VALLEJO_CUR_41020112_2014.pdf | 02/12/2014 |
| 13 | T2, T3 - Hito 8 | PAGO_JUBILACIONES_DE_ARIAS_-ZUÑIGA_CUR_4734_JUNIO_2014.pdf | 02/12/2014 |
| 14 | T2, T3 HITO 26 | PAGO_ALFONSO_BURBANO.pdf | 01/07/2016 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------|
| Huilca Alvarez, Silvana Paola | Analista 1 | Asistente Ejecutiva de Remuneraciones y Procesamiento de Datos | shuilca@unach.edu.ec | |
| Reyes Silva, Carlos Patricio | Aprovador | Jefe de Remuneraciones y Procesamiento de Datos | creyes@unach.edu.ec | |
| Sanandres Alvarez, María Renata | Analista | Analista de Remuneraciones y Procesamiento de Datos | rsanandres@unach.edu.ec | |
| Vinueza Cevallos, Gissela Paola | Verificador | Subjefa de Remuneraciones y Procesamiento de Datos | gvinueza@unach.edu.ec | |



UNACH
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación
Instituto de Investigaciones ICITS

PROYECTO: I016 Becas Cuarto Nivel PhD

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto (lcepeda@unach.edu.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Barba Maggi, María Angélica | Programas Relacionados: | Plan de Mejora UNACH |
| Titular: | | Prioridad: | 1 |
| Tipo de Proyecto: | Brainware - Talento Humano | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 91510000.727.7353 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,502,874.72 |
| Tipo de Ppto. Externo: | Recursos Propios | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 18/04/2012 - 31/12/2016 |
| Fecha de última actualización: | 18/07/2016 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2014 |
| Modificado por: | Avendaño Herrera, Fernando Octavio | Fecha del siguiente Hito: | 30/12/2016 |

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL:

El mejoramiento académico de la UNACH está en función de la formación académica de los docentes y por tanto se requiere un programa que impulse y apoye para que los docentes titulares realicen estudios de Cuarto Nivel PhD.

PROPOSITO:

Desarrollar un programa de becas y ayudas económicas que brinde apoyo con el financiamiento para la realización de estudios en el exterior a nivel de Doctorado PhD a los Docentes titulares de la UNACH durante la ejecución del proyecto.

PRODUCTOS

Al menos 12 becas otorgadas por año a docentes agregados a tiempo completo de la UNACH para que cursen estudios Phd en el exterior.

Beneficios Cualitativos

Considerando la necesidad que tienen conforme a la Ley de Educación Superior los docentes de tener el grado de PhD, la UNACH ha formulado un programa de becas de 4to nivel; para lo cual inicialmente se prevee que se cuente con la reglamentación correspondiente que viabilice el financiamiento para otorgar becas a los docentes de la UNACH para que realicen estudios de PhD.

La UNACH cumpla con los indicadores establecidos por los organismos de control de Educación Superior para la acreditación institucional y para su recategorización.

Al término de la ejecución del proyecto se dispone de una nómina definitiva de al menos 36 docentes titulares de la UNACH que se benefician con las becas o ayudas económicas para estudios de PhD.

La UNACH contará con una planta docente con alto nivel formativo que contribuye directamente al incremento del nivel académico.

Tipo de Beneficiario

Constituyen los 223 docentes e investigadores titulares varones y mujeres de la UNACH, que potencialmente pueden aplicar a las postulaciones para ser adjudicatario de las becas o ayudas económicas, de los cuales el 65% son hombres y el 35% son mujeres.

Restricciones

TIEMPO: 5 años


COSTO: 1.661.347,74 USD

ALCANCE: Institucional dirigido a docentes titulares agregados y auxiliares.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.86 %
 Fecha de Inicio: 18/04/2012 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2016 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|---|
| <p>ENERO 2016 Elaboración de formulario de seguimiento a docentes beneficiarios del proyecto Becas PhD Cuarto Nivel-</p> <p>FEBRERO 2016 Elaboración y revisión de instrumentos de planificación POA, PAC. PPC del proyecto Becas PhD. Certificación de la Dirección de Planificación del monto asignado para el proyecto Becas PhD para ingresarse al Sistema SIPeIP.</p> <p>MARZO 2016 Entrega de instrumentos de planificación y aprobación de los mismos en la Dirección de Planificación.</p> <p>ABRIL 2016 No se obtiene aun la certificación presupuestaria del proyecto Becas PhD.</p> <p>MAYO 2016 No se dispone aun de la certificación presupuestaria del Proyecto Becas PhD.</p> <p>JUNIO 2016 Certificación de la Dirección Financiera que indica la autorización del Ministerio de Finanzas autorizando reforma presupuestaria que da paso a la habilitación de los proyectos de inversión entre otros del proyecto Becas PhD por un monto de 55.068,00 usd. Cédula presupuestaria por el monto de 55.068,00 usd emitida por la Jefatura de presupuesto.</p> <p>JULIO 2016 Cédula preupuestaria emitida por la Jefatura de presupuesto por el monto de 63.918,71 usd. Se realiza transferencias de cuotas pendientes a dos beneficiarios de becas permanentes, cubriendo el total del monto asignado para el periodo 2016.</p> | <p>Avendaño Herrera, Fernando Octavio</p> | <p>15/07/2016 - 05:10 PM</p> |
| <p>Durante el período comprendido entre los meses de enero a mayo del 2014 en el Proyecto Becas de Cuarto Nivel PhD se ha cumplido con: La obtención del Dictámen de Prioridad otorgado por la Señora Rectora de la Institución. La obtención del Dictámen Favorable otorgado por la SENPLADES. Se obtiene la Certificación Presupuestaria emitida por la Dirección Financiera de la UNACH. Se realiza la Convocatoria 2014 para la postulación a Becas Cuarto nivel PhD. El H. Consejo Universitario aprueba a dos Docentes de la UNACH la licencia con la remuneración total de funciones de Docentes para que realicen estudio de PhD en el exterior.</p> | <p>Avendaño Herrera, Fernando Octavio</p> | <p>15/07/2016 - 04:44 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Se adjunta listado de Docentes beneficiados en el año 2013 con becas y ayudas económicas para cursar estudio de PhD. Se realiza los primeros desembolsos a dos docentes becados. El avance técnico del proyecto se cumple de acuerdo a lo programada. FEBRERO 2015 Los beneficiarios de las becas y ayudas económicas presentan justificativos de los recursos entregados para solicitar el siguiente desembolso. Se cuenta con la resolución de Comité de Becas para Convocatoria 2015 para la postulación a Becas Cuarto nivel P</p> <p>ABRIL 2015 Se realiza la convocatoria a becas 2015 en medios impresos y digitales a los docentes titulares que postulen para cursar estudios de cuarto nivel.</p> <p>MAYO 2015 Se encuentra vigente la convocatoria a docentes de la UNACH, para que presente la postulación a becas y ayudas económicas. Se está recibiendo solicitudes y documentación de nuevos postulantes a becas y ayudas económicas. No se pueden realizar los pagos de las alcuotas respectivas de las becas y ayudas económicas a los docentes que tienen este beneficio, por cuanto se está realizando una reforma al reglamento de becas y ayudas económicas, mismo que aún no se aprueba.</p> <p>JUNIO 2015 Se encuentra en proceso de formulación las reformas al Reglamento de becas y ayudas económicas.</p> <p>JULIO 2015 Se encuentra en proceso de formulación las reformas al Reglamento de becas y ayudas económicas. Se definen las áreas prioritarias de estudio que al Universidad Nacional de Chimborazo financia para becas para estudios de postgrado.</p> <p>AGOSTO 2015 Se encuentra en proceso de formulación las reformas al Reglamento de becas y ayudas económicas, a presentarse para su aprobación definitiva en el H. Consejo Universitario en los próximos días. Se elabora el baremo para el otorgamiento de becas de estudio de posgrado para docentes de la UNACH.</p> <p>SEPTIEMBRE 2015 Aprobación del Reglamento para el otorgamiento de becas, licencias, comisiones de servicio y período sabático, destinados al perfeccionamiento docente del personal académico de la Universidad Nacional de Chimborazo el 17, 21 y 23 de septiembre del 2015. Convocatoria por el Comité de Becas y Ayudas Económicas para Becas para Estudios de cuarto nivel : Maestría, Doctorado PhD, mediante Resolución No. 010-CBYAE-30-09-2015.</p> <p>OCTUBRE 2015 Aprobación del PLAN DE FORMACIÓN DE POSGRADO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PRIORIZANDO LOS CAMPOS O ÁREAS DE ESTUDIO, aprobado mediante Resolución NO. 0221-HCU-02-10-2015. Pedido en función del nuevo Reglamento de Becas aprobado por el HCU, para la reforma presupuestaria para trasladar 80.000,00 USD del proyecto Becas Cuarto Nivel Maestría al proyecto Becas Cuarto Nivel PhD, mediante Of. No. 062-S-CBYAE-2015, del 21 de octubre del 2015. Recepción de documentación habilitante a los postulantes a Becas para estudios de cuarto nivel : Maestría, Doctorado PhD.</p> <p>NOVIEMBRE 2015 Revisión de documentación habilitante y calificación de postulantes a Becas para estudios de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD. Se dispone de la nomina de docentes titulares que califican para la obtención de Becas para estudios cuarto nivel Maestría, Doctorado PhD (2015).</p> <p>DICIEMBRE 2015 Adjudicación de 19 becas a docentes que cumplen con documentación habilitante.</p> | | |
| <p>PERIODO 2013:</p> | <p>Benitez Pérez, Vicente Eduardo</p> | <p>24/03/2014 - 03:57 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------|-------------------------------|
| <p>Se encuentra aprobado el Reglamento e Instructivo para el otorgamiento de Becas para cursar estudios de PhD en el exterior y Año Sabático para los Docentes agregados a tiempo completo de la UNACH.</p> <p>Se cumple la promoción y la convocatoria 2013 para la adjudicación de becas.</p> <p>Se encuentra aprobada la reforma del Reglamento vigente para incluir Ayudas Económicas a Docentes para cursar estudios de PhD en el exterior.</p> <p>El avance técnico es del 99%.</p> <p>Se han beneficiado a 31 docentes con el financiamiento de las becas y ayudas económicas; para realizar estudios de PhD en países de Latinoamérica y Europa.</p> <p>Hasta la fecha se ha devengado el 100% del presupuesto del proyecto</p> | | |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO


| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <p>Proyecto.2. Alcance. No aprobación de los estudios por parte de los becarios CAUSARIA el incumplimiento de las exigencias que tiene la UNACH con los organismos de control de Educación Superior</p> | 10/04/2014 | Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo | 10 % | 70 | 7 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|---------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | Reglamento de Becas, revisado, analizado por el H. Consejo Universitario y APROBADO. | 3. Planeación | 18/04/2012 | | 18/04/2012 | | Sí | 15.0 |
| 2 | Convocatoria 2012 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA | 4. Ejecución | 30/04/2012 | | 30/04/2012 | | Sí | 10.0 |
| 3 | Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2012 ENTREGADO | 4. Ejecución | 19/12/2012 | | 19/12/2012 | | Sí | 10.0 |
| 4 | Convocatoria 2013 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA | 4. Ejecución | 31/01/2013 | | 31/01/2013 | | Sí | 10.0 |
| 5 | Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2013 ENTREGADO | 4. Ejecución | 18/12/2013 | | 18/12/2013 | | Sí | 10.0 |
| 6 | Convocatoria 2014 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA | 4. Ejecución | 30/04/2014 | | 30/04/2014 | | Sí | 10.0 |
| 7 | Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2014 ENTREGADO | 4. Ejecución | 30/12/2014 | | 30/12/2014 | | Sí | 10.0 |
| 8 | Convocatoria 2015 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA | 4. Ejecución | 30/04/2015 | | 30/04/2015 | | Sí | 5.0 |
| 9 | Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2015 ENTREGADO | 4. Ejecución | 30/12/2015 | | 30/12/2015 | | Sí | 10.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 10 | Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2016 ENTREGADO | 4. Ejecución | 30/12/2016 | 30/12/2016 | |  | No | 10.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Incremento de Docentes de la UNACH con grado PhD | — | - | - | - | 01/01/2016 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,502,874.72 ** |
| Costo Total: | 1,661,347.74 |
| Total Devengado: | 1,166,793.43 |
| % Costo Total Devengado: | 70.23 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 70.23 %

Perfil Económico 2016

| | Años Previos | Año Actual (2016) | Años Futuros | Total |
|---|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Ppto. Planeado | 1,261,347.74 | 400,000.00 | 0.00 | 1,661,347.74 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| Ppto. Codificado | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2016) | | 400,000.00 | | |
| Ppto. Programado | 1,261,347.74 | 400,000.00 | 0.00 | 1,661,347.74 |
| Ppto. Devengado | 1,102,874.72 | 63,918.71 | 0.00 | 1,166,793.43 |
| Estimado a fin de año | * 1,102,874.72 | 0.00 | 0.00 | 1,102,874.72 |
| Variación Proyectada (Programado - Estimado) | 158,473.02 | 400,000.00 | 0.00 | 558,473.02 |
| % de Ppto. Programado vs. Devengado | * 87.44 % | 15.98 % | 0.00 % | 70.23 % |

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016

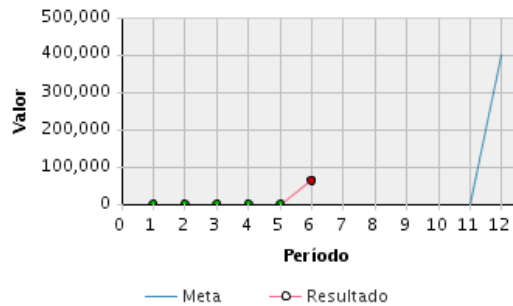

Presupuesto Mensual 2016

| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2016 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Jun | 0.00 | 63,918.71 | 0.00 | 63,918.71 | 115.00 % | | 15.98 % |
| Jul | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Dic | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | | |
| Total | 400,000.00 | 63,918.71 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 2 | Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 1 | | certificacion_financiera_becas_2014.pdf | 12/06/2014 |
| 2 | | CONVOCATORIA_BECAS_2014.pdf | 12/06/2014 |
| 3 | | DICTAMEN_BECAS_2014.pdf | 12/06/2014 |
| 4 | | DICTAMEN_FAVORABLE_BECAS_2014.pdf | 12/06/2014 |
| 5 | | POA_BECAS_2014.pdf | 12/06/2014 |
| 6 | | NOMINA_DE_BECAADOS_2013.pdf | 12/06/2014 |
| 7 | | RES_HCU_OTORGA_BECAS_2014.pdf | 12/06/2014 |
| 8 | | Res_008-HCU-12-01-2015_noramtiva_becas_ayudas_economicas.pdf | 30/04/2015 |
| 9 | | Convocatoria_becas_2015_032-cbyae-21-02-2015.PDF | 30/04/2015 |
| 10 | | CONVOCATORIA_A_BECAS_y_AYUDAS_ECONOMICAS-2015.PDF | 30/04/2015 |
| 11 | | cONVOCATORIA_WEB_2015.PDF | 30/04/2015 |
| 12 | | Convocatoria_Becas_2015.PDF | 30/11/2015 |
| 13 | | REGLAMENTO_PARA_EL_OTORGAMIENTO_DE_BECAS_BONIFICACIONES_COMISIONES_DE | 30/11/2015 |
| 14 | | Resolucion_221-HCU-Plan_de_Formacion_de_Posgrado_y_Areas_Prioritarias.PDF | 30/11/2015 |
| 15 | | Matriz_becas_2015_postulaciones.xlsx | 30/11/2015 |
| 16 | AREAS DE ESTUDIO QUE LA UNACH FINANCIA PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO | areas_UNACH.docx | 18/09/2015 |
| 17 | BAREMO PARA OTORGAMIENTO DE BECAS A DOCENTES UNACH | Baremo_becas_2015_ultimo.xlsx | 18/09/2015 |
| 18 | CEDULA PRESUPUESTARIA BECAS PhD 2016 | cedula_de_becas_para_2016.pdf | 15/07/2016 |
| 19 | CEDULAS PRESUPUESTARIAS BECAS PhD 2016 | CEDULAS_PRESUPUESTARIAS_BECAS_2016_JULIO.PDF | 15/07/2016 |
| 20 | Evidencia de comprobantes de pago de becas- año 2014 | Becas_entregadas_2014.pdf | 05/10/2014 |
| 21 | FORMULACIÓN DE REGLAMENTO DE BECAS REFORMADO | REGLAMENTOS_DE_BECAS.doc | 18/09/2015 |
| 22 | GENERAL. matriz financiera 2014 - 2015 | Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx | 01/06/2015 |
| 23 | POA BECAS PhD 2016 | poa_becas_2016.PDF | 15/07/2016 |
| 24 | PRESUPUESTO BECAS PhD 2016 | 54-DPI-UNACH-PRESUPUESTO_BECAS_PHD_2016_400MIL(1).pdf | 15/07/2016 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto | Director del proyecto | Vicerrector de Postgrado e Investigación | lcepeda@unach.edu.ec | |



UNACH
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación
Instituto de Investigaciones ICITS

PROYECTO: I035 Becas Cuarto Nivel - Maestrías e incentivos a producción intelectual

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto (lcepeda@unach.edu.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Barba Maggi, María Angélica | Programas Relacionados: | Plan de Mejora UNACH |
| Titular: | | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Brainware - Talento Humano | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 91800000.0000.378313 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 310,000.00 |
| Tipo de Ppto. Externo: | Recursos Propios | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/04/2014 - 31/12/2016 |
| Fecha de última actualización: | 19/07/2016 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2016 |
| Modificado por: | Avendaño Herrera, Fernando Octavio | Fecha del siguiente Hito: | 30/09/2015 |

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL:

El mejoramiento académico de la UNACH está en función de la formación académica de los docentes y por tanto se requiere el otorgamiento de becas y ayudas económicas para que los docentes de la institución para que realicen estudios de Maestrías en el área en que ejercen la docencia. Así como la baja producción intelectual se debe a la carencia de incentivos que fomenten la actividad investigativa en los docentes de la UNACH.

PROPOSITO:

Desarrollar un sistema de becas y ayudas económicas que brinde apoyo con el financiamiento para la realización de estudios de Maestría en áreas afines al ejercicio docente, a los docentes titulares de la UNACH, para el incremento de sus capacidades y potencialidades académicas y técnicas, contribuyendo al cumplimiento de requerimientos de acreditación y recategorización institucional. Implementar un sistema de incentivos a la producción intelectual para fomentar la actividad investigativa en los docentes de la UNACH.

PRODUCTOS

Becas y ayudas económicas otorgadas por año a docentes agregados a tiempo completo de la UNACH para que cursen estudios de Maestría en el exterior.

Incentivos económicos entregados a docentes que tienen producción intelectual.

Beneficios Cualitativos

Considerando la necesidad que tiene conforme a la Ley de Educación Superior, la UNACH ha formulado el desarrollo de un sistema de becas y ayudas económicas; para lo cual inicialmente se prevee que se cuente con la reglamentación correspondiente que viabilice el financiamiento para otorgar el financiamiento a los docentes de la UNACH para que realicen estudios de Maestría en la carrera afín a su ejercicio docente.

Que se incremente la producción intelectual de la UNACH, mediante el reconocimiento económico a la producción intelectual de los docentes.

La UNACH cumpla con los indicadores establecidos por los organismos de control de Educación Superior para la acreditación institucional y para su recategorización.

Al término de la ejecución del proyecto se dispone de una nómina definitiva de al menos 36 docentes titulares de la UNACH que se benefician con las becas para estudios de Maestría.

La UNACH contará con una planta docente con alto nivel formativo que contribuye directamente al incremento del nivel académico.

Tipo de Beneficiario

La población de 102 docentes titulares que no tiene grado de Maestría, de los cuales el 78,4% son hombres y el 21,6% son mujeres-

Restricciones

TIEMPO: 3 años


COSTO: 900.000 USD

ALCANCE: Institucional dirigido a docentes titulares agregados y auxiliares.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.63 %
 Fecha de Inicio: 01/04/2014 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

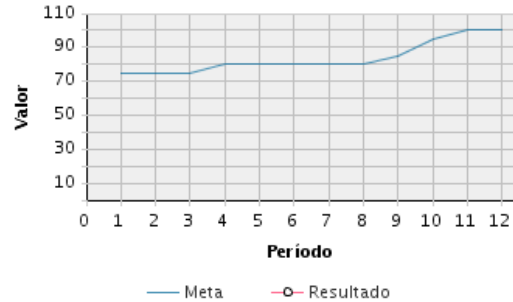

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2016 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 75 % | 75 % | 75 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 85 % | 95 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| <p>Las ayudas económicas o becas para cursar estudios de Maestría en Universidades de dentro o fuera del país, únicamente aquellos que son titulares, y que pertenezcan a cualquier categoría así como a cualquiera de los tiempos de dedicación, conforme a la reglamentación vigente. En consecuencia la población objetivo para obtener este beneficio corresponde específicamente a una población de 223 Docentes que laboran en la UNACH.</p> <p>Es importante que la Universidad impulse la investigación dotando de incentivos económicos a los Docentes que demuestran los productos de sus investigaciones como reconocimiento del esfuerzo desplegado.</p> <p>Inicialmente la proyección financiera del proyecto en 900.000,00 usd, distribuidos 300.000,00 usd anuales con período de duración de 3 años. Sin embargo el primer período (año 2014) se realiza una reforma presupuestaria del proyecto dejando un monto asignado de 100.000,00 usd. Para el año 2015 se disminuye el presupuesto general institucional y se asigna para este proyecto un monto de 80.000,00 usd.</p> <p>MARZO 2015 La Dirección Financiera comunica con fecha 31 de marzo del 2015 que el Ministerio de Finanzas habilitó el proyecto de inversión Becas Cuarto Nivel Maestrías, solicita realizar las formalidades técnicas para su ejecución. Se dispone la resolución No. 002-CBYAE-24-02-2015 de Comité de Becas para la Convocatoria 2015 para la Postulación a Becas Cuarto Nivel. Mediante resolución No. 0008-UCU-12-01-2015 aprueba la reforma al reglamento reformado para el otorgamiento de becas y ayudas económicas para estudios de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD, Posdoctorado y Concesión de periodo sabático para el personal académico de la UNACH.</p> <p>ABRIL 2015 Publicación en la web institucional de la convocatoria 2015 para becas y ayudas económicas para estudios de cuarto nivel.</p> <p>MAYO 2015 Se encuentra vigente la convocatoria para la postulación de docentes a becas y ayudas económicas. Se están recibiendo solicitudes y documentación de docentes postulantes a beneficiarse de becas o ayudas económicas otorgadas por la UNACH. No se entrega las cuotas respectivas a los beneficiarios, debido que se está realizando una reforma al reglamento de becas y ayudas económicas, y aún no se encuentra aprobado por las instancias competentes.</p> | Avendaño Herrera, Fernando Octavio | 30/11/2015 - 11:02 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| <p>JUNIO Y JULIO 2015 Se está realizando la reforma al Reglamento de becas y ayudas económicas. Se han determinado las áreas de estudio que la UNACH financia para la realización de estudios de postgrado.</p> <p>AGOSTO 2015 Se está realizando la reforma al Reglamento de becas y ayudas económicas, para presentarse al H. Consejo Universitario para su aprobación. Se ha elaborado el baremo para el otorgamiento de becas para estudios de postgrado a docentes de la UNACH.</p> <p>SEPTIEMBRE 2015 Aprobado el Reglamento para el otorgamiento de becas, licencias, comisiones de servicio y periodo sabático, destinados al perfeccionamiento del personal académico de la UNACH, el 17, 21 y 23 de septiembre de 2105. Convocatoria para Becas de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD mediante Resolución No. 010-CBYAE-30-09-2015.</p> <p>OCTUBRE 2015 Aprobado el PLAN DE FORMACIÓN DE POSGRADO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PRIORIZANDO LOS CAMPOS O ÁREAS DE ESTUDIO, aprobado mediante Resolución NO. 0221-HCU-02-10-2015. Pedido en función del nuevo Reglamento aprobado, de reforma presupuestaria para traslado de 80.000,00 USD del proyecto de Becas cuarto nivel Maestrías al proyecto de Becas cuarto nivel PhD. Recepción y revisión de documentación habilitante de los postulantes a becas de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD.</p> <p>NOVIEMBRE 2015 Transferencia de fondos conforme a la reforma presupuestaria. Calificación de los beneficiarios a becas de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD. Nómina de beneficiarios de becas de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD.</p> | | |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| Proyecto.1. General. Falta de interes por parte de los Docentes por tener formación de cuarto nivel en el área de docencia CAUSARIA incumplimiento de indicadores de acreditación de la UNACH | 11/05/2014 | Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo | 50 % | 80 | 40 | 0/0 |
| Falta de incentivos a la producción intelectual CAUSARIA baja producción científica de los docentes | 11/05/2014 | Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo | 40 % | 80 | 32 | 0/0 |
| Organizacional.1. Certificación CEAACES. No asignación oportuna de recursos económicos CAUSARIA no financiamiento de becas y ayudas económicas a Docentes | 11/05/2014 | Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo | 10 % | 90 | 9 | 0/0 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|---------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 1 | El H.Consejo Universitario aprueba la reglamentación para el otorgamiento de becas | 3. Planeación | 30/08/2014 | | 30/08/2014 |  | Sí | 5.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | y ayudas económicas para estudios de Maestría para Docentes de la UNACH | | | | | | | |
| 2 | Se realiza primera convocatoria a Docentes Titulares de la UNACH para postulación a becas y ayudas económicas para estudios de Maestrias en áreas afines a su ejercicio docente | 4. Ejecución | 05/09/2014 | | 05/09/2014 | | Sí | 10.0 |
| 3 | Recepción de documentación habilitante de los postulantes | 4. Ejecución | 30/09/2014 | | 30/09/2014 | | Sí | 10.0 |
| 4 | Selección de postulantes para otorgamiento de becas y ayudas económicas | 4. Ejecución | 31/10/2014 | | 31/10/2014 | | Sí | 10.0 |
| 5 | Otorgamiento de becas y ayudas económicas a postulantes seleccionados | 4. Ejecución | 30/12/2014 | | 30/12/2014 | | Sí | 10.0 |
| 6 | Segunda convocatoria a Docentes Titulares de la UNACH para postulación a becas y ayudas económicas para estudios de Maestrias en áreas afines a su ejercicio docente | 4. Ejecución | 30/04/2015 | | 30/04/2015 | | Sí | 5.0 |
| 7 | Recepción de documentación habilitante de los postulantes | 4. Ejecución | 30/09/2015 | 30/09/2015 | | | No | 5.0 |
| 8 | Selección de postulantes para otorgamiento de becas y ayudas económicas | 4. Ejecución | 30/10/2015 | 30/10/2015 | | | No | 10.0 |
| 9 | Otorgamiento de becas y ayudas económicas a postulantes seleccionados | 4. Ejecución | 30/12/2015 | 30/12/2015 | | | No | 10.0 |
| 10 | Tercera convocatoria a Docentes Titulares de la UNACH para postulación a becas y ayudas económicas para estudios de Maestrias en áreas afines a su ejercicio docente | 4. Ejecución | 29/04/2016 | 29/04/2016 | | | No | 5.0 |
| 11 | Recepción de documentación habilitante de los postulantes | 4. Ejecución | 30/09/2016 | 30/09/2016 | | | No | 5.0 |
| 12 | Selección de postulantes para otorgamiento de becas y ayudas económicas | 4. Ejecución | 31/10/2016 | 31/10/2016 | | | No | 10.0 |
| 13 | Otorgamiento de becas y ayudas económicas a postulantes seleccionados | 4. Ejecución | 30/11/2016 | 30/11/2016 | | | No | 5.0 |
| 14 | Informe de cierre de proyecto | 5. Cierre | 30/12/2016 | 30/12/2016 | | | No | 0.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 310,000.00 ** |
| Costo Total: | 390,000.00 |
| Total Devengado: | 10,000.00 |
| % Costo Total Devengado: | 2.56 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 2.56 %

Perfil Económico 2016

| | Años Previos | Año Actual (2016) | Años Futuros | Total |
|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Ppto. Planeado | 180,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2016) | | 300,000.00 | | |
| Ppto. Programado | 380,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 680,000.00 |
| Ppto. Devengado | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Estimado a fin de año | * 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Variación Proyectada (Programado - Estimado) | 370,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| % de Ppto. Programado vs. Devengado | * 2.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.47 % |

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016

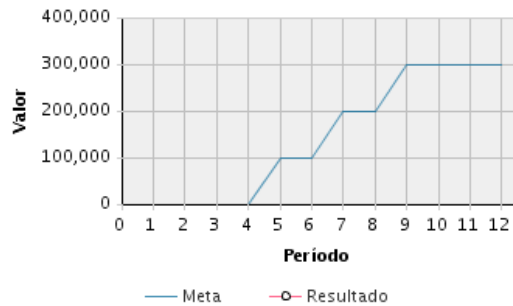

Presupuesto Mensual 2016

| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Feb | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Mar | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Abr | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| May | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 100,000.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2016 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Jul | 100,000.00 | | 200,000.00 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 200,000.00 | | | | |
| Sep | 100,000.00 | | 300,000.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 300,000.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 300,000.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 300,000.00 | | | | |
| Total | 300,000.00 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 2 | Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 1 | | BECAS_MAESTRIA-POA_2014-ok.xlsx | 05/12/2014 |
| 2 | | Dictamen_Favorable.PDF | 05/12/2014 |
| 3 | | Res_008-HCU-12-01-2015_noramtiva_becas_ayudas__economicas.pdf | 30/04/2015 |
| 4 | | Convocatoria_becas_2015_032-cbyae-21-02-2015.PDF | 30/04/2015 |
| 5 | | cONVOCATORIA_WEB_2015.PDF | 30/04/2015 |
| 6 | | CONVOCATORIA_A_BECAS_y_AYUDAS_ECONOMICAS-2015.pdf | 30/04/2015 |
| 7 | | Convocatoria_Becas_2015.PDF | 30/11/2015 |
| 8 | | REGLAMENTO_PARA_EL_OTORGAMIENTO_DE_BECAS_2015.COMISIONES_DE | 30/11/2015 |
| 9 | | Resolucion_221-HCU-Plan_de_Formacion_de_Posgrado_y_Areas__Prioritarias.PDF | 30/11/2015 |
| 10 | | Matriz_becas_2015_postulaciones.xlsx | 30/11/2015 |
| 11 | AREAS DE ESTUDIO QUE FINANCIA LA UNACH PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO | areas_UNACH.docx | 18/09/2015 |
| 12 | BAREMO PARA OTORGAMIENTO DE BECAS A DOCENTES DE LA UNACH | Baremo_becas__2015_ultimo.xlsx | 18/09/2015 |
| 13 | Convocatoria becas y ayudas económica - Maestrías | convocatoriamaestria.pdf | 05/10/2014 |
| 14 | Convocatoria en la web insitucional a becas y ayudas económicas - Maestrías | CONVOCATORIA_EN_LA_WEB_INSTITUCIONAL.pdf | 05/10/2014 |
| 15 | FORMULACIÓN DE REGLAMENTO DE BECAS REFORMADO | REGLAMENTOS_DE_BECAS.doc | 18/09/2015 |
| 16 | GENERAL. matriz financiera 2014 - 2015 | Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx | 01/06/2015 |
| 17 | PLAN DE ACCION | plan_de_accion__16_oct.pdf | 19/07/2016 |
| 18 | Reglamento de becas y ayudas económicas para estudios de Maestría APROBADO | BECAS_MAESTRIA-2.doc | 05/10/2014 |
| 19 | SIPeIP 2014 - Becas y ayudas económicas - Maestrías | sip_maestria_2014_presupuesto.PDF | 05/10/2014 |
| 20 | Solicitud de beca para estudio de Maestría | 1397-vpi-evidencia_maestrai_Arq._Paula.PDF | 05/10/2014 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Avendaño Herrera, Fernando Octavio | Analista de Proyectos | Analista de Investigación | ferevenh@yahoo.es | |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------------|-------------|
| Barahona Rivadeneira, Diego Javier | Director del proyecto | Director del Instituto de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes | dbarahona@unach.edu.ec | |
