



UNACH
Vicerrectorado Académico
Dirección Académica

PROYECTO: 1004 Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de la UNACH

Table with project details including Lider del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, Objetivos Operativos, Viabilidad Técnica, Tipo de Ppto. Externo, Fecha de Última Actualización, Modificado por, Programas Relacionados, Prioridad, Retorno Económico, TIR, VAN, Estimado Al Fin Del Proyecto, Fecha de Inicio - Fecha de Fin, Fecha de Fin Base, and Fecha del siguiente Hito.

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACIÓN ACTUAL:

Por mandato de la LOES, la LOSEP; el Reglamento de Escalafón Docente y el Reglamento de Régimen Académico, las IES, están obligadas a capacitar a sus servidores para que respondan a las exigencias sociales de la educación superior

PROPÓSITO:

Capacitar a los profesores y administrativos para un desempeño eficiente de sus responsabilidades

PRODUCTO:

Docentes y administrativos capacitados

Beneficios Cualitativos

Mejores desempeños de los servidores universitarios en las responsabilidades específicas que cumplen; pues poseerán competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales para ofertar servicios de calidad a los usuarios

Restricciones

TIEMPO: dos años


COSTO: 900.000 usd

ALCANCE: Serán beneficiarios de las capacitaciones los docentes, empleados, trabajadores de la UNACH, el proyecto incluye ayudas económicas para cursos nacionales e internacionales; así como material de trabajo.

Progress bar table with phases: Fase Actual, Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución (highlighted), Cierre, Completado, Congelado, Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 40.77 %
 Fecha de Inicio: 06/01/2014 Fecha de Fin: 30/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

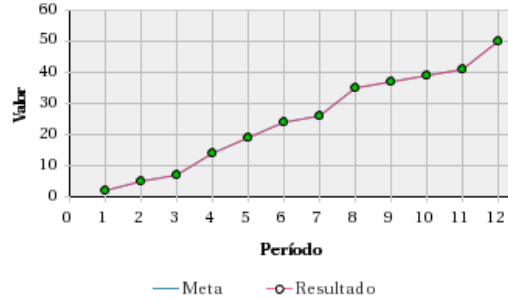

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	Avance programado acumulado											
	2 %	5 %	7 %	14 %	19 %	24 %	26 %	35 %	37 %	39 %	41 %	50 %
	Avance real acumulado											
	2 %	5 %	7 %	14 %	19 %	24 %	26 %	35 %	37 %	39 %	41 %	50 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>ENERO 2015</p> <p>Vic. Académico - CPDIP</p> <p>Elaboración del Plan de Capacitación</p> <p>Trámites para aprobación del Plan de Capacitación</p> <p>Reuniones con la señora Vicerrectora Académica para tratar Plan de Capacitación</p>	Guffante Naranjo, Tania María	28/02/2015 - 10:20 AM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Talento Humano</p> <p>Reunión con la señora Vicerrectora Administrativa para tratar sobre el Plan de Capacitación</p> <p>Elaboración del Plan de Capacitación para el personal administrativo</p> <p>Envío del Plan de Capacitación para su aprobación</p> <p>Vic. Administrativo - Talento Humano</p>		
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Trámite de pago de Coordinadora.</p> <p>Seguimiento a trámites de pago</p> <p>Distribución de certificados por Unidades Académica</p>	Guffante Naranjo, Tania María	03/02/2015 - 09:31 AM
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Trámites de pago de Facilitadores</p> <p>Trámite de pago de Coordinadora.</p> <p>Seguimiento a trámites de pago</p> <p>Elaboración de certificados</p> <p>Distribución de certificados por Unidades Académica</p>	Guffante Naranjo, Tania María	03/02/2015 - 09:29 AM
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Trámites de pago de Facilitadores</p> <p>Trámite de pago de Coordinadora.</p> <p>Seguimiento a trámites de pago</p> <p>Elaboración de certificados</p> <p>Distribución de certificados por Unidades Académicas</p>	Loza Cevallos, Carlos Augusto	01/12/2014 - 08:19 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes</p> <p>Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes</p> <p>Distribución de certificados por Unidades Académicas</p> <p>Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales</p>	Loza Cevallos, Carlos Augusto	04/10/2014 - 11:20 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
Desarrollo de los cursos del mes de septiembre del 2014 Elaboración de certificados		
AGOSTO 2014 Desarrollo de los cursos del mes de agosto del 2014 Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámites de contratos de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámite de pedido de pago del servicio de refrigerios Trámite de pedido de certificaciones presupuestarias	Loza Cevallos, Carlos Augusto	04/10/2014 - 11:13 AM
JULIO 2014 Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Trámite de pedido de certificaciones presupuestarias Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Pedido de elaboración de certificados Organización de los cursos que se realizarán en los meses de julio a septiembre de 2014 Desarrollo de los cursos del mes de julio	Loza Cevallos, Carlos Augusto	04/10/2014 - 11:03 AM
JUNIO 2014 Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Pedido de elaboración de certificados Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámite de pedido de certificaciones presupuestarias	Loza Cevallos, Carlos Augusto	04/10/2014 - 10:10 AM
MAYO 2014 Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Elaboración de certificados Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes	Loza Cevallos, Carlos Augusto	29/09/2014 - 03:20 PM
ABRIL 2014: Pedidos de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos internacionales Elaboración y suscripción por parte de las autoridades de certificados de cursos asistidos por los docentes Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes	Loza Cevallos, Carlos Augusto	05/05/2014 - 09:17 AM
MARZO 2014: Se cuenta con la APROBACIÓN del POA-PAC-PPC, y se está iniciando el proceso de contratación de facilitadores. Evaluación de la Capacitación de febrero 2014 Trámites para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales. Primer Quimestre	Loza Cevallos, Carlos Augusto	03/04/2014 - 10:32 AM
FEBRERO 2014: Se ejecutaron las jornadas de capacitación a docentes del 18 al 28 de febrero, al que asistieron unos 400 profesores, 40 horas. Se realizó la evaluación a los facilitadores.	Villasís, José Antonio	20/03/2014 - 12:37 PM
ENERO 2014: El proyecto de capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores está en fase de implementación. Se espera que se aperture el presupuesto de proyectos por parte del Ministerio de Finanzas. Se planificó las jornadas de capacitación febrero 2014.	Villasís, José Antonio	20/03/2014 - 12:32 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Facilitadores no entregan documentos habilitantes para solicitar elaboración de contratos	08/05/2014	Carlos Augusto Loza Cevallos	10	10	1	0/0

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2	No se aprueba en tiempos esperados presupuesto anual	09/04/2014	Carlos Augusto Loza Cevallos	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Proyecto.5. Tiempo. Falta de facilitadores CAUSARÍA retraso en la capacitación	23/06/2014	Carlos Augusto Loza Cevallos	20 %	10	2	0/1

Riesgos cerrados: 0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Estudio de prioridades para la capacitación del año 2014 del personal REALIZADO	3. Planeación	15/01/2014		15/01/2014		Sí	1.0
2	Diseño y Aprobación del Plan de capacitación del personal APROBADO	3. Planeación	30/01/2014		30/01/2014		Sí	1.0
3	Selección y Contratación de facilitadores jornadas febrero REALIZADO	3. Planeación	10/02/2014		10/02/2014		Sí	1.0
4	Trámite de certificación presupuestaria jornadas febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	20/02/2014		20/02/2014		Sí	1.0
5	Jornadas de capacitación a docentes febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
6	Evaluación de la Capacitación de febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	28/03/2014		28/03/2014		Sí	1.0
7	Trámites para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales.Primer Quimestre EJECUTADO	4. Ejecución	28/03/2014		28/03/2014		Sí	1.0
8	Pedidos de contrato a facilitadores jornadas febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	01/04/2014		01/04/2014		Sí	1.0
9	Ejecución del Plan de Capacitación primer cuatrimestre REALIZADO	4. Ejecución	30/04/2014		30/04/2014		Sí	5.0
10	Suscripción de contratos a facilitadores febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
11	Pago de contratos a facilitadores jornadas febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	09/05/2014		09/05/2014		Sí	5.0
12	Programación Jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO	4. Ejecución	18/06/2014		18/06/2014		Sí	2.0
13	Entrega de certificados a docentes que aprobaron	4. Ejecución	30/06/2014		30/06/2014		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	jornadas de capacitación febrero 2014 REALIZADO							
14	Selección y Contratación de facilitadores jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO	4. Ejecución	18/07/2014		18/07/2014		Sí	2.0
15	Trámite de contratación para facilitadores de jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO	4. Ejecución	25/08/2014		25/08/2014		Sí	2.0
16	Desarrollo de jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO	4. Ejecución	29/08/2014		29/08/2014		Sí	5.0
17	Trámites para viajes de docentes a eventos nacionales e internacionales segundo cuatrimestre REALIZADO	4. Ejecución	29/08/2014		29/08/2014		Sí	2.0
18	Evaluación jornadas capacitación agosto 2014 PROGRAMADO	4. Ejecución	12/09/2014		12/09/2014		Sí	2.0
19	Pago a facilitadores jornadas de capacitación agosto 2014 PROGRAMADO	4. Ejecución	15/10/2014		15/10/2014		Sí	2.0
20	Preparación de estadísticas anuales e informes REALIZADO	5. Cierre	21/11/2014		21/11/2014		Sí	2.0
21	Trámites para viajes de docentes a eventos nacionales e internacionales tercer cuatrimestre REALIZADO	4. Ejecución	12/12/2014		12/12/2014		Sí	4.0
22	Entrega de certificados a docentes que aprobaron jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO	5. Cierre	19/12/2014		19/12/2014		Sí	5.0
23	Selección y contratación a facilitadores para la capacitación 2015 REALIZADO	3. Planeación	01/01/2015	30/11/2015			No	0.0
24	Suscripción y pago de contratos a facilitadores 2015 REALIZADO	3. Planeación	01/01/2015	30/11/2015			No	0.0
25	Hitos del 2015	6. Post-proyecto	30/01/2015		30/01/2015		Sí	30.0
26	Trámites para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales	3. Planeación	02/02/2015	30/11/2015			No	0.0
27	Elaboración del Plan de Capacitación 2015 para los docentes y administrativos REALIZADO	4. Ejecución	03/02/2015		26/02/2015		Sí	0.0
28	Desarrollo de los cursos conforme "Plan de capacitación" 2015 REALIZADO	4. Ejecución	26/02/2015	30/11/2015			No	0.0
29	Entrega de certificados a docentes que aprobaron los cursos de capacitación 2015 REALIZADO	3. Planeación	26/02/2015	30/11/2015			No	0.0
30	Hitos del 2016	6. Post-proyecto	29/01/2016	29/01/2016			No	20.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	800,000.00 **
Costo Total:	900,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2014

	Años Previos	Año Actual (2014)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Planeado - Codificado (2014)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	300,000.00	200,000.00	500,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	300,000.00	200,000.00	500,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2014



Presupuesto Mensual 2014

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	4,587.00		4,587.00				
Feb	4,587.00		9,174.00				
Mar	30,337.00		39,511.00				
Abr	120,517.00		160,028.00				
May	4,587.00		164,615.00				
Jun	40,587.00		205,202.00				
Jul	4,587.00		209,789.00				
Ago	45,587.00		255,376.00				

Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Sep	38,837.00		294,213.00				
Oct	4,587.00		298,800.00				
Nov	600.00		299,400.00				
Dic	600.00		300,000.00				
Total	300,000.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar las competencias docentes y administrativas MEDIANTE la formación continua, réplica de conocimientos, sensibilización docente y programas de incentivos

Objetivos Operativos Matriciales	
UNACH >Vicerrectorado Académico >Centro de Educación Física	
1	Incrementar la práctica adecuada de la Actividad Física y Deportes, en la comunidad universitaria MEDIANTE las disciplinas ofertadas en el Centro de Educación Física, la motivación del uso adecuado del ocio y la operativización de escenarios deportivos.
2	Incrementar la sustentabilidad de la vinculación con la sociedad MEDIANTE programas y proyectos sostenibles con participación docente y/o discente alineados al Plan Estratégico de Vinculación con la sociedad.
UNACH >Vicerrectorado Académico >Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas	
3	Incrementar la producción científica docente y/o discente MEDIANTE la implementación del Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y saberes aplicables a la facultad
UNACH >Vicerrectorado Académico >Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías	
1	Incrementar la formación integral de docentes y estudiantes MEDIANTE la evaluación del Modelo Pedagógico.
3	Incrementar la producción científica docente y/o discente MEDIANTE la regulación del Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes aplicable a la Facultad
4	Incrementar la sustentabilidad de la vinculación con la sociedad MEDIANTE programas y proyectos sostenibles con participación docente y/o discente alineados al Plan Estratégico de Vinculación con la Sociedad.
UNACH >Vicerrectorado Académico >Facultad de Ciencias de la Salud	
1	Incrementar la formación integral de docentes y estudiantes MEDIANTE la aplicación del Modelo Pedagógico y el Código de Ética de la UNACH.
UNACH >Vicerrectorado Académico >Unidad de Formación Académica y Profesionalización	
1	Incrementar la formación integral de docentes y estudiantes MEDIANTE la aplicación del Modelo Pedagógico y el Código de Ética de la UNACH.
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	
13	Incrementar la calidad de entrega de productos y servicios de Talento Humano, MEDIANTE, medición del clima laboral, la implementación de un Plan de capacitación, Implementación de un Sistema de Gestión de Información de Talento Humano, proyecto de Fortalecimiento Institucional, Diseño de un plan de descripción, valoración de puestos, plan de evaluación del desempeño y contratación del personal capacitado.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Hito_1.- _Estudio_de_Prioridades_para_la_capacitación_del_año_2014.pdf	Estudio de Prioridades para la Capacitación del año 2014	14/10/2014
2	Hito_1.pdf	Reglamento de Capacitación	15/10/2014
3	Hito_12.- _Programación_jornadas_de_capacitación_agosto_2014.pdf	Programación jornadas de capacitación agosto 2014	14/10/2014
4	Hito_13.- _Entrega_de_certificados_a_docentes_jornadas_febrero_2014.pdf	Entrega de certificados a docentes que aprobaron jornadas de capacitación febrero 2014	14/10/2014
5	Hito_14_-15_-19.PDF	Selección y contratación de facilitadores - Trámite de contratación para facilitadores - Pago de facilitadores de las jornadas de capacitación agosto 2014	15/10/2014
6	Hito_16.- _Desarrollo_de_las_jornadas_de_capacitación_agosot_2014.PDF	Desarrollo de las Jornadas de capacitación agosto 2014	15/10/2014
7	Hito_16.pdf	Desarrollo de las Jornadas de capacitación agosto 2014	15/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
8	Hito_18.- _Evaluación_jornadas_capacitacion__agosto_2014.pdf	Evaluación jornadas capacitación agosto 2014	15/10/2014
9	Hito_2.- _Diseño_y_Aporbación_del_Plan_de_Capacitación_del_personal.pdf	Diseño y aprobacion del plan de capacitacion del personal	14/10/2014
10	Hito_27.pdf	Plan de capacitación y su aprobación - CPDIP	28/02/2015
11	Hito_3_-8_-10_-11.PDF	Selección y contratacion de facilitadores - Pedidos de contrato a facilitadores - Suscripcion de contratos a facilitadores - Pago de contartos a facilitadores jornadas febrer 2014	14/10/2014
12	Hito_4.- _Trámite_de_certificación_presupuestaria_jornadas_febrero2014.PDF	Trámite de certificacion presupuestaria jornadas febrero 2014	14/10/2014
13	Hito_5.- _Jornadas_de_capacitación_a_docentes_febrero_2014.PDF	Jornadas de capacotación febrero 2014	14/10/2014
14	Hito_6.- _Evaluación_de_la_capacotación_de_febrero_2014.pdf	Evaluacion de la capacitacion de febrero 2014	14/10/2014
15	Hito_7_-11_-17_-19_-21.PDF	Hito 7- 11 - 19 - 21	16/10/2014
16	Hito_7_-11_-17_-19_-21_Cedula_presupuestaria.PDF	Cedula Presupuestaria con corte a septiembre 2014	15/10/2014
17	Hito_7_-11_-17_-19_-21_Certificaciones.PDF	Hitos 7 - 11 - 17- 19 - 21	15/10/2014
18	Hito_7_-17_-21..pdf	Trámite para pedidos de asistencia a cursos nacinales e internacionales primer quimestre - segundo cuatrimestre - tercer cuatrimestre	14/10/2014
19	Hito_7_-17_-21.PDF	Trámite para pedidos de asistencia a cursos nacinales e internacionales primer quimestre - segundo cuatrimestre - tercer cuatrimestre	14/10/2014
20	Hito_3_-8_-10_-11..PDF	Selección y contratacion de facilitadores - Pedidos de contrato a facilitadores - Suscripcion de contratos a facilitadores - Pago de contartos a facilitadores jornadas febrer 2014	14/10/2014
