



UNACH
Vicerrectorado Académico
Centro de Tecnologías Educativas
PROYECTO: I002 Equipamiento Técnico UNACH

Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Includes fields like Líder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, etc.

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL:
La institución durante los últimos dos años a través del proyecto de inversión "Equipamiento Técnico de la Universidad Nacional de Chimborazo", ha implementado los siguientes proyectos:
Backbone de fibra óptica en el campus MsC Edison Riera
Data center
Equipamiento laboratorios de cómputo de Centro de Tecnologías Educativas
Equipamiento e implementos deportivos para el Centro de Cultura Física
Mobiliario para CTE, Biblioteca y Centro de Cultura Física
Equipos de videoconferencia
Telefonía IP en los campus MsC Edison Riera y La Dolorosa
Equipamiento multimedia: pizarras interactivas, proyectores laboratorios de cómputo CTE, scanner alto desempeño Biblioteca
Servidores Sistema Nacional de Información
Sistema de almacenamiento storage
Sin embargo por la creciente demanda de servicios informáticos y cobertura de internet para el 2014 y 2015 es necesario emprender los siguientes proyectos:
Ampliación de la red inalámbrica en los campus universitarios
Ampliación de telefonía IP
Ampliación de cobertura de internet comercial y red avanzada
Contratación de bases de datos especializadas. e-books, recurso bibliográfico
Servidores para repositorios digitales
Equipamiento laboratorios
Mobiliario
PROPOSITO:
Proveer de infraestructura tecnológica, redes y comunicaciones para las dependencias académicas y administrativas para apoyo al desarrollo de las actividades académicas e investigación
ALCANCE
El proyecto de equipamiento técnico permitirá a la institución disponer de una infraestructura tecnológica, equipamiento de laboratorios, bibliotecas que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades académicas e investigación con criterios de calidad
PRODUCTO:
Proyecto de equipamiento para dependencias académicas y administrativas

Beneficios Cualitativos

Cobertura de servicios informáticos, e interconectividad en las dependencias académicas y administrativas de los campus universitarios: Norte, Centro y Sur

Restricciones

TIEMPO: La implementación del proyecto es de 22 meses


RECURSOS: Leyes y normativas a nivel de educación superior,

PRESUPUESTO: 4000000 Usd

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 37.10 %
 Fecha de Inicio: 10/03/2014 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

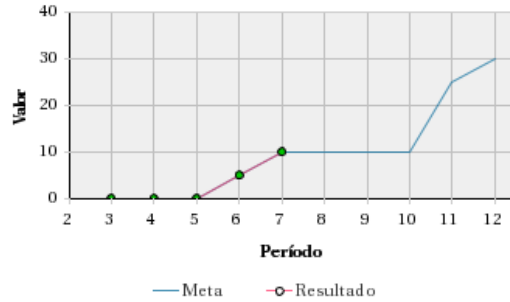

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	Avance programado acumulado											
			0 %	0 %	0 %	5 %	10 %	10 %	10 %	10 %	25 %	30 %
	Avance real acumulado											
			0 %	0 %	0 %	5 %	10 %					
Estado												
			●	●	●	●	●					

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
No hay información disponible		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Si no se adquiere Equipamiento Técnico CAUSARÍA que algunos proyectos no se realicen	20/03/2014	Jorge Edwin Delgado Altamirano	40 %	90	36	0/0

Riesgos cerrados: 0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Requerimientos de infraestructura tecnológica POA PAC PPC	3. Planeación	01/06/2014		01/06/2014	●	Sí	5.0
2	Procesos de contratación pública	4. Ejecución	01/07/2014		01/07/2014	●	Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	Ejecución proyecto de equipamiento	4. Ejecución	03/11/2014	03/11/2014		▼	No	10.0
4	Evaluación y validación	4. Ejecución	28/11/2014	28/11/2014		▼	No	5.0
5	Liquidación contratos	4. Ejecución	31/12/2014	31/12/2014		▼	No	5.0
6	Hitos 2015	4. Ejecución	05/01/2015	05/01/2015		▼	No	45.0
7	Hitos 2016	4. Ejecución	04/01/2016	04/01/2016		●	No	25.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,383,000.00 **
Costo Total:	5,472,570.89
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2014

	Años Previos	Año Actual (2014)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	2,332,537.27	3,383,000.00	5,715,537.27
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,872,570.89	3,383,000.00	5,255,570.89
Ppto. Codificado	0.00	0.00	1,383,000.00	1,383,000.00
Planeado - Codificado (2014)		2,332,537.27		
Ppto. Programado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2014



Presupuesto Mensual 2014

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							
Feb							
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la incidencia tecnológica en la universidad MEDIANTE la conformación del Comité de Tecnología, Plan Estratégico de TIC's, reclutamiento de profesionales en el área informática
2	Incrementar equipos e infraestructura tecnológica acorde a los requerimientos institucionales MEDIANTE la implementación de estándares, normativas institucionales y mejores prácticas internacionales

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Acta_052-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 052-P-UNACH-2014	23/03/2015
2	Acta_053-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 4 Acta P-53-UNACH-2014	05/10/2014
3	Acta_053-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 053-P-UNACH-2014	23/03/2015
4	Acta_076-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 076-P-UNACH-2014	23/03/2015
5	Acta_080-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 080-P-UNACH-2014	23/03/2015
6	Acta_094-P-UNACH-2014.PDF	I002- HITO 5 Acta contrato 094-P-UNACH-2014	23/03/2015
7	Acta_098-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 098-P-UNACH-2014	23/03/2015
8	Acta_099-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 4 Acta P-53-UNACH-2014	05/10/2014
9	Acta_099-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 099-P-UNACH-2014	23/03/2015
10	Acta_104-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 104-P-UNACH-2014	23/03/2015
11	Acta_112-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 112-P-UNACH-2014	23/03/2015
12	Acta_149-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 149-P-UNACH-2014	23/03/2015
13	Contrato_052-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 052-P-UNACH-2014	23/03/2015
14	Contrato_053-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 2 Contrato P-53-UNACH-2014	05/10/2014
15	Contrato_053-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 053-P-UNACH-2014	23/03/2015
16	Contrato_076-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 076-P-UNACH-2014	23/03/2015
17	Contrato_080-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 080-P-UNACH-2014	23/03/2015
18	Contrato_085-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 085-P-UNACH-2014	23/03/2015
19	Contrato_094-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 094-P-UNACH-2014	23/03/2015
20	Contrato_098-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 098-P-UNACH-2014	23/03/2015
21	Contrato_099-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 2 Contrato P-99-UNACH-2014	05/10/2014
22	Contrato_099-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 099-P-UNACH-2014	23/03/2015
23	Contrato_099-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 099-P-UNACH-2014	23/03/2015
24	Contrato_104-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 104-P-UNACH-2014	23/03/2015
25	Contrato_115-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 115-P-UNACH-2014	23/03/2015
26	Contrato_128-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 128-P-UNACH-2014	23/03/2015
27	Contrato_128-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 0128-P-UNACH-2014	23/03/2015
28	Contrato_132-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 132-P-UNACH-2014	23/03/2015
29	Contrato_148-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 148-P-UNACH-2014	23/03/2015
30	Contrato_149-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Contrato 149-P-UNACH-2014	23/03/2015
31	Contrato_No_115-P-UNACH-2014.PDF	I002 - HITO 5 Acta contrato 115-P-UNACH-2014	23/03/2015
32	Oficios_adquisiciones1.PDF	I002 - HITO 2 Procesos de adquisición de equipos, maquinaria a través del proyecto de inversión	05/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
		"Equipamiento Técnico UNACH 2014" para varias dependencias	
33	Oficios_adquisiciones2.PDF	I002 - HITO 2 Procesos de adquisición de equipos, maquinaria a través del proyecto de inversión "Equipamiento Técnico UNACH 2014" para varias dependencias	05/10/2014
34	Orden_de_compras_-_Computadoras_e_Impresoras.PDF	I002 - HITO 3 Adquisición computadoras e impresoras para varias dependencias - catálogo compras públicas	05/10/2014
35	Orden_de_compras_-_copiadoras.PDF	I002 - HITO 3 Adquisición copiadoras varias dependencias - catálogo compras públicas	05/10/2014
36	PAC_abril_2014.pdf	I002 - HITO 1 PAC Proyecto Equipamiento	15/10/2014
37	POA_abril_2014.pdf	I002 - HITO 1 POA Proyecto Equipamiento	15/10/2014
38	PPC_abril_2014.pdf	I002 - PPC Proyecto Equipamiento	15/10/2014
39	RESOLUCION_PROYECTO_EQUIPAMIENTO.PDF	I002 - HITO 1 Resolución aprobación proyecto inversión	05/10/2014
40	RESUMEN_DE_PARTIDAS_abril_2014.pdf	i002 - HITO 1 Resumen de partidas	15/10/2014
41	Reunión_de_Lanzamiento_v1.0.pptx	I002 - HITO 3 Contrato 76-P-UNACH-2014 - Planificación de actividades	05/10/2014
