



UNACH
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación
Instituto de Investigaciones ICITS

PROYECTO: I012 Generación de saberes locales- sistema de gestión de conocimiento de la provincia

Table with project details including: Líder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, Objetivos Operativos, Viabilidad Técnica, Tipo de Ppto. Externo, Fecha de Última Actualización, Modificado por, Programas Relacionados, Prioridad, Retorno Económico, TIR, VAN, Estimado Al Fin Del Proyecto, Fecha de Inicio - Fecha de Fin, Fecha de Fin Base, Fecha del siguiente Hito.


DATOS GENERALES

Table with sections: Descripción (SITUACIÓN ACTUAL, PROPÓSITO, COMPONENTES), Beneficios Cualitativos (Sistema de gestión del conocimiento operando), Restricciones (COSTO, TIEMPO, ALCANCE).

Progress bar showing phases: Fase Actual, Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución (highlighted), Cierre, Completado, Congelado, Cancelado.


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.51 %
Fecha de Inicio: 02/05/2013 Fecha de Fin: 31/07/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

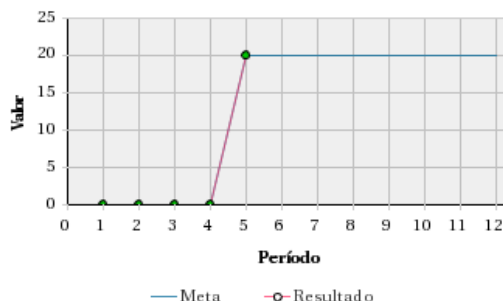

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2014 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | | | | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de Última Actualización |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| diciembre: fueron instalados los equipos, El equipo técnico destinado al proyecto fue asignado a otras funciones en la institución | Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago | 13/01/2015 - 03:49 PM |
| noviembre: fueron cancelados los equipos | Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago | 13/01/2015 - 03:48 PM |
| octubre: El equipo técnico destinado al proyecto fue asignado a otras funciones en la institución | Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago | 13/01/2015 - 03:48 PM |
| mayo a septiembre: El equipo técnico destinado al proyecto fue asignado a otras funciones en la institución | Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago | 13/01/2015 - 03:47 PM |
| "Generación de Saberes Locales" es un programa de largo plazo para insertar a la Universidad en los procesos de gestión de conocimiento de la provincia de Chimborazo. Constituir a la Universidad en un centro especializado en la obtención, creación, organización, capitalización y difusión del conocimiento en el territorio. | Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago | 13/01/2015 - 03:46 PM |




Problemas cerrados: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| | Riesgo | Fecha de Última Actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|---|-------------------------------|---|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 1 | Organizacional.9. Otros. Daño en redes y sistemas informáticos de la UNACH CAUSARÍA la imposibilidad de poner en funcionamiento el sistema que se plantea realizar | 08/05/2014 | Ronny Santiago Echeverría Benalcazar | 20 % | 50 | 10 | 1/1 |
| 2 | Organizacional.9. Otros. La UNACH no asume la operación del Sistema de Gestión del Conocimiento CAUSARÍA la imposibilidad de operar del proyecto | 08/05/2014 | Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo | 10 % | 70 | 7 | 0/1 |
| 3 | Organizacional.4. Jurídico. No se establece la normativa para el uso del Sistema de Gestión de Conocimiento CAUSARÍA dificultades en la incorporación del Sistema a la actividad académica e investigativas de la Institución | 08/05/2014 | Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo | 10 % | 70 | 7 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 1 | Equipamiento IMPLEMENTADO | 4. Ejecución | 31/05/2014 | | 31/05/2014 |  | Sí | 20.0 |
| 2 | Base de datos en ACTIVADA | 4. Ejecución | 30/06/2015 | 30/06/2015 | |  | No | 50.0 |
| 3 | Página web del Sistema HABILITADA | 5. Cierre | 30/07/2015 | 30/07/2015 | |  | No | 30.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|--------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de proyectos de investigación incorporados al sistema | <input type="checkbox"/> | - | - | - | 01/01/2014 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Anticipo Total Entregado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 83,668.92 ** |
| Costo Total: | 138,553.92 |
| Total Devengado: | 61,471.20 |
| % Costo Total Devengado: | 44.37 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 44.37 %

Perfil Económico 2014

| | Años Previos | Año Actual (2014) | Años Futuros | Total |
|--|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 71,811.80 | 11,857.12 | 83,668.92 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 71,811.80 | 11,857.12 | 83,668.92 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 71,811.80 | 0.00 | 71,811.80 |
| Planeado - Codificado (2014) | | 0.00 | | |
| Ppto. Programado | 0.00 | 71,811.80 | 0.00 | 71,811.80 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 61,471.20 | 0.00 | 61,471.20 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variación Proyectada (Programado - Estimado) | 0.00 | 71,811.80 | 0.00 | 71,811.80 |
| % de Ppto. Programado vs. Devengado | * 0.00 % | 85.60 % | 0.00 % | 85.60 % |

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2014

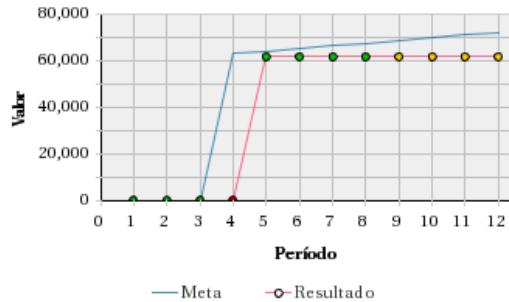

Presupuesto Mensual 2014

| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |
| Abr | 62,817.34 | 0.00 | 62,817.34 | 0.00 | 0.00 % | ● | 0.00 % |
| May | 1,124.31 | 61,471.20 | 63,941.65 | 61,471.20 | 96.14 % | ● | 85.60 % |

| Presupuesto Mensual 2014 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Jun | 1,124.31 | 0.00 | 65,065.96 | 61,471.20 | 94.48 % | | 85.60 % |
| Jul | 1,124.31 | 0.00 | 66,190.27 | 61,471.20 | 92.87 % | | 85.60 % |
| Ago | 1,124.30 | 0.00 | 67,314.57 | 61,471.20 | 91.32 % | | 85.60 % |
| Sep | 1,124.31 | 0.00 | 68,438.88 | 61,471.20 | 89.82 % | | 85.60 % |
| Oct | 1,124.31 | 0.00 | 69,563.19 | 61,471.20 | 88.37 % | | 85.60 % |
| Nov | 1,124.30 | 0.00 | 70,687.49 | 61,471.20 | 86.96 % | | 85.60 % |
| Dic | 1,124.31 | 0.00 | 71,811.80 | 61,471.20 | 85.60 % | | 85.60 % |
| Total | 71,811.80 | 61,471.20 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 2 | Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos. |
| 4 | Incrementar el rigor científico de los resultados del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional, la implementación del Reglamento de Movilidad Docente y la implementación del Reglamento para la Selección de Profesionales con Titulación PhD. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Archivo | Descripción de Archivo | Fecha de Alta |
|---|---------------------------------|--|---------------|
| 1 | Evidencias_de_equipamiento_.rar | Evidencia de Recepción de equipamiento informático | 06/06/2014 |
| 2 | PÁGINA_WEB_SISTEMA.pdf | PAGINA WEB SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO | 20/11/2014 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago | Director del proyecto |
