



**UNACH**  
**Vicerrectorado de Postgrado e Investigación**  
**Instituto de Investigaciones ICITS**

**PROYECTO: 1020** Construcción de un sistema de indicadores productivos para la Provincia de Chimborazo

Líder del Proyecto:	Rivera Poma, Mauricio Fernando (mauriverap1@yahoo.es)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,000.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2012 - 31/12/2014
Fecha de Última Actualización:	18/11/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Rivera Poma, Mauricio Fernando	Fecha del siguiente Hito:	21/06/2014

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**SITUACIÓN ACTUAL:**

Existe falta de información confiable sobre los sectores económicos de la provincia de Chimborazo, pues las estadísticas que existen describen únicamente aspectos generales sobre aspectos productivos, económicos y sociales, por lo que resulta necesario contar con un sistema de indicadores que describa la realidad social y económica de Chimborazo

**PROPOSITO:**

Informe socioeconómico de la provincia de Chimborazo  
 Creación de un modelo matemático y estadístico  
 Encontrar indicadores económicos y productivos del sector comercial de Chimborazo

**PRODUCTO::** Informe científico.

**Beneficios Cualitativos**

Este proyecto permitirá obtener información sobre los indicadores socio-económicos de la provincia de Chimborazo, en general, e indicadores económicos y productivos del sector comercial, en particular, que describa la realidad económica y permita aportar en la construcción de propuestas de desarrollo humano sostenible a nivel provincial y regional, que aportara con información confiable para el proceso de cambio de matriz productiva.

**Restricciones**

TIEMPO: 24 MESES


COSTO: 25000

ALCANCE: VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, MODELIZACIÓN MATEMÁTICA Y SOFTWARE CON UN ANÁLISIS POR CONGLOMERADOS DE LOS CANTONES DE CHIMBORAZO, INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL SECTOR COMERCIAL DE CHIMBORAZO

Fase Actual:  Anteproyecto  Definición  Planeación  **Ejecución**  Cierre  Completado  Congelado  Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/04/2012 Fecha de Fin: 31/12/2014

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

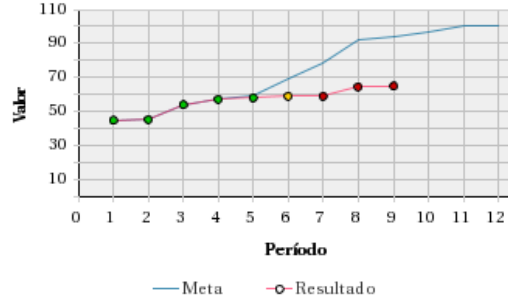

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	Avance programado acumulado											
	44 %	45 %	54 %	57 %	59 %	69 %	78 %	92 %	94 %	97 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	44 %	45 %	54 %	57 %	58 %	59 %	59 %	64 %	65 %			
Estado												
	●	●	●	●	●	▼	⊗	⊗	⊗			

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p><b>AÑO 2013:</b> El proyecto ha avanzado de forma irregular, porque no se ha podido contratar a los consultores necesarios para las dos últimas fases: Consultor informático y consultor económico. A diciembre del 2013, se obtuvieron los informes preliminares. Análisis socioeconómico, Análisis por conglomerados.</p> <p>Se levantó la información de campo del sector comercial de los 10 cantones de la provincia de Chimborazo</p> <p><b>ENERO-FEBRERO-MARZO 2014.</b> Finalizó la revisión final de 2 informes de los 2 primeros componentes del proyecto: Informe socioeconómicos de los cantones de la provincia de Chimborazo, Informe sobre análisis por conglomerados de la Provincia de Chimborazo</p> <p>Revisión encuestas de campo del sector comercial.</p> <p>A finales del mes de septiembre se ha solicitado la contratación de los consultores económicos e informáticos. Estas contrataciones se encuentran en trámite. El consultor económico para el 06 de octubre está lista para subir al portal. En cuanto al consultor informático se encuentra en proceso.</p> <p>Se ha solicitado las contrataciones de las publicaciones de: Informe Final "Indicadores de producción y económicos del sector comercial de los Cantones de la provincia de Chimborazo", Informe Final "Análisis por Conglomerados de los Cantones de la provincia de Chimborazo", Revistas y dípticos informativos de resumen de la "Construcción de un sistema de indicadores productivos para la Provincia de Chimborazo".</p> <p>Las contrataciones de las publicaciones, al igual que la del consultor informático se retrasaron, por cuanto, una vez enviado el informe Informe socioeconómicos de los cantones de la provincia de Chimborazo, se solicitaron varias revisiones. Debido a la extensión del documento y la información existente, se termino esta revisión a finales del mes de septiembre</p> <p>Todas estas contrataciones se han solicitado para el segundo semestre (fuera de la planificación establecida), debido a que se autorizo la apertura de las cuentas del proyecto a mediados del mes de julio del 2014</p> <p>Se entregaron los informes finales a la Dirección del ICITS para su revisión previa a la publicación</p> <p>Con fecha 25 de septiembre del 2014 se pidieron las contrataciones con las imprentas de los documentos: Indicadores de producción y económicos del sector comercial de los Cantones de la provincia de Chimborazo", Informe Final "Análisis por Conglomerados de los Cantones de la provincia de Chimborazo", Revistas y dípticos informativos de resumen de la "Construcción de un sistema de indicadores productivos para la Provincia de Chimborazo"</p> <p>Con fecha 3 de octubre de 2014 y mediante Oficio No. 015-2014-PIPCH, se cumplieron las rectificaciones solicitadas al informe final "Análisis social y económico de los cantones de la Provincia de Chimborazo, a partir de los resultados del Censo de Población, Vivienda y Económico 2010"</p>	Rivera Poma, Mauricio Fernando	18/11/2014 - 07:56 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Con fecha 3 de octubre de 2014 y mediante Oficio No. 016-2014-PIPCH, se realizaron las rectificaciones solicitadas a través del oficio 0395-ICITS-2014, al informe final "Análisis por conglomerados de los cantones de la Provincia de Chimborazo"</p> <p>En cuanto al consultor económico, no fue posible la contratación, por cuanto la empresa objeto de la contratación declino la oferta. Esta parte de la investigación la está realizando la Escuela de Economía.</p> <p>El consultor informático está en la última etapa del proceso de contratación</p>		

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	<b>Proyecto.5. Tiempo.</b> Imposibilidad de contratar a los consultores CAUSARÍA retraso en la elaboración del proyecto.	08/05/2014	Mauricio Fernando Rivera Poma	50 %	80	40	0/0
2	<b>Proyecto.5. Tiempo.</b> Dificultad para la contratación de las publicaciones CAUSARÍA retraso en la publicación de los resultados del proyecto.	08/05/2014	Mauricio Fernando Rivera Poma	30 %	60	18	0/0

Riesgos cerrados: 0

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Informe por conglomerados de los Cantones de la Provincia de Chimborazo Final Revisado TERMINADO	4. Ejecución	30/08/2013		30/08/2013		Sí	4.0
2	Desarrollar el instrumento para investigación de campo TERMINADO	4. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	5.0
3	Aplicar las encuestas en los 10 cantones de la provincia FINALIZADO	4. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	10.0
4	Elaboración preliminar Informe Socioeconómico de los cantones de la provincia de Chimborazo TERMINADO	4. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	25.0
5	Solicitud de ampliación de Plazo para proyecto. REALIZADO	4. Ejecución	17/01/2014		17/01/2014		Sí	0.5
6	Actualización ficha SIPEyP REALIZADO	4. Ejecución	14/02/2014		14/02/2014		Sí	0.5
7	Informe Socioeconómico de los Cantones de la Provincia de Chimborazo Final Revisado TERMINADO	4. Ejecución	31/03/2014		31/03/2014		Sí	9.0
8	Entregar al Consejo Editorial de la UNACH Informe Final por conglomerados para su revisión y aprobación REALIZADO	4. Ejecución	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
9	Entregar al Consejo Editorial de la UNACH Informe Socioeconómico para	4. Ejecución	30/04/2014		30/04/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	su revisión y aprobación REALIZADO							
10	Solicitar al Director del ICITS contratación de Consultor Económico REALIZADO	4. Ejecución	23/05/2014		22/08/2014		Sí	0.5
11	Solicitar al Director del ICITS contratación de Consultor en Informática para desarrollar software REALIZADO	4. Ejecución	23/05/2014		26/09/2014		Sí	0.5
12	Capacitación a estudiantes para procesar tabulación REALIZADO	4. Ejecución	29/05/2014		29/05/2014		Sí	1.0
13	Contratación Consultor Económico REALIZADO	4. Ejecución	21/06/2014	21/06/2014			No	1.0
14	Contratación Consultor Informático REALIZADO	4. Ejecución	21/06/2014	21/06/2014			No	2.0
15	Procesamiento información TERMINADO	4. Ejecución	21/06/2014		08/08/2014		Sí	5.0
16	Impresión informe análisis social y económico CONTRATADO	4. Ejecución	27/06/2014		27/06/2014		Sí	1.0
17	Impresión informe modelo matemático por conglomerados REALIZADO	4. Ejecución	27/06/2014	27/06/2014			No	1.0
18	Producto final informe indicadores económicos y de producción REALIZADO	4. Ejecución	30/07/2014	30/07/2014			No	4.0
19	Producto final Software REALIZADO	4. Ejecución	31/07/2014	31/07/2014			No	5.0
20	Cálculo de la producción del sector comercial de Chimborazo FINALIZADO	4. Ejecución	15/08/2014	15/08/2014			No	10.0
21	Reunión con consultor económico para revisión informe TERMINADO	4. Ejecución	20/08/2014	20/08/2014			No	0.5
22	Informe final indicadores económicos y de producción TERMINADO	4. Ejecución	29/08/2014	29/08/2014			No	4.0
23	Revisión informe final indicadores económicos y de producción REALIZADO	4. Ejecución	15/09/2014	15/09/2014			No	1.0
24	Entregar al Consejo Editorial de la UNACH Informe Final para su revisión y aprobación REALIZADO	4. Ejecución	19/09/2014	19/09/2014			No	0.5
25	Elaboración material impreso para sociabilizar Informe CONTRATADO	4. Ejecución	15/10/2014	15/10/2014			No	1.0
26	Contratación impresión Informe Final Producción REALIZADO	4. Ejecución	20/10/2014	20/10/2014			No	1.0
27	Obtención ISBN CONSEGUIDO	4. Ejecución	31/10/2014	31/10/2014			No	1.0
28	Entrega de invitaciones Sociabilización pública Investigación REALIZADA	4. Ejecución	14/11/2014	14/11/2014			No	1.0
29	Evento Sociabilización pública Investigación REALIZADA	4. Ejecución	27/11/2014	27/11/2014			No	2.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,000.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2014**

	Años Previos	Año Actual (2014)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Ppto. Codificado	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Planeado - Codificado (2014)		-6,000.00		
Ppto. Programado	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2014**



**Presupuesto Mensual 2014**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	3,080.00		3,080.00				
Jul	0.00		3,080.00				
Ago	3,080.00		6,160.00				

Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Sep	0.00		6,160.00				
Oct	12,840.00		19,000.00				
Nov	0.00		19,000.00				
Dic	0.00		19,000.00				
<b>Total</b>	<b>19,000.00</b>						

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	ANALISIS_SOCIAL_Y_ECONÓMICO_CANTONES.pdf	INFORME: ANÁLISIS SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL CENSO DE POBLACIÓN, VIVIENDA Y ECONÓMICO 2010	14/04/2014
2	C+¿dula_presupuestaria.pdf		06/10/2014
3	Empresa_Consultora.pdf		06/10/2014
4	ENCUESTA_FINAL.pdf	ENCUESTA FINAL	14/04/2014
5	ENCUESTA_PRELIMINAR.pdf	ENCUESTA PRELIMINAR	14/04/2014
6	EVIDENCIAS_PIPCH.pdf		06/10/2014
7	MODELO_MATEMÁTICO.pdf	ANÁLISIS DE CLUSTER DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	14/04/2014
8	REVISIÓN_FINAL_PIPCH_SEPTIEMBRE.docx		06/10/2014

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Rivera Poma, Mauricio Fernando	Director del proyecto
