



UNACH
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación
Instituto de Investigaciones ICITS

PROYECTO: I032 Identificación socioeconómica y georeferenciada de las víctimas de violencia intrafamiliar y la aplicación de políticas públicas en la ciudad de Riobamba, en el período de tiempo comprendido entre enero 2010 a diciembre 2012. Convocatoria 2013

Table with project details including: Líder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, Objetivos Operativos, Viabilidad Técnica, Tipo de Ppto. Externo, Fecha de Última Actualización, Modificado por, Programas Relacionados, Prioridad, Retorno Económico, TIR, VAN, Estimado Al Fin Del Proyecto, Fecha de Inicio - Fecha de Fin, Fecha de Fin Base, Fecha del siguiente Hito.


DATOS GENERALES

Table with project description: Descripción, SITUACIÓN ACTUAL, PROPÓSITO, PRODUCTO, Beneficios Cualitativos, Restricciones, COSTO, TIEMPO, ALCANCE.

Progress bar table: Fase Actual, Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución, Cierre, Completado, Congelado, Cancelado.


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.30 %
 Fecha de Inicio: 01/05/2014 Fecha de Fin: 31/05/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

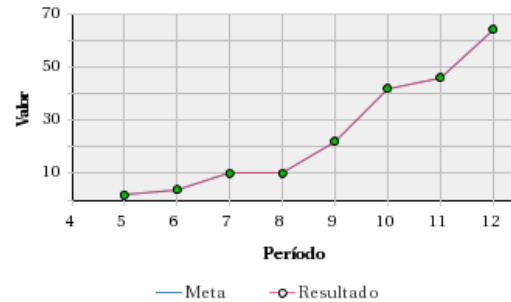

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	Avance programado acumulado											
					2 %	4 %	10 %	10 %	22 %	42 %	46 %	64 %
	Avance real acumulado											
					2 %	4 %	10 %	10 %	22 %	42 %	46 %	64 %
Estado												
					●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>MARZO</p> <p>Entrega de información por parte del Concejo de la Judicatura de Chimborazo referente a datos estadísticos sobre denuncias de Violencia Intrafamiliar. Elaboración y entrega de Informe Técnico de Avance con corte al mes de febrero. Participación en calidad de Capacitadora en talleres sobre Violencia Intrafamiliar en Pungala y Licto para cumplir con el requerimiento del Municipio de Riobamba Participación en Taller sobre Violencia Intrafamiliar en Riobamba, organizado por Visión Mundial..</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	27/03/2015 - 11:21 AM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Entrega de los instrumentos de planificación POA-PAC y PPC, - Resumen de Partidas y Requerimientos de Personal. Envío del Abstract a la FLACSO sobre los roles de las mujeres de Penipe ante los desastres naturales. Control y evaluación de lo ejecutado en el año 2014. Se recogió información en la Policía Judicial sobre denuncias correspondiente a diciembre de 2014. (las evidencias se encuentran en el archivo del proyecto en digital) Se realizó trámites en el Consejo de la Judicatura para que se entregue la información de denuncias de Violencias Intrafamiliar comprendido desde octubre a diciembre del año 2014. (las evidencias se encuentran en el archivo del proyecto en digital).</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/03/2015 - 10:20 AM
<p>ENERO 2015</p> <p>Se realizó informes sobre personal que terminó sus funciones. Ejecución de los instrumentos POA-PAC-PPC- PARTIDAS PRESUPUESTARIAS-PERSONAL Se recogió información en la Policía Judicial sobre denuncias correspondiente a diciembre de 2014. (las evidencias se encuentran en el archivo del proyecto en digital) Se realizó trámites en el Consejo de la Judicatura para que se entregue la información de denuncias de Violencias Intrafamiliar comprendido desde octubre a diciembre del año 2014. (las evidencias se encuentran en el archivo del proyecto en digital).</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/03/2015 - 09:31 AM
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Oficio al Master Jorge Fernández Director de Planificación de la UNACH adjuntando los instrumentos de planificación, POA, PAC y PPC, resumen de partidas del año 2015 de VI.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	06/03/2015 - 08:01 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Solicitud a la Teniente Mariela Santillán de la Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar de la Policía (DEVIF) para recabar información de las respectivas denuncias de violencia intrafamiliar en el cantón Riobamba del año 2014 para alimentar la base de datos del proyecto de VI.</p> <p>Informe de evaluación II Semestre (Julio-Diciembre 2014) del proyecto VI</p> <p>Oficio a la Ing. Sandra Vargas Directora del Departamento Financiero autorizando el traslado del rubro económico constante en la partida de Mobiliarios a la partida Maquinaria y Equipos.</p> <p>Oficio a la Doctora Anabel Mancheno Jueza de la Unidad Judicial contra la Violencia a la mujer y la Familia de la ciudad de Riobamba sobre la información referente a las encuestas.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Entrega al proyecto de 7 grabadoras de voz, 2 cámaras fotográficas, 3 GPS, 1 grabadora y una carpa rectangular para eventos \$ 420,00</p> <p>Se culminó el levantamiento de información mediante la aplicación de 381 encuestas-muestra técnica el 07 de Noviembre de 2014</p> <p>Se remitió información a la Juez de la Mujer y Familia de Rbb, casos de presunta agresión sexual a menores de edad, se mantuvo una reunión de trabajo con la Cbop Jazmín Delgado y Verónica Flores</p> <p>Gestión para la contratación de un consultor para el desarrollo del software.</p> <p>Se escaneó 180 denuncias de la Sala de la Primera Acogida del Hospital Policlínico de Riobamba de los meses de Abri a Junio de 2014.</p> <p>Participación con un stand de información de VIF el 25 de noviembre de 2014, al conmemorar el día internacional contra la violencia de género, además se procedió a entregar material difusivo de VIF</p> <p>Alimentación a la base de datos, ingreso de información desagregada sobre víctimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Riobamba al sistema del OSCUNACH. 1.400 denuncias ingresadas de la comisaría y 548 (2013) de la Sala de Acogida del Hospital</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	29/12/2014 - 01:42 PM
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Pedido al Ingeniero Jorge Delgado, Director del Centro de Tecnologías, para contratar los servicios de desarrollo de software.</p> <p>Entrega de información por parte del Concejo de la Judicatura de Chimborazo referente a datos estadísticos sobre denuncias de Violencia Intrafamiliar.</p> <p>Gestión al Comandante Vinicio Serrano Coronel de Estado Mayor Conjunto de la Brigada Blindada Galápagos No. 11 para realizar encuestas y levantar información en el sector Saboya Militar.</p> <p>Reporte del levantamiento de información de denuncias presentadas por la Comisaria de la Mujer en los años 2010 al 2012.</p> <p>Reporte del informe de avance global de Ingreso de Información de las denuncias de violencia Intrafamiliar de la Comisaria de la Mujer y de la Sala de Primera Acogida del Hospital de Riobamba.</p> <p>Reporte del informe del levantamiento de información en la Fiscalía de Riobamba sobre denuncias de Violencia Intrafamiliar</p> <p>Gestión al Gobernador de la provincia de Chimborazo para autorización a los elementos policiales de Riobamba para proteger a los profesionales que recaban información en el proyecto Atención al oficio No. 68-2010-CCPD-R por parte del secretario ejecutivo del CCPID-R</p> <p>Psi.Ci.Luis Terán Obando facilitando información de número de víctimas de violencia intrafamiliar en Riobamba.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/12/2014 - 03:43 PM
<p>Septiembre 2014</p> <p>Informe Cuatrimestral presentado</p> <p>Conocimiento de la renuncia de la pasante Yashe Chodon Mona Belardine. Contratación al señor Xavier Toro Chávez e calidad de pasante</p> <p>Levantamiento de información: Encuesta elaborada y validada por (PHD Elena Burgaleta y MSC María Cruz Tornay</p> <p>Muestra realizada por el Ing. Luis Cabezas .Solicitud para la impresión de 400 encuestas, impresión de material difusivo (tripticos y folletos), solicitud para la elaboración de una carpa para eventos, contratación para la elaboración de un software</p> <p>Planificación, organización y ejecución de talleres de Violencia Intrafamiliar. Coordinación con el Lic. Fabián Meza Director de Mercados.</p> <p>Alimentar la base de datos, ingreso de información desagregada sobre víctimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Riobamba al sistema del OSCUNACH</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	24/10/2014 - 04:21 PM
<p>JUNIO 2014</p> <p>Elaboración de Ficha Única de Registro de Violencia Intrafamiliar y de Género</p> <p>Ejecución de Presupuestos (Grupos dinámicos)</p> <p>Requerimiento para la adquisición de maquinaria y equipo (7 grabadoras de voz, 1 filmadora, 2 cámaras fotográficas digitales, 3 GPS)</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	02/10/2014 - 06:16 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Requerimiento para la adquisición de materiales de oficina (10 resmas de papel bond, 2 tóner Samsung ML 2010 y Samsung SCX 4635, 10 carpetas archivadoras, 15 resaltadores, 16 correctores, 20 cartones archivadores) Actualización de datos del sistema SIPeIP Respuesta por parte del Concejo de la Judicatura de la Provincia de Chimborazo respecto a la solicitud de información de datos estadísticos generales sobre denuncias, causas despachadas, y datos análogos, Requerimiento para la designación de un docente en el área informática. Solicitud al Doctor Diego Salamea, Director del Departamento de Gestión Procesal Penal de la FGE, para que se nos facilite estadísticas sobre denuncias de Trata de Personas y delitos de Lesiones. Solicitud al Master Napoleón Cadena Alcalde del GADM Riobamba para reunión de trabajo Aprobación de las Reformas Presupuestarias por parte de la Dirección Financiera de los proyectos que se encuentran bajo responsabilidad del ICITS Presentación del proyecto VIF e formato SENPLADES conforme a la disposición de las autoridades Alimentación de la base de datos, ingresando información sobre víctimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Riobamba 1726 denuncias trabajadas en el mes (813 CM / 903 GB) Gestión pertinente para recabar información sobre víctimas de violencia intrafamiliar. Gestión, creación e implementación de aplicaciones en el NODO SENPLADES Estudio y diseño de metodologías para talleres planificados a nivel local, parroquial y provincial en la temática de VIF.</p>		
<p>AGOSTO 2014 Alimentación de la base de datos, ingreso (7200 GB)de información desagregada sobre víctimas de violencia intrafamiliar Planificación, organización y ejecución de talleres de Violencia Intrafamiliar. (FUNDESICH, Foro de Mujeres y Coordinadora Política de Mujeres) Coordinación con el Lic. Fabián Meza Director de Mercados. Contratos firmados y legalizados de Pasantes y Administrativa Social. POA, PAC y PPC 2014 legalizados. Entrega de materiales de oficina según POA, PAC, PPC 2014.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>24/09/2014 - 11:41 AM</p>
<p>JULIO 2014 Reunión MsC. Rolando Gómez GADM Riobamba para abordar asuntos de apoyo técnico (PROMOTORAS) e ng. Fanny Osario 23/07/2014 10:00 Proceso de contratación de seis pasantes VIF Elaboración de POA, PAC y PPC 2015 (VIF). Planificación, organización y ejecución de talleres de Violencia Intrafamiliar. Parroquia de Licto22/07/2014 y Pungalá 29/07/2014. Reunión Dra. Lupita Paguay 28/07/2014 14:30. MIES (PROMOTORES) C1 A 3. Ingreso de fichas a la base de datos mes de Julio /Digitadores 1150 (gb) 95(cm). Control interno y evaluación de los indicadores de gestión de los proyectos de VIF. informe de Seguimiento SIPEIP.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>04/08/2014 - 04:05 PM</p>
<p>MAYO 2014: C1.A2 Condensado hasta el mes de Mayo 2014.- Información recabada/escaneada: 1.805 fichas de la Sala de acogida de emergencias del Hospital Policlínico de Riobamba. Comisaría de la Mujer y Familia: Fichas: 3.956 Denuncias 2010: 3.618 Denuncias 2011: 3.815 Denuncias 2012: 3.957 C1.A2 Gestión para recabar información sobre VIF: Consejo de la Judicatura de Ch .MIES, FGE, M.I, Gobernación de Ch. C1.A3 Ingreso de denuncias hasta el mes de mayo/Digitadores: 2.259 (1.870 gb 389 cm). Carta Acuerdo PDA Pungalá Visión Mundial-OSCUNACH. Estudio y diseño de metodologías para talleres a nivel local, parroquial y provincial en la temática de VIF. POA,PAC y PPC 2014 aprobados. Campos para Plantillas sistema NODO SENPLADES.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>09/07/2014 - 01:19 PM</p>
<p>ENERO-ABRIL 2014: Reportes-levantamiento de información Comisaría. Oficio confidencialidad manejo de información Ing. Xavier Andrade. Informativo digitadores, novedades presentadas referente a información escaneada en la Comisaría. Proceso de verificación de la información escaneada en la Comisaría. Normativa Legal, formato para proyectos de vinculación con la colectividad UNACH. Registro de entrega de causas.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>29/05/2014 - 03:39 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
Gestión-autorización Dr. Wilson Nina Director Provincial de Salud-información actualizada fichas de víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el HPGDR-Sala de Acogida. Gestión-autorización Dra. Ruth Naranjo directora provincial de salud/acta entrega de fichas de víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el HPGDR-Sala de Acogida. Gestión Dr. Diego Andrade Fiscal Provincial de Chimborazo levantamiento de denuncias de VIF. Reporte final del levantamiento de información del año 2010; 2011; y, 2012 en la Comisaría de la Mujer y Familia de Riobamba. Informes mensuales Administrativo social/digitador y profesional de apoyo técnico.		
JUNIO-DICIEMBRE 2013: Respaldo a este estudio por parte del GADM Riobamba. Estudio ganador en la convocatoria ICITS-2013. Gestión-autorización Sr. Gobernador autorizar levantamiento de información comisaria de la mujer y familiar Rbb. Registro de fichas recibidas digitadores-OSCUNACH. Suscripción carta de confidencialidad OSCUNACH-comisaria de la Mujer y Familia de Rbb. Suscripción carta de confidencialidad Gustavo Buñay-digitador.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	29/05/2014 - 03:38 PM
ENERO-MARZO 2014: -Gestión y autorización Sr. Gobernador de la P.CH. para levantar información de víctimas de V.I.F de la Comisaría de la Mujer y Familia de Riobamba, suscripción Carta de Confidencialidad. C.1.A.2. Información judicial de la Comisaría de la Mujer y Familia RECABADA/Denuncias escaneadas de los años 2011 y 2012. - Gestión y autorización para levantar información de víctimas de V.I.F que reposa en la Sala de Acogida del Hospital Provincial General Docente de Riobamba.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/04/2014 - 02:17 PM
JUNIO-DICIEMBRE 2013: - Convocatoria ICITS 2013.- Se postula este estudio, superando exitosamente la evaluación externa realizada por la SENESCYT al obtener uno de los primeros lugares, mismo que es financiado para el año 2014 y 2015.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/04/2014 - 02:02 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Proyecto.2. Alcance. No contar con la Certificación presupuestaria a tiempo CAUSARÍA un retraso de actividades	10/06/2014	Ana del Rocío Veloz Avendaño	20 %	40	8	0/0
2	Proyecto.2. Alcance. No contar con la colaboración de las víctimas de Violencia Intrafamiliar CAUSARIA el desconocimiento de factores socioeconómicos.	19/05/2014	Ana del Rocío Veloz Avendaño	50 %	80	40	0/0
3	Proyecto.2. Alcance. No contar con la información de víctimas de V.I.F que reposa en la Fiscalía de la ciudad de Riobamba CAUSARIA la falta de información de todas las denuncias de violencia.	10/04/2014	Ana del Rocío Veloz Avendaño	20 %	40	8	0/1

Riesgos cerrados: 0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA, PAC y PPC APROBADOS	3. Planeación	12/05/2014		12/05/2014		Sí	2.0
2	Ministerio de Finanzas-Cédula Presupuestaria ENTREGADAS	4. Ejecución	20/06/2014		20/06/2014		Sí	2.0
3	Recurso Humano-Pasantes CONTRADADOS	3. Planeación	07/07/2014		07/07/2014		Sí	6.0
4	C.1.A.3. Información por sectores espaciales de Riobamba 50% CLASIFICADOS y ORDENADOS.	4. Ejecución	04/09/2014		04/09/2014		Sí	7.0
5	Informe I Cuatrimestral PRESENTADO	4. Ejecución	05/09/2014		05/09/2014		Sí	2.0
6	C3.A1. Encuestas de victimización y socioeconómicas DISEÑADAS y VALIDADAS.	4. Ejecución	30/09/2014		30/09/2014		Sí	3.0
7	C.1.A.2. Información en todas las instancias judiciales RECABADAS.	4. Ejecución	03/10/2014		03/10/2014		Sí	20.0
8	C.2.A.1. Mapeo de las víctimas de VIF REALIZADO.	4. Ejecución	28/11/2014		28/11/2014		Sí	4.0
9	C.1.A.3. Información por sectores espaciales de Riobamba 50% CLASIFICADOS y ORDENADOS.	4. Ejecución	19/12/2014		19/12/2014		Sí	7.0
10	Informe I Semestral PRESENTADO	4. Ejecución	29/12/2014		29/12/2014		Sí	3.0
11	C.2.A.2. Domicilios de las víctimas de VIF UBICADOS e IDENTIFICADOS.	4. Ejecución	31/12/2014		31/12/2014		Sí	8.0
12	C3.A2. Encuestas a las víctimas de VIF registradas en la información respectiva APLICADAS.	4. Ejecución	07/02/2015		07/02/2015		Sí	22.0
13	C3.A3. Informe pertinente ELABORADO.	4. Ejecución	13/02/2015		13/02/2015		Sí	2.0
14	Informe II Semestral PRESENTADO	4. Ejecución	05/05/2015	05/05/2015			No	3.0
15	C4.A1 Documento final del proyecto ELABORADO.	4. Ejecución	15/05/2015	15/05/2015			No	7.0
16	C4.A2. Documento a instituciones públicas y privadas REPRODUCIDO y ENTREGADO.	5. Cierre	29/05/2015	29/05/2015			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,000.00 **
Costo Total:	23,195.00
Total Devengado:	13,454.93
% Costo Total Devengado:	58.01 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 58.01 %

Perfil Económico 2014

	Años Previos	Año Actual (2014)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	37,782.85	0.00	37,782.85
Ppto. Externo Planeado	0.00	37,782.85	0.00	37,782.85
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	20,000.00	3,195.00	23,195.00
Ppto. Codificado	0.00	20,000.00	3,195.00	23,195.00
Planeado - Codificado (2014)		17,782.85		
Ppto. Programado	0.00	20,000.00	3,195.00	23,195.00
Ppto. Devengado	0.00	13,454.93	0.00	13,454.93
Estimado a fin de año	* 0.00	20,000.00	3,195.00	23,195.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	67.27 %	0.00 %	58.01 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2014



Presupuesto Mensual 2014

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							
Feb							
Mar							
Abr							
May	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00 %	🚫	0.00 %
Jun	500.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00 %	🚫	0.00 %

Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul	2,040.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	2,040.00	130.36	11,340.00	130.36	1.15 %		0.65 %
Sep	2,040.00	4,760.00	13,380.00	4,890.36	36.55 %		24.45 %
Oct	2,040.00	1,824.67	15,420.00	6,715.03	43.55 %		33.58 %
Nov	2,040.00	6,739.90	17,460.00	13,454.93	77.06 %		67.27 %
Dic	2,540.00		20,000.00				
Total	20,000.00	13,454.93					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos.
4	Incrementar el rigor científico de los resultados del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional, la implementación del Reglamento de Movilidad Docente y la implementación del Reglamento para la Selección de Profesionales con Titulación PhD.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	100_1501.JPG	Fotografías de reuniones y capacitación a pasantes.	04/08/2014
2	100_1510.JPG	Evidencias Fotográficas de Talleres de VIF	04/08/2014
3	ABSTRACT-FLACSO.docx	ABSTRACT-FLACSO	10/03/2015
4	AVANCE_VIOLENCIA_INTRAFAMILIAR.xlsx	INFORME TÉCNICO DE AVANCE V.I.F. 2015 CON CORTE A FEBRERO	09/03/2015
5	Encuesta_VIF.pdf	HITO 6: Encuesta elaborada y validada VIF	05/10/2014
6	ENERO-ABRIL_2014.PDF	Resumen Ejecutivo Enero-Abril 2014	29/05/2014
7	ENTREGA_DE_POA-PAC-PPC_P.V.I.F..docx	OFICIO ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 2015	09/03/2015
8	Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_color_2.PDF	Evidencias Diciembre 2014 VI	30/12/2014
9	Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_color_6.PDF	Evidencias Octubre 2014	07/11/2014
10	Evidencia_Violencia_intrafamiliar.PDF	Evidencias Junio 2014	02/10/2014
11	EVIDENCIAS_ENTREGA_DE_INFORME_TECNICO.docx	EVIDENCIAS ENTREGA DE INFORME TÉCNICO CON CORTE A FEBRERO	27/03/2015
12	EVIDENCIAS_NOVIEMBRE_VI_2014.PDF	EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2014 VI	08/12/2014
13	evidencias_taller.docx	EVIDENCIAS TALLERES EQUIDAD DE GENERO 25-03-2015	27/03/2015
14	EVIDENCIAS_TALLER_04-03-2015.docx	EVIDENCIAS TALLERES EQUIDAD DE GENERO 04-03-2015	27/03/2015
15	FOTOGRAFIAS_NOVIEMBRE_2014.docx	FOTOGRAFIAS Noviembre 2014	08/12/2014
16	FOTOS_TALLER_04-03-2015.docx	FOTOS TALLER 04-03-2015	27/03/2015
17	FOTOS_TALLER_25-03-2015.docx	FOTOS TALLER 25-03-2015	27/03/2015
18	Informe_Cuatrimstral.pdf	HITO 5: Informe Cuatrimestral	05/10/2014
19	Informe_terminación_de_funciones.docx	INFORME TERMINACIÓN DE FUNCIONES	09/03/2015
20	Ingreso_VIF.pdf	HITO 4: Denuncias y fichas de VIF	05/10/2014
21	JUNIO-DICIEMBRE_2013.PDF	Resumen Ejecutivo Junio-diciembre 2013	29/05/2014
22	Junio_2014.docx	Resumen Ejecutivo Junio 2014	15/07/2014
23	MAYO_2014..docx	Resumen Ejecutivo Mayo 2014	10/06/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
24	Oficio_sobre_entrega_de_denuncias.docx	OFICIO SOBRE ENTREGA DE DENUNCIAS CONSEJO DE LA JUDICATURA	27/03/2015
25	POA-PAC-PPC-_P.IF._ESCANEADO.docx	POA-PAC-PPC 2015	09/03/2015
26	POA__PAC_y_PPC.docx	HITO 1: POA, PAC y PPC 2014	10/06/2014
27	Recolección_y_Levantamiento_VIF.pdf	HITO 7: Información de todas las instancias judiciales	05/10/2014
28	Resumen_Ejecutivo_Agosto_2014..pdf	Resumen Ejecutivo Agosto 2014	05/10/2014
29	Resumen_Ejecutivo_Septiembre_2014..pdf	Resumen Ejecutivo Septiembre 2014	05/10/2014
30	Seis_Pasantes.pdf	HITO 3: Recurso Humano contratado.	05/10/2014
31	VIF..docx	HITO 2: Cédula Presupuestaria	23/06/2014
32	violencia_intrafamiliar.PDF	Resumen Ejecutivo Julio 2014	04/08/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Veloz Avendaño, Ana del Rocío	Directora del proyecto
