

 Organización: UNACH | Titular: Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay

 Menú |  Gestión de Proyectos |  Portafolio de Proyectos



Año:











Tipo de seguimiento:

Proyectos a incluir:
 Vertical
 Matricial (Externos)
 Ver Todos

Ver por:

Fase Actual:

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual
 # Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización 	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de avance	Fase Actual	Fecha de Fin	Indicadores				Detalle 
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vicerrectorado Académico >Centro de Tecnologías Educativas	1002	Equipamiento Técnico UNACH	Delgado Altamirano, Jorge Edwin	0.00 % <input type="checkbox"/>	10.00 % <input type="checkbox"/> 	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	
Vicerrectorado Académico >Dirección Académica	1004 #	Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de la UNACH	Guffante Naranjo, Tania María	0.00 % <input type="checkbox"/>	100.00 % <input checked="" type="checkbox"/> 	Ejecución	30/12/2016	0	0	0	0	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	1001	Fortalecimiento Institucional	Reyes Silva, Carlos Patricio	0.00 % <input type="checkbox"/>	67.00 % <input type="checkbox"/> 	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	2	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	1016	Becas Cuarto Nivel PhD	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	0.00 % <input type="checkbox"/>	90.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	
Vicerrectorado de Postgrado e	1035	Becas Cuarto Nivel - Maestrías e	Cepeda	0.00 %	50.00 %	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	



UNACH
Vicerrectorado Académico
Centro de Tecnologías Educativas
PROYECTO: I002 Equipamiento Técnico UNACH

Líder del Proyecto:	Delgado Altamirano, Jorge Edwin (jdelgado@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ríos Rivera, Anita Cecilia	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:	Delgado Altamirano, Jorge Edwin	Prioridad:	2
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91800000.1222.7357	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,815,692.03
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	10/03/2014 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	29/11/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Delgado Altamirano, Jorge Edwin	Fecha del siguiente Hito:	03/11/2014

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL:

La institución durante los últimos dos años a través del proyecto de inversión "Equipamiento Técnico de la Universidad Nacional de Chimborazo", ha implementado los siguientes proyectos:

- Backbone de fibra óptica en el campus MsC Edison Riera
- Data center
- Equipamiento laboratorios de cómputo de Centro de Tecnologías Educativas
- Equipamiento e implementos deportivos para el Centro de Cultura Física
- Mobiliario para CTE, Biblioteca y Centro de Cultura Física
- Equipos de videoconferencia
- Telefonía IP en los campus MsC Edison Riera y La Dolorosa
- Equipamiento multimedia: pizarras interactivas, proyectores laboratorios de cómputo CTE, scanner alto desempeño Biblioteca
- Servidores Sistema Nacional de Información
- Sistema de almacenamiento storage

Sin embargo por la creciente demanda de servicios informáticos y cobertura de internet para el 2014 y 2015 es necesario emprender los siguientes proyectos:

- Ampliación de la red inalámbrica en los campus universitarios
- Ampliación de telefonía IP
- Ampliación de cobertura de internet comercial y red avanzada
- Contratación de bases de datos especializadas. e-books, recurso bibliográfico
- Servidores para repositorios digitales
- Equipamiento laboratorios
- Mobiliario

PROPOSITO:

Proveer de infraestructura tecnológica, redes y comunicaciones para las dependencias académicas y administrativas para apoyo al desarrollo de las actividades académicas e investigación

ALCANCE

El proyecto de equipamiento técnico permitirá a la institución disponer de una infraestructura tecnológica, equipamiento de laboratorios, bibliotecas que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades académicas e investigación con criterios de calidad

PRODUCTO:

Proyecto de equipamiento para dependencias académicas y administrativas

Beneficios Cualitativos


Cobertura de servicios informáticos, e interconectividad en las dependencias académicas y administrativas de los campus universitarios: Norte, Centro y Sur

Tipo de Beneficiario
Comunidad universitaria docentes, estudiantes y administrativos
Restricciones
TIEMPO: La implementación del proyecto es de 22 meses
RECURSOS: Leyes y normativas a nivel de educación superior,
PRESUPUESTO: 4000000 Usd

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 79.75 %
 Fecha de Inicio: 10/03/2014 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

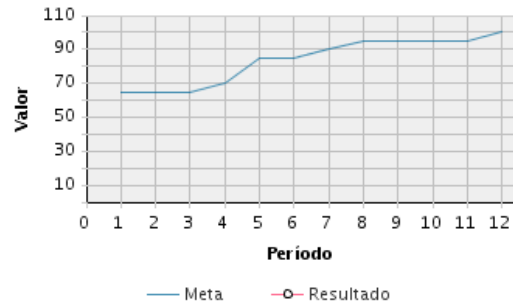

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	65 %	65 %	65 %	70 %	85 %	85 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Si no se adquiere Equipamiento Técnico CAUSARÍA que algunos proyectos no se realicen	20/03/2014	Jorge Edwin Delgado Altamirano	40 %	90	36	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	T1 - Requerimientos de infraestructura tecnológica POA PAC PPC 2014	3. Planeación	01/06/2014		01/06/2014	●	Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	T3 - Procesos de contratación pública	4. Ejecución	01/07/2014		01/07/2014		Sí	5.0
3	T3 - Ejecución proyecto de equipamiento	4. Ejecución	03/11/2014	03/11/2014			No	15.0
4	Evaluación y validación	4. Ejecución	28/11/2014	28/11/2014			No	5.0
5	Liquidación contratos	4. Ejecución	31/12/2014	31/12/2014			No	5.0
6	T15 -1 Requerimientos de infraestructura tecnológica POA, PAC PPC 2015	3. Planeación	05/01/2015	27/03/2015			No	5.0
7	T15 -2 Ejecución proyecto de equipamiento 2015	4. Ejecución	07/09/2015	24/06/2016			No	15.0
8	T15 - 4 Liquidación contratos 2015	3. Planeación	04/01/2016	29/04/2016			No	5.0
9	T15 -3 Evaluación y validación 2015	4. Ejecución	04/01/2016	30/06/2016			No	5.0
10	T16 -1 Requerimientos de infraestructura tecnológica POA, PAC PPC 2016	4. Ejecución	04/04/2016	30/09/2016			No	5.0
11	T16 -2 Ejecución proyecto de equipamiento 2016	4. Ejecución	02/05/2016	30/09/2016			No	15.0
12	T16 -3 Evaluación y validación 2016	4. Ejecución	04/07/2016	30/11/2016			No	5.0
13	T16 -4 Liquidación contratos 2016	4. Ejecución	08/08/2016	30/11/2016			No	5.0
14	T16 -5 Cierre proyecto equipamiento	5. Cierre	05/12/2016	23/12/2016			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,815,692.03 **
Costo Total:	5,472,570.89
Total Devengado:	1,815,692.03
% Costo Total Devengado:	33.18 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 33.18 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,715,537.27	2,000,000.00	0.00	5,715,537.27
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,331,692.03	2,000,000.00	0.00	5,331,692.03
Ppto. Codificado	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		2,000,000.00		
Ppto. Programado	1,948,692.03	0.00	0.00	1,948,692.03
Ppto. Devengado	1,815,692.03	0.00	0.00	1,815,692.03
Estimado a fin de año	* 1,815,692.03	0.00	0.00	1,815,692.03
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 93.17 %	0.00 %	0.00 %	93.17 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la incidencia tecnológica en la universidad MEDIANTE la conformación del Comité de Tecnología, Plan Estratégico de TIC's, reclutamiento de profesionales en el área informática
2	Incrementar equipos e infraestructura tecnológica acorde a los requerimientos institucionales MEDIANTE la implementación de estándares, normativas institucionales y mejores prácticas internacionales

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	I002 - HITO 1 PAC Proyecto Equipamiento	PAC_abril_2014.pdf	15/10/2014
2	I002 - HITO 1 POA Proyecto Equipamiento	POA_abril_2014.pdf	15/10/2014
3	I002 - HITO 1 Resolución aprobación proyecto inversión	RESOLUCION_PROYECTO_EQUIPAMIENTO.PDF	05/10/2014
4	i002 - HITO 1 Resumen de partidas	RESUMEN_DE_PARTIDAS_abril_2014.pdf	15/10/2014
5	I002 - HITO 2 Contrato P-53-UNACH-2014	Contrato_053-P-UNACH-2014.PDF	05/10/2014
6	I002 - HITO 2 Contrato P-99-UNACH-2014	Contrato_099-P-UNACH-2014.PDF	05/10/2014
7	I002 - HITO 2 Procesos de adquisición de equipos, maquinaria a través del proyecto de inversión "Equipamiento Técnico UNACH 2014" para varias dependencias	Oficios_adquisiciones1.PDF	05/10/2014
8	I002 - HITO 2 Procesos de adquisición de equipos, maquinaria a través del proyecto de inversión "Equipamiento Técnico UNACH 2014" para varias dependencias	Oficios_adquisiciones2.PDF	05/10/2014
9	I002 - HITO 3 Adquisición computadoras e impresoras para varias dependencias - catálogo compras públicas	Orden_de_compras_-_Computadoras_e_Impresoras.PDF	05/10/2014
10	I002 - HITO 3 Adquisición copiatoras varias dependencias - catálogo compras públicas	Orden_de_compras_-_copiadoras.PDF	05/10/2014
11	I002 - HITO 3 Contrato 76-P-UNACH-2014 - Planificación de actividades	Reunión_de_Lanzamiento_v1.0.pptx	05/10/2014
12	I002 - HITO 4 Acta P-53-UNACH-2014	Acta_053-P-UNACH-2014.PDF	05/10/2014
13	I002 - HITO 4 Acta P-53-UNACH-2014	Acta_099-P-UNACH-2014.PDF	05/10/2014
14	I002 - HITO 5 Acta contrato 0128-P-UNACH-2014	Contrato_128-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
15	I002 - HITO 5 Acta contrato 080-P-UNACH-2014	Acta_080-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
16	I002 - HITO 5 Acta contrato 080-P-UNACH-2014	Contrato_080-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
17	I002 - HITO 5 Acta contrato 085-P-UNACH-2014	Contrato_085-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
18	I002 - HITO 5 Acta contrato 098-P-UNACH-2014	Acta_098-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
19	I002 - HITO 5 Acta contrato 099-P-UNACH-2014	Contrato_099-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
20	I002 - HITO 5 Acta contrato 112-P-UNACH-2014	Acta_112-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
21	I002 - HITO 5 Acta contrato 115-P-UNACH-2014	Contrato_No._115-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
22	I002 - HITO 5 Contrato 098-P-UNACH-2014	Contrato_098-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
23	I002 - HITO 5 Contrato 115-P-UNACH-2014	Contrato_115-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
24	I002 - HITO 5 Contrato 132-P-UNACH-2014	Contrato_132-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
25	I002 - HITO 5 Contrato 148-P-UNACH-2014	Contrato_148-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
26	I002 - HITO 5 Acta contrato 052-P-UNACH-2014	Acta_052-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
27	I002 - HITO 5 Acta contrato 053-P-UNACH-2014	Acta_053-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
28	I002 - HITO 5 Acta contrato 076-P-UNACH-2014	Acta_076-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
29	I002 - HITO 5 Acta contrato 099-P-UNACH-2014	Acta_099-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
30	I002 - HITO 5 Acta contrato 104-P-UNACH-2014	Acta_104-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
31	I002 - HITO 5 Acta contrato 128-P-UNACH-2014	Contrato_128-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
32	I002 - HITO 5 Acta contrato 149-P-UNACH-2014	Acta_149-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
33	I002 - HITO 5 Contrato 052-P-UNACH-2014	Contrato_052-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
34	I002 - HITO 5 Contrato 053-P-UNACH-2014	Contrato_053-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
35	I002 - HITO 5 Contrato 076-P-UNACH-2014	Contrato_076-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
36	I002 - HITO 5 Contrato 094-P-UNACH-2014	Contrato_094-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
37	I002 - HITO 5 Contrato 099-P-UNACH-2014	Contrato_099-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
38	I002 - HITO 5 Contrato 104-P-UNACH-2014	Contrato_104-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
39	I002 - HITO 5 Contrato 149-P-UNACH-2014	Contrato_149-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015
40	I002 - PPC Proyecto Equipamiento	PPC_abril__2014.pdf	15/10/2014
41	I002- HITO 5 Acta contrato 094-P-UNACH-2014	Acta_094-P-UNACH-2014.PDF	23/03/2015



UNACH
Vicerrectorado Académico
Dirección Académica

PROYECTO: 1004 Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de la UNACH

Líder del Proyecto:	Guffante Naranjo, Tania María		
Patrocinador Ejecutivo:	Ríos Rivera, Anita Cecilia	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:	Guffante Naranjo, Tania María	Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91800000.148.7356	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	10	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	233,250.38
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/01/2014 - 30/12/2016
Fecha de última actualización:	31/05/2016	Fecha de Fin Base:	30/12/2016
Modificado por:	Guffante Naranjo, Tania María	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2016

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACIÓN ACTUAL:

Por mandato de la LOES, la LOSEP; el Reglamento de Escalafón Docente y el Reglamento de Régimen Académico, las IES, están obligadas a capacitar a sus servidores para que respondan a las exigencias sociales de la educación superior

PROPÓSITO:

Capacitar a los profesores y administrativos para un desempeño eficiente de sus responsabilidades

PRODUCTO:

Docentes y administrativos capacitados

Beneficios Cualitativos

Mejores desempeños de los servidores universitarios en las responsabilidades específicas que cumplen; pues poseerán competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales para ofertaer servicios de calidad a los usuarios

Tipo de Beneficiario

- Docentes
- Empleados
- Trabajadores
- Estudiantes

Restricciones

TIEMPO: dos años


COSTO: 900.000 usd

ALCANCE: Serán beneficiarios de las capacitaciones los docentes, empleados, trabajadores de la UNACH, el proyecto incluye ayudas económicas para cursos nacionales e internacionales; así como material de trabajo.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 80.99 %
 Fecha de Inicio: 06/01/2014 Fecha de Fin: 30/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

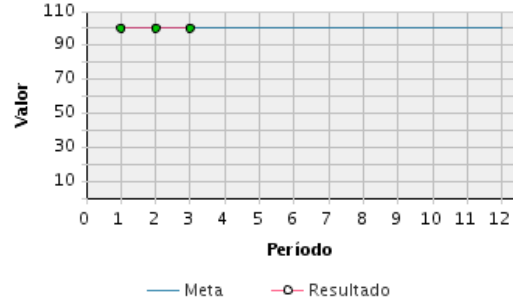

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	100 %	100 %	100 %									
Estado												
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2015 CPDIP Desarrollo de las Jornadas de Capacitación septiembre 2015 Recepción de solicitudes a través del Vicerrectorado Académico para asistencia de los docentes a eventos de capacitación nacionales e internacionales Emisión de informe certificaciones a docentes para asistir a cursos de capacitación nacionales e internacionales Pedido de elaboración de contrato para la PHD. OLGA GLORIA BARBON PÉREZ , como facilitadora del Curso REDISEÑO CURRICULAR OPERACIONALIZACIÓN DIDÁCTICA: DESDE LA INVESTIGACIÓN E INTERCULTURALIDAD. Pedido de elaboración de contrato para el Ms. Héctor Daniel Morocho Lara, como facilitador del Curso "CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCTOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DISEÑO CURRICULAR". Pedido de Elaboración de contrato para la Ing. Paulina Fernanda Bolaños Logroño, como facilitadora del Curso "CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCTOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DISEÑO CURRICULAR". Pedido de Elaboración de contrato para el Mgs. Richard Armando Caiza Castillo , como facilitador del Curso "DISEÑO DE AULAS ICONOGRÁFICAS EN MOODLE VERSIÓN 2.6". Pedido de Elaboración de contrato para el Dr. Urbano Solís Cartas, como facilitador del CURSO "DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR EN LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS".</p> <p>OCTUBRE 2015 CPDIP Pedido de Elaboración de contrato para el Ing. CARLOS VOLTER BUENAÑO PESANTEZ , como facilitador del Curso ELABORACIÓN Y MANEJO DE AULAS VIRTUALES Pedido de Elaboración de contrato para el LIC. JORGE NOE SILVA CASTILLO, como facilitador del Curso "ELABORACIÓN Y MANEJO DE AULAS VIRTUALES Pedido de Elaboración de contrato para el Ing. DIEGO GERARDO JAVIER GUERRA CASTELLANOS como facilitador del Curso TOMA DE CONCIENCIA CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD EN LA GESTIÓN ACADÉMICA Recepción de solicitudes a través del Vicerrectorado Académico para asistencia de los docentes a eventos de capacitación nacionales e internacionales Emisión de informe certificaciones a docentes para asistir a cursos de capacitación nacionales e internacionales</p> <p>NOVIEMBRE 2015 CPDIP Pedidos de cancelación de los facilitadores de las jornadas de capacitación - septiembre 2015</p>	Guffante Naranjo, Tania María	31/05/2016 - 08:42 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Pedido de elaboración de certificados. Pedido a las Unidades Académicas de entrega de certificados</p> <p>DICIEMBRE 2015 CPDIP Pedido de cancelació de facilitador de curso de capacitación. Pedido de cancelación final a coordinadora. Pedido de elaboración de certificados.</p> <p>ENERO 2016 CPDIP Se solicitó al Vicerrectorado de Postgrado e Investigación y al ICITS la colaboración de los señores investigadores para que participen en las Jornadas de capacitación docente - marzo 2016. Se solicitó elaboración de certificados del Curso "Toma de conciencia con los objetivos de calidad en la gestión académica" e "Inducción Microcurricular". Se presentó informe al Vicerrectorado Académico de los cursos desarrollados en el año 2015 A las Unidades Académicas se solicitó el apoyo de los señores docentes, para que participen como Facilitadores de las Jornadas de Capacitación docente - marzo 2016. Se presentó los instrumentos de planificación POA, PAC, PPC, Resumen de Partidas de la Dirección Académica. Elaboración del Plan de Capacitación 2016</p> <p>FEBRERO 2016 CPDIP Se remitió a las Unidades Académicas los certificados de los señores docentes que aprobaron los diferentes cursos organizados en el año 2015. Se solicitó la autorización de la realización de las Jornadas de Capacitación Docente - marzo 2016. Elaboración del Plan de Capacitación 2016</p> <p>MARZO 2016 CPDIP Preparación logística de las Jornadas de Capacitación Docente - marzo 2016 Desarrollo de las Jornadas de Capacitación Docente - marzo 2016 Elaboración del Plan de Capacitación 2016</p> <p>ABRIL 2016 CPDIP Presentación del Plan de Capacitación 2016 Preparación de las Jornadas de Capacitación 2016 Pedido de elaboración de certificados de las Jornadas de Capacitación - marzo 2016</p> <p>MAYO 2016 - CPDIP Presentació</p>		
<p>JUNIO 2015 CPDIP Desarrollo del Curso de "Epistemología y Diseño curricular ", mismo que se realizará hasta el mes de julio. Pedido de la Elaboración de Contrato para la Mg.s Patricia Bravo como Facilitadora del Seminario Taller "DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA" Desarrollo del Seminario Taller "DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Organización de las Jornadas de Capacitación Docente septiembre 2015 Reuniones con el Vicerrectorado Académico Recepción de solicitudes a través del Vicerrectorado Académico para asistencia de los docentes a eventos de capacitación nacionales e internacionales Emisión de certificaciones a docentes para asistir a cursos de capacitación nacionales e internacionales</p> <p>JUNIO 2015 DATH Recepción y tramitación de solicitudes de los servidores administrativos para cursos de capacitación a nivel nacional. Trámite a las solicitudes de capacitación del personal académico de acuerdo al diagrama de procesos institucional.</p> <p>Julio 2015 CPDIP Desarrollo del Curso de "Epistemología y Diseño curricular ", mismo que se realizará hasta el mes de julio.</p>	<p>Guffante Naranjo, Tania María</p>	<p>18/11/2015 - 11:27 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Desarrollo del Seminario Taller "DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Pedido de la Elaboración de Contrato para la Dra. Carmen Varguillas como Facilitadora del Curso "Criterios para la Articulación de Elementos de la Malla y Evaluación de la Construcción Mesocurricular" Desarrollo Curso "Criterios para la Articulación de Elementos de la Malla y Evaluación de la Construcción Mesocurricular" Organización de las Jornadas de Capacitación Docente septiembre 2015 Reuniones con el Vicerrectorado Académico Pedido de elaboración de contrato para la Mgs. Lourdes Del Carmen Zúñiga Recepción de solicitudes a través del Vicerrectorado Académico para asistencia de los docentes a eventos de capacitación nacionales e internacionales Emisión de certificaciones a docentes para asistir a cursos de capacitación nacionales e internacionales</p> <p>JULIO 2015 DATH Recepción de solicitudes de los servidores administrativos para cursos de capacitación Emisión de certificaciones para las capacitaciones solicitadas por personal administrativo de la Institución. Informe semestral sobre el Proyecto de Capacitación a la Dirección de Planificación Pedido de la Elaboración de Contrato para el Ing. Luis Cabezas como Facilitador del Curso "Estadística II con SPSS"</p> <p>AGOSTO 2015 CPDIP Organización de las Jornadas de Capacitación Docente septiembre 2015 Tramite cancelación de los servicios profesionales prestados por la Mg.s Patricia Cecilia Bravo Mancero, con cedula de ciudadanía No. 060224509-4, como Facilitadora del Seminario Taller "DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA", según Contrato de Trabajo No. 1002-DATH-UNACH-2015, de fecha 30 de julio del 2015. Tramite pago con Liquidación de Servicios Prestados a favor de la DRA. CARMEN SIAVIL VARGUILLAS CARMONA, de nacionalidad Venezolana, con pasaporte No. 119401914, como Facilitadora del CURSO "CRITERIOS PARA LA ARTICULACIÓN Pedido de la Elaboración de Contrato para el Mgs. JEAN CARLOS GARCÍA ZACARIAS como Facilitador del Curso Rediseño Curricular: Sistematización de Experiencias: Una Metodología en Acción Pedido de la Elaboración de Contrato para el Ing. DIEGO BERNARDO PALACIOS CAMPANA como Facilitador del Curso EXCEL AVANZADO Y GOOGLE DOCS</p> <p>AGOSTO 2015 DATH Recepción de solicitudes de los servidores administrativos para cursos de capacitación Emisión de certificaciones para las capacitaciones solicitadas por personal administrativo de la Institución.</p>		
<p>ENERO 2015 CPDIP Elaboración del Plan de Capacitación Trámites para aprobación del Plan de Capacitación Reuniones con la señora Vicerrectora Académica para tratar Plan de Capacitación</p> <p>ENERO 2015 DATH Reunión con la señora Vicerrectora Administrativa para tratar Plan de Capacitación-Employados Elaboracion del Plan de Capacitación para el personal administrativo</p> <p>FEBRERO 2015 DATH Reunión con la señora Vicerrectora Administrativa para tratar sobre el Plan de Capacitación Gestionar para la aprobacion del Plan de Capacitación del personal administrativo</p> <p>FEBRERO 2015 CPDIP Reuniones permanentes con la señora Vicerrectora Académica para tratar el Plan de Capacitación docente Elaboración del Plan de Capacitación 2015</p>	<p>Guffante Naranjo, Tania María</p>	<p>23/09/2015 - 11:09 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2015 CPDIP Reuniones permanentes con la señora Vicerrectora Académica para tratar el Plan de Capacitación docente Envío del Plan de Capacitación docente Reunión con representante de IBEC tratar curso de inglés en modalidad virtual Desarrollo del Curso de "Aulas Virtuales", en cada una de las Unidades Académicas</p> <p>MARZO 2015 DATH Recepcion de solicitudes de los empleados para la asistencia a eventos de capacitación</p> <p>ABRIL 2015 CPDIP Reunión con representante de IBEC tratar curso de inglés en modalidad virtual Reuniones con la Sra. Vicerrectora Académica a tratar varios temas Desarrollo del Curso de "Epistemología y Diseño curricular ", mismo que se realizará hasta el mes de julio. Pedido de Elaboración de Certificados al Vicerrectorado Administrativo para entregar a los señores(as) docentes Pedido de autorización para la elaboración de Contrato a coordinadora de los cursos que se realizarán en los meses de mayo a noviembre del 2015</p> <p>ABRIL 2015 DATH Plan de Capacitación aprobado Recepcion de solicitudes de los empleados para la asistencia a eventos de capacitación Emisión de informes favorables para la asistencia a eventos de capacitación.</p> <p>MAYO 2015 CPDIP Pedido de Elaboración de Certificados al Vicerrectorado Administrativo para entregar a los señores(as) docentes Reuniones con la Sra. Vicerrectora Académica a tratar varios temas Desarrollo del Curso de "Epistemología y Diseño curricular ", mismo que se realizará hasta el mes de julio. Pedido de Elaboración de Certificados al Vicerrectorado Administrativo para entregar a los señores(as) docentes Pedido de elaboración de contratao a facilitador del Taller "EPISTEMOLOGÍA Y DISEÑO CURRICULAR"</p> <p>MAYO 2015 DATH Recepción de solicitudes de los servidores administrativos para cursos de capacitación Reuniones con el Director de Talento Humano y la Dra. Tania Guffante para la elaboración del Proyecto de Capacitación en el formato del SENPLADES DEL AÑO 2015 Y 2016</p>		
<p>DICIEMBRE 2014 Trámite de pago de Coordinadora. Seguimiento a trámites de pago Distribución de certificados por Unidades Académica</p>	Guffante Naranjo, Tania María	03/02/2015 - 09:31 AM
<p>NOVIEMBRE 2014 Trámites de pago de Facilitadores Trámite de pago de Coordinadora. Seguimiento a trámites de pago Elaboración de certificados Distribución de certificados por Unidades Académica</p>	Guffante Naranjo, Tania María	03/02/2015 - 09:29 AM
<p>OCTUBRE 2014 Trámites de pago de Facilitadores Trámite de pago de Coordinadora. Seguimiento a trámites de pago Elaboración de certificados Distribución de certificados por Unidades Académicas</p>	Loza Cevallos, Carlos Augusto	01/12/2014 - 08:19 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes Distribución de certificados por Unidades Académicas Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Desarrollo de los cursos del mes de septiembre del 2014 Elaboración de certificados</p>	Loza Cevallos, Carlos Augusto	04/10/2014 - 11:20 AM
<p>AGOSTO 2014</p> <p>Desarrollo de los cursos del mes de agosto del 2014 Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámites de contratos de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámite de pedido de pago del servicio de refrigerios Trámite de pedido de certificaciones presupuestarias</p>	Loza Cevallos, Carlos Augusto	04/10/2014 - 11:13 AM
<p>JULIO 2014</p> <p>Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Trámite de pedido de certificaciones presupuestarias Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Pedido de elaboración de certificados Organización de los cursos que se realizarán en los meses de julio a septiembre de 2014 Desarrollo de los cursos del mes de julio</p>	Loza Cevallos, Carlos Augusto	04/10/2014 - 11:03 AM
<p>JUNIO 2014</p> <p>Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Pedido de elaboración de certificados Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes Trámites de pago de facilitadores y coordinadores que entregaron documentos habilitantes Trámite de pedido de certificaciones presupuestarias</p>	Loza Cevallos, Carlos Augusto	04/10/2014 - 10:10 AM
<p>MAYO 2014</p> <p>Pedido de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos nacionales e internacionales Elaboración de certificados Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes</p>	Loza Cevallos, Carlos Augusto	29/09/2014 - 03:20 PM
<p>ABRIL 2014:</p> <p>Pedidos de auspicios económicos para docentes que viajarán a cursos internacionales Elaboración y suscripción por parte de las autoridades de certificados de cursos asistidos por los docentes Trámites de contratos de docentes que entregaron documentos habilitantes</p>	Loza Cevallos, Carlos Augusto	05/05/2014 - 09:17 AM
<p>MARZO 2014:</p> <p>Se cuenta con la APROBACIÓN del POA-PAC-PPC, y se está iniciando el proceso de contratación de facilitadores. Evaluación de la Capacitación de febrero 2014 Trámites para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales. Primer Quimestre</p>	Loza Cevallos, Carlos Augusto	03/04/2014 - 10:32 AM
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>Se ejecutaron las jornadas de capacitación a docentes del 18 al 28 de febrero, al que asistieron unos 400 profesores, 40 horas. Se realizó la evaluación a los facilitadores.</p>	Consultor e-Strategia, José Antonio Villasís	20/03/2014 - 12:37 PM
<p>ENERO 2014:</p> <p>El proyecto de capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores está en fase de implementación. Se espera que se aperture el presupuesto de proyectos por parte del Ministerio de Finanzas. Se planificó las jornadas de capacitación febrero 2014.</p>	Consultor e-Strategia, José Antonio Villasís	20/03/2014 - 12:32 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Sin presupuesto asignado para el 2016 no se puede contratar a facilitadores	31/05/2016	Tania María Guffante Naranjo	10	10	1	0/0
No se cuenta con asignación presupuestaria para el año 2016	30/03/2016	Tania María Guffante Naranjo	10	10	1	0/0
No se entregan a tiempo certificados solicitados a Publicaciones a través del Vicerrectorado Administrativo	03/06/2015	Tania María Guffante Naranjo	10	10	1	0/0
No se aprueba en tiempos esperados el presupuesto anual 2015	03/06/2015	Tania María Guffante Naranjo	10	10	1	0/0
Aprobación del presupuesto anual para el proyecto de inversión 2014	03/06/2015	Tania María Guffante Naranjo	10	10	1	0/0
No se aprueba en tiempos esperados presupuesto anual 2014	03/06/2015	Carlos Augusto Loza Cevallos	10	10	1	0/0
Facilitadores no entregan documentos habilitantes para solicitar elaboración de contratos	03/06/2015	Carlos Augusto Loza Cevallos	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 7

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Proyecto.5. Tiempo. Falta de facilitadores CAUSARÍA retraso en la capacitación	23/06/2014	Carlos Augusto Loza Cevallos	20 %	10	2	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Estudio de prioridades para la capacitación del año 2014 del personal REALIZADO	3. Planeación	15/01/2014		15/01/2014		Sí	1.0
2	Diseño y Aprobación del Plan de capacitación del personal APROBADO	3. Planeación	30/01/2014		30/01/2014		Sí	1.0
3	Selección y Contratación de facilitadores jornadas febrero REALIZADO	3. Planeación	10/02/2014		10/02/2014		Sí	1.0
4	Trámite de certificación presupuestaria jornadas febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	20/02/2014		20/02/2014		Sí	1.0
5	Jornadas de capacitación a docentes febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
6	Evaluación de la Capacitación de febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	28/03/2014		28/03/2014		Sí	1.0
7	Trámites para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales.Primer Quimestre EJECUTADO	4. Ejecución	28/03/2014		28/03/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	Pedidos de contrato a facilitadores jornadas febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	01/04/2014		01/04/2014		Sí	1.0
9	Ejecución del Plan de Capacitación primer cuatrimestre REALIZADO	4. Ejecución	30/04/2014		30/04/2014		Sí	5.0
10	Suscripción de contratos a facilitadores febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
11	Pago de contratos a facilitadores jornadas febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	09/05/2014		09/05/2014		Sí	5.0
12	Programación Jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO	4. Ejecución	18/06/2014		18/06/2014		Sí	2.0
13	Entrega de certificados a docentes que aprobaron jornadas de capacitación febrero 2014 REALIZADO	4. Ejecución	30/06/2014		30/06/2014		Sí	3.0
14	Selección y Contratación de facilitadores jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO	4. Ejecución	18/07/2014		18/07/2014		Sí	2.0
15	Trámite de contratación para facilitadores de jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO	4. Ejecución	25/08/2014		25/08/2014		Sí	2.0
16	Desarrollo de jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO	4. Ejecución	29/08/2014		29/08/2014		Sí	5.0
17	Trámites para viajes de docentes a eventos nacionales e internacionales segundo cuatrimestre REALIZADO	4. Ejecución	29/08/2014		29/08/2014		Sí	2.0
18	Evaluación jornadas capacitación agosto 2014 PROGRAMADO	4. Ejecución	12/09/2014		12/09/2014		Sí	2.0
19	Pago a facilitadores jornadas de capacitación agosto 2014 PROGRAMADO	4. Ejecución	15/10/2014		15/10/2014		Sí	2.0
20	Preparación de estadísticas anuales e informes 2014 REALIZADO	5. Cierre	21/11/2014		21/11/2014		Sí	1.0
21	Trámites para viajes de docentes a eventos nacionales e internacionales tercer cuatrimestre 2014 REALIZADO	4. Ejecución	12/12/2014		12/12/2014		Sí	4.0
22	Entrega de certificados a docentes que aprobaron jornadas de capacitación agosto 2014 REALIZADO	5. Cierre	19/12/2014		19/12/2014		Sí	5.0
23	Selección y contratación a facilitadores para la capacitación 2015 primer y segundo semestre REALIZADO	3. Planeación	01/01/2015		30/09/2015		Sí	0.0
24	Suscripción y pago de contratos a facilitadores 2015 primer semestre y segundo REALIZADO	3. Planeación	01/01/2015		30/09/2015		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	Hitos del 2015 REALIZADO	6. Post-proyecto	30/01/2015		30/01/2015		Sí	20.0
26	Trámites para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales 2015 primer y segundo semestre REALIZADO	3. Planeación	02/02/2015		30/11/2015		Sí	0.0
27	Elaboración del Plan de Capacitación 2015 para los docentes e investigadores y personal administrativo REALIZADO	4. Ejecución	03/02/2015		31/03/2015		Sí	1.0
28	Desarrollo de los cursos conforme "Plan de capacitación" 2015 primer y segundo semestre REALIZADO	4. Ejecución	26/02/2015		30/11/2015		Sí	0.0
29	Entrega de certificados a docentes que aprobaron los cursos de capacitación primer y segundo semestre 2015 REALIZADO	3. Planeación	26/02/2015		30/11/2015		Sí	0.0
30	Informes de las capacitaciones del personal administrativo del primer cuatrimestre APROBADOS	4. Ejecución	02/03/2015		08/05/2015		Sí	10.0
31	Recepción y análisis de oficios para capacitaciones del personal administrativo del primer cuatrimestre 2015 SOLICITADAS	4. Ejecución	02/03/2015		12/05/2015		Sí	10.0
32	Plan de Capacitación 2015 para los docentes e investigadores y personal administrativo APROBADO	4. Ejecución	01/04/2015		24/04/2015		Sí	10.0
33	Diseño, elaboración y aprobación del Plan de capacitación 2016 APROBADO	4. Ejecución	01/01/2016		29/03/2016		Sí	0.0
34	Selección de facilitadores marzo 2016 - REALIZADO	4. Ejecución	04/01/2016		29/02/2016		Sí	0.0
35	Desarrollo de las Jornadas de capacitación - marzo 2016 REALIZADO	4. Ejecución	07/03/2016		31/03/2016		Sí	0.0
36	Selección de facilitadores - septiembre 2016 REALIZADO	4. Ejecución	18/04/2016	31/07/2016			No	0.0
37	Entrega de certificados de aprobación de las jornadas de capacitación marzo 2016 REALIZADO	4. Ejecución	20/04/2016	30/06/2016			No	0.0
38	Desarrollo de las Jornadas de capacitación - septiembre 2016 REALIZADO	4. Ejecución	01/09/2016	30/09/2016			No	0.0
39	Entrega de certificados de aprobación de las jornadas de capacitación septiembre 2016 REALIZADO	4. Ejecución	18/10/2016	30/11/2016			No	0.0
40	Informe anual al Vicerrectorado Académico REALIZADO	4. Ejecución	20/12/2016	31/12/2016			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	233,250.38 **
Costo Total:	900,000.00
Total Devengado:	233,250.38
% Costo Total Devengado:	25.92 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 25.92 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	500,000.00	300,000.00	0.00	800,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		300,000.00		
Ppto. Programado	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Ppto. Devengado	233,250.38	0.00	0.00	233,250.38
Estimado a fin de año	* 233,250.38	0.00	0.00	233,250.38
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	266,749.62	0.00	0.00	266,749.62
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 46.65 %	0.00 %	0.00 %	46.65 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar las competencias docentes y administrativas MEDIANTE la formación continua, réplica de conocimientos, sensibilización docente y programas de incentivos

Objetivos Operativos Matriciales	
UNACH >Vicerrectorado Académico >CIT de la Facultad de Ciencias de la Salud	
1	Incrementar la formación integral de docentes y estudiantes MEDIANTE la aplicación del Modelo Pedagógico y el Código de Ética de la UNACH.
UNACH >Vicerrectorado Académico >Centro de Educación Física	
1	Incrementar la práctica adecuada de la Actividad Física y Deportes, en la comunidad universitaria MEDIANTE las disciplinas ofertadas en el Centro de Educación Física, la motivación del uso adecuado del ocio y la operativización de escenarios deportivos.
2	Incrementar la sustentabilidad de la vinculación con la sociedad MEDIANTE programas y proyectos sostenibles con participación docente y/o discente alineados al Plan Estratégico de Vinculación con la sociedad.
UNACH >Vicerrectorado Académico >Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas	
3	Incrementar la producción científica docente y/o discente MEDIANTE la implementación del Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y saberes aplicables a la facultad
UNACH >Vicerrectorado Académico >Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías	
1	Incrementar la formación integral de docentes y estudiantes MEDIANTE la evaluación del Modelo Pedagógico.
3	Incrementar la producción científica docente y/o discente MEDIANTE la regulación del Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes aplicable a la Facultad
4	Incrementar la sustentabilidad de la vinculación con la sociedad MEDIANTE programas y proyectos sostenibles con participación docente y/o discente alineados al Plan Estratégico de Vinculación con la Sociedad.
UNACH >Vicerrectorado Académico >Unidad de Formación Académica y Profesionalización	
1	Incrementar la formación integral de docentes y estudiantes MEDIANTE la aplicación del Modelo Pedagógico y el Código de Ética de la UNACH.
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	
13	Incrementar la calidad de entrega de productos y servicios de Talento Humano, MEDIANTE, medición del clima laboral, la implementación de un Plan de capacitación, Implementación de un Sistema de Gestión de Información de Talento Humano, proyecto de Fortalecimiento Institucional, Diseño de un plan de descripción, valoración de puestos, plan de evaluación del desempeño y contratación del personal capacitado.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Plan de Capacitación Aprobado del Personal Administrativo	Hito_32_Plan_de_Capacitación_Aprobado_del_Personal_Administrativo.pdf	12/05/2015
2	Cedula Presupuestaria con corte a septiembre 2014	Hito_7_-_11_-_17_-_19_-_21_Cedula_presupuestaria.PDF	15/10/2014
3	Certificaciones viajes nacionales e internacionales	hito_26_Infomes_certificación_viajes_nacionales_e_internacionales.pdf	10/09/2015
4	Consolidados 2015 - eventos de capacitación - ayudas económicas	Hito_23_-_24_-_26_-_28.pdf	20/11/2015
5	CPDIP - Diseño y aprobación del plan de capacitación del personal	Hito_2_-_Diseño_y_Aprobación_del_Plan_de_Capacitación_del_personal.pdf	14/10/2014
6	CPDIP Estudio de Prioridades para la Capacitación del año 2014 del personal	Hito_1_-_Estudio_de_Prioridades_para_la_capacitación_del_año_2014_del_personal.pdf	14/10/2014
7	Curso Criterios para la Articulación de Elementos de la Malla y Evaluación de la Construcción Mesocurricular	hito_23_24_28_29_Curso_Criterios_para_la_Articulación.pdf	10/09/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
8	Curso de Prueba de Hipótesis y Modelo Estadísticos con R para Investigación	hito_23_24_28_29_Curso_Prueba_d_Hipotesis.pdf	18/09/2015
9	Curso Epistemología y Diseño Curricular	hito_23_24_28_29Curso_Epistemología_y_Diseño.pdf	18/09/2015
10	Desarrollo de las Jornadas de capacitación agosto 2014	Hito_16.- _Desarrollo_de_las_jornadas_de_capacitación_agosot_2014.PDF	15/10/2014
11	Desarrollo de las Jornadas de capacitación agosto 2014	Hito_16.pdf	15/10/2014
12	Elaboración del Plan de Capacitación y pedido de aprobación	Hito_27._Plan_de_capacitación_2015_aprobado.pdf	12/05/2015
13	ENTREGA DE CERTIFICADOS	HITO_29._ENTREGA_DE_CERTIFICADOS_A_FACULTADES.pdf	23/06/2015
14	Entrega de certificados a docentes que aprobaron jornadas de capacitación febrero 2014	Hito_13.- _Entrega_de_certificados_a_docentes_jornadas_febrero_2014.PDF	14/10/2014
15	Evaluación de la capacitación de febrero 2014	Hito_6.- _Evaluación_de_la_capacitación_de_febrero_2014.pdf	14/10/2014
16	Evaluación jornadas capacitación agosto 2014	Hito_18.- _Evaluación_jornadas_capacitación_agosto_2014.pdf	15/10/2014
17	Hito 28. Desarrollo del Plan Curso de Aulas Virtuales	4._Ejecución_del_Plan_-_Curso_Aulas_Lic._Silva.pdf	17/04/2015
18	Hito 33 Presentación del Plan de Capacitación Anual 2016 al Vicerrectorado Académico	Hito_33_Plan_de_capacitación_2016.pdf	30/03/2016
19	Hito 7- 11 - 19 - 21	Hito_7_-11_-17_-19_-21.PDF	16/10/2014
20	Hito. 28. 1. Desarrollo del Plan Curso de Aulas Virtuales	4.1._Ejecución_del_Plan_Curso_Aulas_Dr._Carlos_Buenano.pdf	17/04/2015
21	Hitos 7 - 11 - 17- 19 - 21	Hito_7_-11_-17_-19_-21_Certificaciones.PDF	15/10/2014
22	INFORMA AULAS VIRTUALES	HITO_28.3._AULAS_VIRTUALES_-_POLITICAS.pdf	23/06/2015
23	INFORME AULAS VIRTUALES	HITO_28.4._MESOCURRICULO.pdf	23/06/2015
24	INFORME AULAS VIRTUALES	HITO_28._AULAS_VIRTUALES_-_SALUD.pdf	23/06/2015
25	INFORME AULAS VIRTUALES	HITO_28.1.AULAS_VIRTUALES_-_EDUCACIÓN.pdf	23/06/2015
26	INFORME AULAS VIRTUALES	HITO_28.2._AULAS_VIRTUALES_-_INGENIERÍA.pdf	23/06/2015
27	Informe favorable de asistencia a las capacitaciones del Personal Administrativo	Hito_30_Informe_favorable_del_Personal_Administrativo.pdf	12/05/2015
28	Jornadas de capacitación febrero 2014	Hito_5.- _Jornadas_de_capacitación_a_docentes_febrero_2014.PDF	14/10/2014
29	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA UNVERSION	MATRIZ_DE_SEGUIMIENTO_DE_LA_INVERSIÓN.pdf	22/05/2015
30	Personal administrativo capacitado agosto 2015	HITO_2015_AGOSTO_DATH.PDF	23/09/2015
31	Personal administrativo capacitado julio 2015	HITO_2015_JULIO_DATH.PDF	23/09/2015
32	Personal administrativo capacitado junio 2015	HITO_2015_JUNIO_DATH.PDF	23/09/2015
33	Plan de capacitación y su aprobación - CPDIP	Hito_27.pdf	28/02/2015
34	Programación jornadas de capacitación agosto 2014	Hito_12.- _Programación_jornadas_de_capacitación_agosto_2014.pdf	14/10/2014
35	Recepción y Análisis de Solicitudes del Personal Administrativo	Hito_31_Recepción_y_Análisis_de_Solicitudes_del_Personal_Administrativo.pdf	12/05/2015
36	Registro de Capacitación del personal administrativo 2015	HITO_2015_DATH_PERSONAL_ADMINISTRATIVO.pdf	23/09/2015
37	Reglamento de Capacitación	Hito_1.pdf	15/10/2014
38	Selección y contratación de facilitadores - Pedidos de contrato a facilitadores - Suscripción de contratos a facilitadores - Pago de contratos a facilitadores jornadas febrer 2014	Hito_3_-8_-10_-11.PDF	14/10/2014
39	Selección y contratación de facilitadores - Pedidos de contrato a facilitadores - Suscripción de contratos a facilitadores - Pago de contratos a facilitadores jornadas febrer 2014	Hito_3_-8_-10_-11..PDF	14/10/2014
40	Selección - pago - realización de certificados facilitador segundo semestre 2015	Hito_23_-_2_5_-28_-29.pdf	20/11/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
41	Selección y contratación de facilitadores - Trámite de contratación para facilitadores - Pago de facilitadores de las jornadas de capacitación agosto 2014	Hito_14_-_15_-_19.PDF	15/10/2014
42	Seminario Taller Didáctica y Pedagogía para la Enseñanza Universitaria	hito._23__24__28__29Seminario_Taller_Didactica_y_Pedag.pdf	14/09/2015
43	Trámite de certificación presupuestaria jornadas febrero 2014	Hito_4.- _Trámite_de_certificación_presupuestaria_jornadas_febrero.PDF	14/10/2014
44	Trámite para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales primer quimestre - segundo cuatrimestre - tercer cuatrimestre	Hito_7_-_17_-_21..pdf	14/10/2014
45	Trámite para pedidos de asistencia a cursos nacionales e internacionales primer quimestre - segundo cuatrimestre - tercer cuatrimestre	Hito_7_-_17_-_21.PDF	14/10/2014



UNACH
Vicerrectorado Administrativo
Departamento de Administración de Talento Humano
PROYECTO: 1001 Fortalecimiento Institucional

Líder del Proyecto:	Reyes Silva, Carlos Patricio (creyes@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barba Maggi, María Angélica	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:	Coloma Machado, Carlos Arturo	Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91800000.0000.373857	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,138,371.06
Tipo de Ppto. Externo:	Recursos Propios	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	31/03/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Reyes Silva, Carlos Patricio	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2016

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL:

Actualmente la ley de servicio público, ley orgánica de educación superior establece el pago de una bonificación por jubilación y por renuncia voluntaria, por lo que con la finalidad de garantizar el reconocimiento económico que estas exigen se ha formulado el proyecto de fortalecimiento institucional, este proyecto contempla a los tres regímenes laborales. (LOES, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO)

PROPOSITO

El cumplimiento oportuno en el pago a los servidores que se acogen al beneficio de la jubilación o renuncia voluntaria.

PRODUCTO

Pago de la compensación

Beneficios Cualitativos

Con este proyecto se propende al buen vivir de las personas que han dedicado parte de su vida al servicio de la Universidad siendo justo y legal el pago de la indemnización por renuncia voluntaria o por acogerse al beneficio de la jubilación y que de manera oportuna planificaron su retiro.
 Ejecución de partida presupuestaria planificada.

Tipo de Beneficiario

Servidores que se acogen a la jubilación o renuncia voluntaria

Restricciones

Solo los servidores que se encuentran considerados en el presupuesto.

TIEMPO:

Hasta 31 de diciembre del 2016

COSTO:

2'500.000.00

ALCANCE:


Solo los servidores que se encuentran considerados en el presupuesto.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 88.61 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

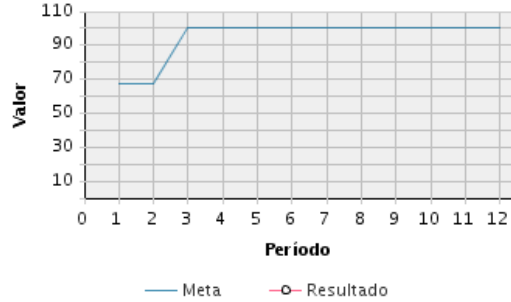

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	67 %	67 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICEIMBRE 2015.- SE REALIZO PAGO A LINO CASTELO Y NARDO PESANTES	Reyes Silva, Carlos Patricio	15/01/2016 - 12:03 PM
noviembre 2015 SE REALIZO PAGO POR AJUSTE DE CALCULO DOCENTE IRMA GRANIZO	Reyes Silva, Carlos Patricio	15/01/2016 - 12:03 PM
OCTUBRE 2015.- EN EL MES DE OCTUBRE NO EXISTE MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO.	Reyes Silva, Carlos Patricio	09/11/2015 - 10:32 AM
SEPTTIEMBRE 2015.- EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO EXISTE MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO.	Reyes Silva, Carlos Patricio	09/11/2015 - 10:31 AM
AGOSTO 2015.- EN ESTE MES NO EXISTEN PAGOS	Reyes Silva, Carlos Patricio	21/09/2015 - 11:33 AM
JULIO 2015.- EN ESTE MES NO EXISTEN PAGOS	Reyes Silva, Carlos Patricio	21/09/2015 - 11:33 AM
JUNIO 2015.- EN ESTE MES SE PAGO RENUNCIAS POR JUBILACIÓN A 2 PERSONAS Y POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS A 2 COMPAÑEROS, ESTOS PAGOS NO ESTUVIERON PROGRAMADOS EBN ESTE MES	Reyes Silva, Carlos Patricio	30/07/2015 - 03:31 PM
MAYO 2015.- EN ESTE MES NO SE PLANIFICÓ EL PAGO DE RENUNCIAS POR JUBILACIÓN O VOLUNTARIAS SIN EMBARGO, SE REALIZÓ EL PAGO A DOS FUNCIONARIAS QUIENES SE ACOGIERON A LA JUBILACIÓN.	Reyes Silva, Carlos Patricio	09/06/2015 - 10:55 AM
ABRIL 2015.- Se ha presentado la renuncia de parte de funcionarios, los cuales serán pagados en el mes de abril	Reyes Silva, Carlos Patricio	08/05/2015 - 09:29 AM
MARZO 2015.- Hasta la presente fecha no existe disponibilidad presupuestaria para el proyecto, se espera que para abril se asigne de parte del Ministerio de finanzas los recursos correspondientes	Reyes Silva, Carlos Patricio	25/03/2015 - 09:17 AM
DICIEMBRE 2014.- Se procede al pago de la bonificación por renuncia de la señora Patricia Mejia asi como por jubilación del master Cesar Herrera; además se considera el posible pago de la señora Marielena Espín por renuncia no planificada	Reyes Silva, Carlos Patricio	25/03/2015 - 09:16 AM
NOVIEMBRE 2014.- Se tiene planificado el pago de la bonificación por jubilación de la Sra. Cristina Díaz.	Reyes Silva, Carlos Patricio	02/12/2014 - 03:01 PM
OCTUBRE 2014: Se cancela la bonificación por jubilación a la señora InésChávez.	Reyes Silva, Carlos Patricio	21/11/2014 - 04:33 PM
SEPTIEMBRE 2014: Se realiza el pago de la Bonificación por Jubilación del Economista Luis Sánchez	Reyes Silva, Carlos Patricio	06/10/2014 - 12:56 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2014: No se contemplo pago alguno por periodo de vacaciones	Reyes Silva, Carlos Patricio	19/09/2014 - 03:57 PM
JULIO 2014.- Se ha procedido al pago de la bonificación por jubilación al master Mario Espinoza	Reyes Silva, Carlos Patricio	19/09/2014 - 03:57 PM
junio 2014.- mediante cur de pago N° 4734 se procede a realizar el pago de la bonificación por jubilación de los señores Lic. Cesar Arias, MsC. Miguel Zuñiga	Reyes Silva, Carlos Patricio	04/07/2014 - 12:37 PM
PAGO DE BONIFICACION POR JUBILACION A JOSE SÁNCHEZ Y LUIS VALLEJO, PRESUPUESTO DEVENGADO INFERIOR AL PROGRAMADO POR LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO, AL PAGAR PROPORCIONAL DE AL TIEMPO DE DEDICACIÓN DISMINUYE EL MONTO A INDEMNIZAR CORRESPONDE A MAYO 2014	Reyes Silva, Carlos Patricio	29/05/2014 - 10:02 AM
MEDIANTE CUR DE PAGO 2618 DEL 15 DE ABRIL 2014 SE PROCEDE AL PAGO DE LA BONIFICACION POR JUBILACION A FAVOR DE LOS DOCTORES LUIS JARA ZAMBRANO Y MIGUEL AVALOS OBREGON	Reyes Silva, Carlos Patricio	29/05/2014 - 09:58 AM
Marzo 2014 se procede al pago de las bonificaciones por jubilación de Robalino Rodrigo, Lara Hernán, pago por renuncia voluntaria Benavides Raúl, mediante cur de pago N° 2140 y 2177	Reyes Silva, Carlos Patricio	03/04/2014 - 09:49 AM
Por tramites en SENPLADES y Ministerio de Finanzas no se realiza planificación de pagos en el mes de febrero 2014	Coloma Machado, Carlos Arturo	27/03/2014 - 04:12 PM
Por tramites en SENPLADES y Ministerio de Finanzas no se realiza planificación de pagos en el mes de enero 2014	Coloma Machado, Carlos Arturo	27/03/2014 - 04:11 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Proyecto.1. General. Calculo 0 CAUSARÍA la no ejecución presupuestaria e incumplimiento de metas	09/06/2015	Carlos Patricio Reyes Silva	20 %	30	6	0/1
Organizacional.9. Otros. La no presentación de las renuncias CAUSARÍA incumplimeto en ejecución presupuestaria y de metas	09/06/2015	Carlos Patricio Reyes Silva	20 %	20	4	1/2

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	T1 - Proyecto en el SIPeIP, dictamen de prioridad y aprobación de SENPLADES-MEF, REGISTRADO Y APROBADO	2. Definición	02/05/2012		02/05/2012		Sí	5.0
2	T1 - Presupuestación SOLICITADA Y APROBADA	3. Planeación	28/06/2013		28/06/2013		Sí	2.0
3	T2 - Nomina de jubilación CALCULADA Y APROBADA	3. Planeación	28/06/2013		28/06/2013		Sí	2.0
4	T1 - Proforma APROBADA	3. Planeación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	2.0
5	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones marzo 2014 PAGADO	4. Ejecución	31/03/2014		31/03/2014		Sí	2.0
6	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones,	4. Ejecución	30/04/2014		28/04/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	renuncias voluntarias e indemnizaciones abril 2014 PAGADO							
7	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones mayo 2014 PAGADO	4. Ejecución	31/05/2014		29/05/2014		Sí	2.0
8	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones junio 2014 PAGADO	4. Ejecución	30/06/2014		30/06/2014		Sí	2.0
9	Primer informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2014	4. Ejecución	10/07/2014		10/07/2014		Sí	2.0
10	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones julio 2014 PAGADO	4. Ejecución	31/07/2014		31/07/2014		Sí	2.0
11	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones septiembre 2014 PAGADO	4. Ejecución	30/09/2014		30/09/2014		Sí	2.0
12	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones octubre 2014 PAGADO	4. Ejecución	31/10/2014		31/10/2014		Sí	2.0
13	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones noviembre 2014 PAGADO	4. Ejecución	30/11/2014		30/11/2014		Sí	2.0
14	Segundo informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2014	5. Cierre	31/12/2014		31/12/2014		Sí	3.0
15	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones diciembre 2014 PAGADO	4. Ejecución	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
16	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones marzo 2015 PAGADO	4. Ejecución	31/03/2015		31/03/2015		Sí	6.6
17	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones abril 2015 PAGADO	4. Ejecución	30/04/2015		30/04/2015		Sí	9.9
18	Primer informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2015	4. Ejecución	01/07/2015		31/07/2015		Sí	0.0
19	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renuncias voluntarias e indemnizaciones julio 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/07/2015		31/07/2015		Sí	6.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
20	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones octubre 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/10/2015		30/10/2015		Sí	3.3
21	Registros contables financieros ASENTADOS	5. Cierre	01/12/2015		31/12/2015		Sí	0.0
22	Segundo informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2015	4. Ejecución	01/12/2015		31/12/2015		Sí	0.0
23	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones diciembre 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/12/2015		31/12/2015		Sí	6.6
24	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones marzo 20165 PAGADO	4. Ejecución	31/03/2016	31/03/2016			No	33.0
25	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones abril 20165 PAGADO	4. Ejecución	01/04/2016	30/04/2016			No	0.0
26	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones agosto 20165 PAGADO	4. Ejecución	01/08/2016	31/08/2016			No	0.0
27	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones diciembre 20165 PAGADO	4. Ejecución	01/12/2016	20/12/2016			No	0.0
28	Informe de cumplimiento REALIZADO 2016	4. Ejecución	19/12/2016	31/12/2016			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de renunciaciones pagadas versus número de renunciaciones planificadas		100.00 %	0	0	01/01/2014	Febrero
2	Porcentaje jubilación y/o retiro voluntario		100.00 %	0	0	03/03/2014	Febrero


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	1,500,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,138,371.06 **
Costo Total:	3,000,000.00
Total Devengado:	761,696.06
% Costo Total Devengado:	25.39 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 25.39 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,013,000.00	376,675.00	0.00	1,389,675.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,013,000.00	376,675.00	0.00	1,389,675.00
Ppto. Codificado	771,000.00	376,675.00	0.00	1,147,675.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado	1,013,000.00	376,675.00	0.00	1,389,675.00
Ppto. Devengado	761,696.06	0.00	0.00	761,696.06
Estimado a fin de año	* 761,696.06	376,675.00	0.00	1,138,371.06
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	251,303.94	0.00	0.00	251,303.94
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 75.19 %	0.00 %	0.00 %	54.81 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016

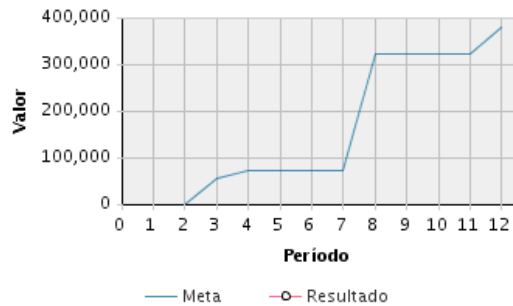

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	54,900.00		54,900.00				
Abr	15,402.50		70,302.50				
May	0.00		70,302.50				
Jun	0.00		70,302.50				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul	0.00		70,302.50				
Ago	251,472.50		321,775.00				
Sep	0.00		321,775.00				
Oct	0.00		321,775.00				
Nov	0.00		321,775.00				
Dic	54,900.00		376,675.00				
Total	376,675.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar la calidad de entrega de productos y servicios de Talento Humano, MEDIANTE, medición del clima laboral, la implementación de un Plan de capacitación, Implementación de un Sistema de Gestión de Información de Talento Humano, proyecto de Fortalecimiento Institucional, Diseño de un plan de descripción, valoración de puestos, plan de evaluación del desempeño y contratación del personal capacitado.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO NO GENERADO PARA MAYO	JUBILACIONES_MAYO_2015.pdf	09/06/2015
2	PAGO POR JUBILACIONES Y RENUNCIAS VOLUNTARIAS JUNIO 2015	JUBILACIONES_JUNIO_2015.pdf	30/07/2015
3	T1 - Hito 1	Fortalecimiento_Institucional_2014_Dictamen.pdf	02/12/2014
4	T1 - Hito 2	PRESUPUESTO_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL.pdf	02/12/2014
5	T2 - Hito 3	Planificación_de_jubilaciones_aprobada.pdf	02/12/2014
6	T2, T3 - Hito 10	PAGO_BONIFICACION_ESPINOZA_MARIO_CUR_6508_JUNIO_2014.pdf	02/12/2014
7	T2, T3 - Hito 11	pago_bonificacion_por_jubilacion_Sanchez_CUR_10178_SEPTIEMBRE_2014.pdf	02/12/2014
8	T2, T3 - Hito 12	PAGO_BONIFICACIÓN_POR_JUBILACION_CHAVEZ_CUR_00582004 OCTUBRE_2014.pdf	02/12/2014
9	T2, T3 - Hito 13	PAGO_BONIFICACIÓN_JUBILACIÓN_DIAZ_NOVIEMBRE_2014.pdf	02/12/2014
10	T2, T3 - Hito 5	Pago_de_beneficio_por_jubilacion_Benavides_Lara_Roberto_CUR_1140_2201_MARZO_2014.pdf	02/12/2014
11	T2, T3 - Hito 6	PAGO_BONIFICACION_DE_JARA_Y_AVALOS_CUR_2618_ABRIL_2014.pdf	02/12/2014
12	T2, T3 - Hito 7	pago_bonificaciones_DE_SANCHES_VALLEJO_CUR_4102112_2014.pdf	02/12/2014
13	T2, T3 - Hito 8	PAGO_JUBILACIONES_DE_ARIAS_-ZUÑIGA_CUR_4734_JUNIO_2014.pdf	02/12/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Huilca Alvarez, Silvana Paola	Analista 1	Asistente Ejecutiva de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	shuilca@unach.edu.ec	
Reyes Silva, Carlos Patricio	Aprovador	Jefe de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	creyes@unach.edu.ec	
Sanandres Alvarez, María Renata	Analista	Analista de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	rsanandres@unach.edu.ec	
Vinueza Cevallos, Gissela Paola	Verificador	Subjefa de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	gvinueza@unach.edu.ec	



UNACH
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación
Instituto de Investigaciones ICITS

PROYECTO: I016 Becas Cuarto Nivel PhD

Líder del Proyecto:	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto (lcepeda@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barba Maggi, María Angélica	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:		Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91510000.727.7353	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,502,874.72
Tipo de Ppto. Externo:	Recursos Propios	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	18/04/2012 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	04/05/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Avendaño Herrera, Fernando Octavio	Fecha del siguiente Hito:	30/12/2016

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL:

El mejoramiento académico de la UNACH está en función de la formación académica de los docentes y por tanto se requiere un programa que impulse y apoye para que los docentes titulares realicen estudios de Cuarto Nivel PhD.

PROPOSITO:

Desarrollar un programa de becas y ayudas económicas que brinde apoyo con el financiamiento para la realización de estudios en el exterior a nivel de Doctorado PhD a los Docentes titulares de la UNACH durante la ejecución del proyecto.

PRODUCTOS

Al menos 12 becas otorgadas por año a docentes agregados a tiempo completo de la UNACH para que cursen estudios Phd en el exterior.

Beneficios Cualitativos

Considerando la necesidad que tienen conforme a la Ley de Educación Superior los docentes de tener el grado de PhD, la UNACH ha formulado un programa de becas de 4to nivel; para lo cual inicialmente se prevee que se cuente con la reglamentación correspondiente que viabilice el financiamiento para otorgar becas a los docentes de la UNACH para que realicen estudios de PhD.

La UNACH cumpla con los indicadores establecidos por los organismos de control de Educación Superior para la acreditación institucional y para su recategorización.

Al término de la ejecución del proyecto se dispone de una nómina definitiva de al menos 36 docentes titulares de la UNACH que se benefician con las becas o ayudas económicas para estudios de PhD.

La UNACH contará con una planta docente con alto nivel formativo que contribuye directamente al incremento del nivel académico.

Tipo de Beneficiario

Constituyen los 223 docentes e investigadores titulares varones y mujeres de la UNACH, que potencialmente pueden aplicar a las postulaciones para ser adjudicatario de las becas o ayudas económicas, de los cuales el 65% son hombres y el 35% son mujeres.

Restricciones

TIEMPO: 5 años


COSTO: 1.661.347,74 USD

ALCANCE: Institucional dirigido a docentes titulares agregados y auxiliares.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 87.89 %
 Fecha de Inicio: 18/04/2012 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Durante el período comprendido entre los meses de enero a mayo del 2014 en el Proyecto Becas de Cuarto Nivel PhD se ha cumplido con:</p> <p>La obtención del Dictámen de Prioridad otorgado por la Señora Rectora de la Institución. La obtención del Dictámen Favorable otorgado por la SENPLADES. Se obtiene la Certificación Presupuestaria emitida por la Dirección Financiera de la UNACH. Se realiza la Convocatoria 2014 para la postulación a Becas Cuarto nivel PhD. El H. Consejo Universitario aprueba a dos Docentes de la UNACH la licencia con la remuneración total de funciones de Docentes para que realicen estudio de PhD en el exterior. Se adjunta listado de Docentes beneficiados en el año 2013 con becas y ayudas económicas para cursar estudio de PhD. Se realiza los primeros desembolsos a dos docentes becados. El avance técnico del proyecto se cumple de acuerdo a lo programada.</p> <p>FEBRERO 2015 Los beneficiarios de las becas y ayudas económicas presentan justificativos de los recursos entregados para solicitar el siguiente desembolso. Se cuenta con la resolución de Comité de Becas para Convocatoria 2015 para la postulación a Becas Cuarto nivel PhD.</p> <p>ABRIL 2015 Se realiza la convocatoria a becas 2015 en medios impresos y digitales a los docentes titulares que postulan para cursar estudios de cuarto nivel.</p> <p>MAYO 2015 Se encuentra vigente la convocatoria a docentes de la UNACH, para que presente la postulación a becas y ayudas económicas. Se está recibiendo solicitudes y documentación de nuevos postulantes a becas y ayudas económicas. No se pueden realizar los pagos de las alícuotas respectivas de las becas y ayudas económicas a los docentes que tienen este beneficio, por cuanto se está realizando una reforma al reglamento de becas y ayudas económicas, mismo que aún no se aprueba.</p> <p>JUNIO 2015 Se encuentra en proceso de formulación las reformas al Reglamento de becas y ayudas económicas.</p> <p>JULIO 2015</p>	<p>Avendaño Herrera, Fernando Octavio</p>	<p>04/05/2016 - 04:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se encuentra en proceso de formulación las reformas al Reglamento de becas y ayudas económicas. Se definen las áreas prioritarias de estudio que al Universidad Nacional de Chimborazo financia para becas para estudios de postgrado.</p> <p>AGOSTO 2015 Se encuentra en proceso de formulación las reformas al Reglamento de becas y ayudas económicas, a presentarse para su aprobación definitiva en el H. Consejo Universitario en los próximos días. Se elabora el baremo para el otorgamiento de becas de estudio de posgrado para docentes de la UNACH.</p> <p>SEPTIEMBRE 2015 Aprobación del Reglamento para el otorgamiento de becas, licencias, comisiones de servicio y período sabático, destinados al perfeccionamiento docente del personal académico de la Universidad Nacional de Chimborazo el 17, 21 y 23 de septiembre del 2015. Convocatoria por el Comité de Becas y Ayudas Económicas para Becas para Estudios de cuarto nivel : Maestría, Doctorado PhD, mediante Resolución No. 010-CBYAE-30-09-2015.</p> <p>OCTUBRE 2015 Aprobación del PLAN DE FORMACIÓN DE POSGRADO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PRIORIZANDO LOS CAMPOS O ÁREAS DE ESTUDIO, aprobado mediante Resolución NO. 0221-HCU-02-10-2015. Pedido en función del nuevo Reglamento de Becas aprobado por el HCU, para la reforma presupuestaria para trasladar 80.000,00 USD del proyecto Becas Cuarto Nivel Maestría al proyecto Becas Cuarto Nivel PhD, mediante Of. No. 062-S-CBYAE-2015, del 21 de octubre del 2015. Recepción de documentación habilitante a los postulantes a Becas para estudios de cuarto nivel : Maestría, Doctorado PhD.</p> <p>NOVIEMBRE 2015 Revisión de documentación habilitante y calificación de postulantes a Becas para estudios de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD. Se dispone de la nomina de docentes titulares que califican para la obtención de Becas para estudios cuarto nivel Maestría, Doctorado PhD (2015).</p> <p>DICIEMBRE 2015 Adjudicación de 19 becas a docentes que cumplen con documentación habilitante.</p>		
<p>PERIODO 2013: Se encuentra aprobado el Reglamento e Instructivo para el otorgamiento de Becas para cursar estudios de PhD en el exterior y Año Sabático para los Docentes agregados a tiempo completo de la UNACH. Se cumple la promoción y la convocatoria 2013 para la adjudicación de becas. Se encuentra aprobada la reforma el Reglamento vigente para incluir Ayudas Económicas a Docentes para cursar estudios de PhD en el exterior. El avance técnico es del 99%. Se han beneficiado a 31 docentes con el financiamiento de las becas y ayudas económicas; para realizar estudios de PhD en países de Latinoamérica y Europa. Hasta la fecha se ha devengado el 100% del presupuesto del proyecto</p>	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	24/03/2014 - 03:57 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>Proyecto.2. Alcance. No aprobación de los estudios por parte de los becarios CAUSARIA el incumplimiento de las exigencias que tiene la UNACH con los organismos de control de Educación Superior</p>	10/04/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	10 %	70	7	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Reglamento de Becas, revisado, analizado por el H. Consejo Universitario y APROBADO.	3. Planeación	18/04/2012		18/04/2012		Sí	15.0
2	Convocatoria 2012 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA	4. Ejecución	30/04/2012		30/04/2012		Sí	10.0
3	Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2012 ENTREGADO	4. Ejecución	19/12/2012		19/12/2012		Sí	10.0
4	Convocatoria 2013 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA	4. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	10.0
5	Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2013 ENTREGADO	4. Ejecución	18/12/2013		18/12/2013		Sí	10.0
6	Convocatoria 2014 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA	4. Ejecución	30/04/2014		30/04/2014		Sí	10.0
7	Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2014 ENTREGADO	4. Ejecución	30/12/2014		30/12/2014		Sí	10.0
8	Convocatoria 2015 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA	4. Ejecución	30/04/2015		30/04/2015		Sí	5.0
9	Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2015 ENTREGADO	4. Ejecución	30/12/2015		30/12/2015		Sí	10.0
10	Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2016 ENTREGADO	4. Ejecución	30/12/2016	30/12/2016			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,502,874.72 **
Costo Total:	1,661,347.74
Total Devengado:	1,102,874.72
% Costo Total Devengado:	66.38 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 66.38 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,261,347.74	400,000.00	0.00	1,661,347.74
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Ppto. Codificado	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		400,000.00		
Ppto. Programado	1,261,347.74	400,000.00	0.00	1,661,347.74
Ppto. Devengado	1,102,874.72	0.00	0.00	1,102,874.72
Estimado a fin de año	* 1,102,874.72	0.00	0.00	1,102,874.72
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	158,473.02	400,000.00	0.00	558,473.02
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 87.44 %	0.00 %	0.00 %	66.38 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016

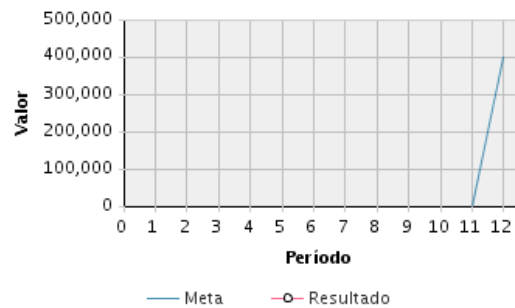

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	400,000.00		400,000.00				
Total	400,000.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		certificacion_financiera_becas_2014.pdf	12/06/2014
2		CONVOCATORIA_BECAS_2014.pdf	12/06/2014
3		DICTAMEN_BECAS_2014.pdf	12/06/2014
4		DICTAMEN_FAVORABLE_BECAS_2014.pdf	12/06/2014
5		POA_BECAS_2014.pdf	12/06/2014
6		NOMINA_DE_BECAADOS_2013.pdf	12/06/2014
7		RES_HCU_OTORGA_BECAS_2014.pdf	12/06/2014
8		Res_008-HCU-12-01-2015_noramtiva_becas_ayudas__economicas.pdf	30/04/2015
9		Convocatoria_becas_2015_032-cbyae-21-02-2015.PDF	30/04/2015
10		CONVOCATORIA_A_BECAS_y_AYUDAS_ECONOMICAS-2015.pdf	30/04/2015
11		cONVOCATORIA_WEB_2015.PDF	30/04/2015
12		Convocatoria_Becas_2015.PDF	30/11/2015
13		REGLAMENTO_PARA_EL_OTORGAMIENTO_DE_BECAS_30/11/2015	30/11/2015
14		Resolucion_221-HCU-Plan_de_Formacion_de_Posgrado_y_Areas__Prioritarias.PDF	30/11/2015
15		Matriz_becas_2015_postulaciones.xlsx	30/11/2015
16	AREAS DE ESTUDIO QUE LA UNACH FINANCIA PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO	areas_UNACH.docx	18/09/2015
17	BAREMO PARA OTORGAMIENTO DE BECAS A DOCENTES UNACH	Baremo_becas__2015_ultimo.xlsx	18/09/2015
18	Evidencia de comprobantes de pago de becas- año 2014	Becas_entregadas_2014.pdf	05/10/2014
19	FORMULACIÓN DE REGLAMENTO DE BECAS REFORMADO	REGLAMENTOS_DE_BECAS.doc	18/09/2015
20	GENERAL. matriz finaciera 2014 - 2015	Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx	01/06/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	Director del proyecto	Vicerrector de Postgrado e Investigación	lcepeda@unach.edu.ec	



UNACH
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación
Instituto de Investigaciones ICITS

PROYECTO: I035 Becas Cuarto Nivel - Maestrías e incentivos a producción intelectual

Líder del Proyecto:	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto (lcepeda@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barba Maggi, María Angélica	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91800000.0000.378313	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	310,000.00
Tipo de Ppto. Externo:	Recursos Propios	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2014 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	30/11/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Avendaño Herrera, Fernando Octavio	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2015

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL:

El mejoramiento académico de la UNACH está en función de la formación académica de los docentes y por tanto se requiere el otorgamiento de becas y ayudas económicas para que los docentes de la institución para que realicen estudios de Maestrías en el área en que ejercen la docencia. Así como la baja producción intelectual se debe a la carencia de incentivos que fomenten la actividad investigativa en los docentes de la UNACH.

PROPOSITO:

Desarrollar un sistema de becas y ayudas económicas que brinde apoyo con el financiamiento para la realización de estudios de Maestría en áreas afines al ejercicio docente, a los docentes titulares de la UNACH, para el incremento de sus capacidades y potencialidades académicas y técnicas, contribuyendo al cumplimiento de requerimientos de acreditación y recategorización institucional. Implementar un sistema de incentivos a la producción intelectual para fomentar la actividad investigativa en los docentes de la UNACH.

PRODUCTOS

Becas y ayudas económicas otorgadas por año a docentes agregados a tiempo completo de la UNACH para que cursen estudios de Maestría en el exterior.

Incentivos económicos entregados a docentes que tienen producción intelectual.

Beneficios Cualitativos

Considerando la necesidad que tiene conforme a la Ley de Educación Superior, la UNACH ha formulado el desarrollo de un sistema de becas y ayudas económicas; para lo cual inicialmente se prevee que se cuente con la reglamentación correspondiente que viabilice el financiamiento para otorgar el financiamiento a los docentes de la UNACH para que realicen estudios de Maestría en la carrera afín a su ejercicio docente.

Que se incremente la producción intelectual de la UNACH, mediante el reconocimiento económico a la producción intelectual de los docentes.

La UNACH cumpla con los indicadores establecidos por los organismos de control de Educación Superior para la acreditación institucional y para su recategorización.

Al término de la ejecución del proyecto se dispone de una nómina definitiva de al menos 36 docentes titulares de la UNACH que se benefician con las becas para estudios de Maestría.

La UNACH contará con una planta docente con alto nivel formativo que contribuye directamente al incremento del nivel académico.

Tipo de Beneficiario

La población de 102 docentes titulares que no tiene grado de Maestría, de los cuales el 78,4% son hombres y el 21,6% son mujeres-

Restricciones

TIEMPO: 3 años


COSTO: 900.000 USD

ALCANCE: Institucional dirigido a docentes titulares agregados y auxiliares.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 79.30 %
 Fecha de Inicio: 01/04/2014 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

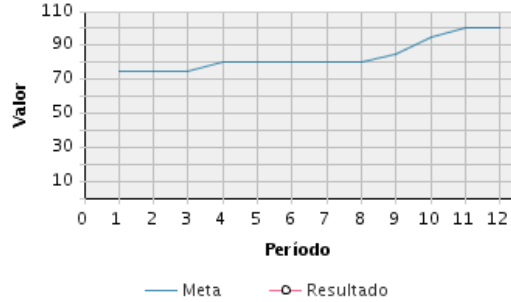

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	75 %	75 %	75 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %	95 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Las ayudas económicas o becas para cursar estudios de Maestría en Universidades de dentro o fuera del país, únicamente aquellos que son titulares, y que pertenezcan a cualquier categoría así como a cualquiera de los tiempos de dedicación, conforme a la reglamentación vigente. En consecuencia la población objetivo para obtener este beneficio corresponde específicamente a una población de 223 Docentes que laboran en la UNACH.</p> <p>Es importante que la Universidad impulse la investigación dotando de incentivos económicos a los Docentes que demuestran los productos de sus investigaciones como reconocimiento del esfuerzo desplegado.</p> <p>Inicialmente la proyección financiera del proyecto en 900.000,00 usd, distribuidos 300.000,00 usd anuales con período de duración de 3 años. Sin embargo el primer período (año 2014) se realiza una reforma presupuestaria del proyecto dejando un monto asignado de 100.000,00 usd. Para el año 2015 se disminuye el presupuesto general institucional y de asigna para este proyecto un monto de 80.000,00 usd.</p> <p>MARZO 2015 La Dirección Financiera comunica con fecha 31 de marzo del 2015 que el Ministerio de Finanzas habilitó el proyecto de inversión Becas Cuarto Nivel Maestrías, solicita realizar las formalidades técnicas para su ejecución. Se dispone la resolución No. 002-CBYAE-24-02-2015 de Comité de Becas para la Convocatoria 2015 para la Postulación a Becas Cuarto Nivel. Mediante resolución No. 0008-UCU-12-01-2015 aprueba la reforma al reglamento reformado para el otorgamiento de becas y ayudas económicas para estudios de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD, Posdoctorado y Concesión de periodo sabático para el personal académico de la UNACH.</p> <p>ABRIL 2015 Publicación en la web institucional de la convocatoria 2015 para becas y ayudas economicas para estudios de cuarto nivel.</p> <p>MAYO 2015 Se encuentra vigente la convocatoria para la postulación de docentes a becas y ayudas económicas. Se están recibiendo solicitudes y documentatción de docentes postulantes a beneficiarse de becas o ayudas económicas otorgadas por la UNACH. No se entrega las cuotas respectivas a los beneficiarios, debido que se está realizando una reforma al reglamento de becas y ayudas económicas, y aún no se encuentgra aprobado por las instancias competentes.</p>	Avendaño Herrera, Fernando Octavio	30/11/2015 - 11:02 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)


Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO Y JULIO 2015 Se está realizando la reforma al Reglamento de becas y ayudas económicas. Se han determinado las áreas de estudio que la UNACH financia para la realización de estudios de postgrado.</p> <p>AGOSTO 2015 Se está realizando la reforma al Reglamento de becas y ayudas económicas, para presentarse al H. Consejo Universitario para su aprobación. Se ha elaborado el baremo para el otorgamiento de becas para estudios de postgrado a docentes de la UNACH.</p> <p>SEPTIEMBRE 2015 Aprobado el Reglamento para el otorgamiento de becas, licencias, comisiones de servicio y periodo sabático, destinados al perfeccionamiento del personal académico de la UNACH, el 17, 21 y 23 de septiembre de 2105. Convocatoria para Becas de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD mediante Resolución No. 010-CBYAE-30-09-2015.</p> <p>OCTUBRE 2015 Aprobado el PLAN DE FORMACIÓN DE POSGRADO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PRIORIZANDO LOS CAMPOS O ÁREAS DE ESTUDIO, aprobado mediante Resolución NO. 0221-HCU-02-10-2015. Pedido en función del nuevo Reglamento aprobado, de reforma presupuestaria para traslado de 80.000,00 USD del proyecto de Becas cuarto nivel Maestrías al proyecto de Becas cuarto nivel PhD. Recepción y revisión de documentación habilitante de los postulantes a becas de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD.</p> <p>NOVIEMBRE 2015 Transferencia de fondos conforme a la reforma presupuestaria. Calificación de los beneficiarios a becas de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD. Nómina de beneficiarios de becas de cuarto nivel: Maestría, Doctorado PhD.</p>		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>Proyecto.1. General. Falta de interes por parte de los Docentes por tener formación de cuarto nivel en el área de docencia CAUSARIA incumplimiento de indicadores de acreditación de la UNACH</p>	11/05/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	50 %	80	40	0/0
<p>Falta de incentivos a la producción intelectual CAUSARIA baja producción científica de los docentes</p>	11/05/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	40 %	80	32	0/0
<p>Organizacional.1. Certificación CEAACES. No asignación oportuna de recursos económicos CAUSARIA no financiamiento de becas y ayudas económicas a Docentes</p>	11/05/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	10 %	90	9	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	El H.Consejo Universitario aprueba la reglamentación para el otorgamiento de becas	3. Planeación	30/08/2014		30/08/2014		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y ayudas económicas para estudios de Maestría para Docentes de la UNACH							
2	Se realiza primera convocatoria a Docentes Titulares de la UNACH para postulación a becas y ayudas económicas para estudios de Maestrias en áreas afines a su ejercicio docente	4. Ejecución	05/09/2014		05/09/2014		Sí	10.0
3	Recepción de documentación habilitante de los postulantes	4. Ejecución	30/09/2014		30/09/2014		Sí	10.0
4	Selección de postulantes para otorgamiento de becas y ayudas económicas	4. Ejecución	31/10/2014		31/10/2014		Sí	10.0
5	Otorgamiento de becas y ayudas económicas a postulantes seleccionados	4. Ejecución	30/12/2014		30/12/2014		Sí	10.0
6	Segunda convocatoria a Docentes Titulares de la UNACH para postulación a becas y ayudas económicas para estudios de Maestrias en áreas afines a su ejercicio docente	4. Ejecución	30/04/2015		30/04/2015		Sí	5.0
7	Recepción de documentación habilitante de los postulantes	4. Ejecución	30/09/2015	30/09/2015			No	5.0
8	Selección de postulantes para otorgamiento de becas y ayudas económicas	4. Ejecución	30/10/2015	30/10/2015			No	10.0
9	Otorgamiento de becas y ayudas económicas a postulantes seleccionados	4. Ejecución	30/12/2015	30/12/2015			No	10.0
10	Tercera convocatoria a Docentes Titulares de la UNACH para postulación a becas y ayudas económicas para estudios de Maestrias en áreas afines a su ejercicio docente	4. Ejecución	29/04/2016	29/04/2016			No	5.0
11	Recepción de documentación habilitante de los postulantes	4. Ejecución	30/09/2016	30/09/2016			No	5.0
12	Selección de postulantes para otorgamiento de becas y ayudas económicas	4. Ejecución	31/10/2016	31/10/2016			No	10.0
13	Otorgamiento de becas y ayudas económicas a postulantes seleccionados	4. Ejecución	30/11/2016	30/11/2016			No	5.0
14	Informe de cierre de proyecto	5. Cierre	30/12/2016	30/12/2016			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	310,000.00 **
Costo Total:	390,000.00
Total Devengado:	10,000.00
% Costo Total Devengado:	2.56 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 2.56 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	180,000.00	300,000.00	0.00	480,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		300,000.00		
Ppto. Programado	380,000.00	300,000.00	0.00	680,000.00
Ppto. Devengado	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Estimado a fin de año	* 10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	370,000.00	300,000.00	0.00	670,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 2.63 %	0.00 %	0.00 %	1.47 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016

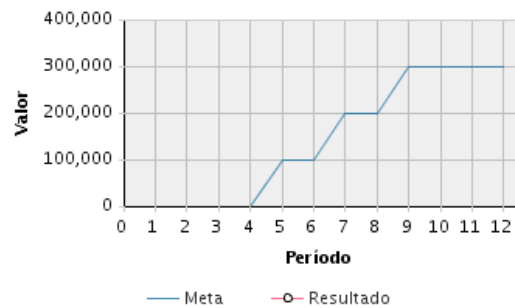

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	100,000.00		100,000.00				
Jun	0.00		100,000.00				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul	100,000.00		200,000.00				
Ago	0.00		200,000.00				
Sep	100,000.00		300,000.00				
Oct	0.00		300,000.00				
Nov	0.00		300,000.00				
Dic	0.00		300,000.00				
Total	300,000.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		BECAS_MAESTRIA-POA_2014-ok.xlsx	05/12/2014
2		Dictamen_Favorable.PDF	05/12/2014
3		Res_008-HCU-12-01-2015_noramtiva_becas_ayudas__economicas.pdf	30/04/2015
4		Convocatoria_becas_2015_032-cbyae-21-02-2015.PDF	30/04/2015
5		cONVOCATORIA_WEB_2015.PDF	30/04/2015
6		CONVOCATORIA_A_BECAS_y_AYUDAS_ECONOMICAS-2015.pdf	30/04/2015
7		Convocatoria_Becas_2015.PDF	30/11/2015
8		REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A DOCENTES DE COMISIONES DE	30/11/2015
9		Resolucion_221-HCU-Plan_de_Formacion_de_Posgrado_y_Areas__Prioritarias.PDF	30/11/2015
10		Matriz_becas_2015_postulaciones.xlsx	30/11/2015
11	AREAS DE ESTUDIO QUE FINANCIA LA UNACH PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO	areas_UNACH.docx	18/09/2015
12	BAREMO PARA OTORGAMIENTO DE BECAS A DOCENTES DE LA UNACH	Baremo_becas__2015_ultimo.xlsx	18/09/2015
13	Convocatoria becas y ayudas económica - Maestrías	convocatoriamaestria.pdf	05/10/2014
14	Convocatoria en la web insitucional a becas y ayudas económicas - Maestrías	CONVOCATORIA_EN_LA_WEB_INSTITUCIONAL.pdf	05/10/2014
15	FORMULACIÓN DE REGLAMENTO DE BECAS REFORMADO	REGLAMENTOS_DE_BECAS.doc	18/09/2015
16	GENERAL. matriz financiera 2014 - 2015	Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx	01/06/2015
17	Reglamento de becas y ayudas económicas para estudios de Maestría APROBADO	BECAS_MAESTRIA-2.doc	05/10/2014
18	SIPeIP 2014 - Becas y ayudas económicas - Maestrías	sip_maestria_2014_presupuesto.PDF	05/10/2014
19	Solicitud de beca para estudio de Maestría	1397-vpi-evidencia_maestrai_Arq_Paula.PDF	05/10/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Avendaño Herrera, Fernando Octavio	Analista de Proyectos	Analista de Investigación	ferevenh@yahoo.es	
Barahona Rivadeneira, Diego Javier	Director del proyecto	Director del Instituto de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes	dbarahona@unach.edu.ec	
