



Universidad Nacional de Chimborazo
Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación
Dirección de Investigación

PROYECTO: I012 Generación de saberes locales- sistema de gestión de conocimiento de la provincia

Table with project details including: Líder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, Objetivos Operativos, Viabilidad Técnica, Tipo de Ppto. Externo, Fecha de última actualización, Modificado por, Programas Relacionados, Prioridad, Retorno Económico, TIR, VAN, Estimado Al Fin Del Proyecto, Fecha de Inicio - Fecha de Fin, Fecha de Fin Base, Fecha del siguiente Hito.


DATOS GENERALES

Table with sections: Descripción (SITUACIÓN ACTUAL, PROPÓSITO, COMPONENTES), Beneficios Cualitativos, Tipo de Beneficiario, Restricciones (COSTO, TIEMPO, ALCANCE).

Progress bar showing phases: Fase Actual, Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución (highlighted), Cierre, Completado, Congelado, Cancelado.


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 02/05/2013 Fecha de Fin: 30/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

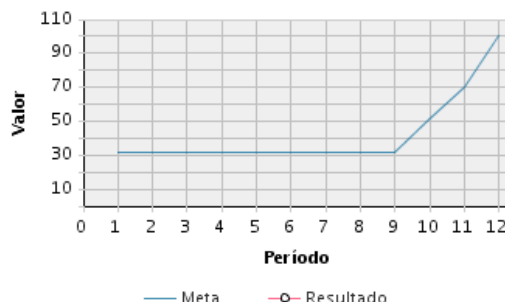

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %	52 %	70 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio 2016: Trabajo con dos estudiantes tesistas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación, para el desarrollo de los algoritmos de compresión de imágenes. En espera de la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas.</p>	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	28/09/2016 - 12:19 PM
<p>Junio 2016: Trabajo con dos estudiantes tesistas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación, para el desarrollo de los algoritmos de compresión de imágenes. En espera de la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas.</p>	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	28/09/2016 - 12:19 PM
<p>Mayo 2016: Trabajo con dos estudiantes tesistas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación, para el desarrollo de los algoritmos de compresión de imágenes. En espera de la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas.</p>	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	05/07/2016 - 09:18 AM
<p>Abril 2016: En espera de la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas.</p>	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	06/06/2016 - 03:36 PM
<p>Enero-Marzo 2016: Permiso por maternidad Elaboración, revisión y legalización de los instrumentos de planificación anual 2016 del proyecto</p>	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	06/06/2016 - 03:35 PM
<p>Diciembre 2015: Participación en el evento denominado "ARTE Y MEMORIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, LA TRATA DE PERSONAS, EL FEMICIDIO Y FOMENTANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE", el 10/12/2015 Diseño del video final del Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del patrimonio cultural" Obtención del Código ISBN para la realización de las memorias del congreso Reporte de Tesorería-UNACH de los pagos efectuados por los participantes al evento Solicitud de erogación de los sellos dorados para la realización de los certificados de participación del evento Seguimiento al contrato No. 133-P-UNACH-2015 (Empresa Faceti) Administradora del contrato Ing. Rosa Inca-CTE (drone, disco duro, memorias y tarjetas de drone) Se tiene conocimiento de forma verbal que por una omisión involuntaria de parte de Control de Bienes-UNACH, se ha omitido información la misma que coprometió la no adjudicación de la partida: Desarrollo-actualización-asistencia técnica y soporte de sistemas</p>	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	05/04/2016 - 04:17 PM
<p>Noviembre 2015: Autorización del AVAL ACADÉMICO para el I Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del patrimonio cultural" Resolución del Consejo Editorial y Propiedad Intelectual de la UNACH No. 75-C.E.P.I.-2015-11-18 Rueda de Prensa para oficializar el lanzamiento del evento 05/11/2015 Suscripción del Convenio UNACH-GADM RIOBAMBA 11/11/2015 Realización del I Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del patrimonio cultural" 25-27-11-2015 Seguimiento continuo a los requerimientos (Desarrollo del sistema web, Alimentos y bebidas, Edición, impresión, reproducción y publicaciones, Maquinarias y equipos, repuestos y accesorios) Proceso de Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos (SITIO WEB) observancia y seguimiento.</p>	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	22/12/2015 - 12:15 PM
<p>Octubre 2015: Organización, coordinación y ejecución del I Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del Patrimonio Cultural" Requerimiento para la contratación de Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos Entrega de términos de referencia para la contratación del Desarrollo del software.</p>	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	03/12/2015 - 12:18 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Solicitud de información (RGB Y BOTONES) para el desarrollo del sistema web. Aprobación a la reforma de los instrumentos de planificación anual 2015 del proyecto. Seguimiento continuo a los requerimientos ( Alimentos y bebidas, Edición, impresión, reproducción y publicaciones, Maquinarias y equipos, repuestos y accesorios)		
Septiembre 2015: Organización, coordinación y ejecución del I Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del Patrimonio Cultural" Reforma a los instrumentos de planificación anual (Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos) Informes de cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales (Salidas de Campo) Gestión para movilización y subsistencias para que el personal Docente del programa viaje a la ciudad de Quito 21/09/2015 CIESPAL-UNESCO	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	30/11/2015 - 04:36 PM
Agosto 2015: Seguimiento a los procesos de adquisiciones/Ing. René García Devolución del proceso No. 460-DPI (Consultoría aplicación web...) Solicitud de subsistencias para el personal del programa-salidas de campo Informe Primer Semestre SENPLADES reportado 12/08/2015	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	14/10/2015 - 08:49 AM
Julio 2015: Seguimiento a adquisiciones y respuesta a la solicitud del Ing. René García (Of. 1050, 1051-COBICOM-2015) Solicitud de contratación de consultoría solicitada Personal-solicitud de pago (factura) Contratos legalizados del personal contratado Informe I Semestre y evidencias presentado	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	02/09/2015 - 09:39 AM
Junio 2015: Reuniones de trabajo y búsqueda de alinzas institucionales: GADM Riobamba (Arq. Diego Villacís, Lic. Balvanera Cruz-representante,Lic. Pablo Narváez-representante) Participación en la reunión convocada por el Ing.Alberto Oleas-Director de Planificación UNACH el 02/06/2015 Justificación del uso técnico del equipo de cómputo I-MAG del programa Seguimiento de varios requerimientos (Ing. Rene García a cargo de las adquisiciones)	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	05/08/2015 - 04:53 PM
Mayo 2015: Resoluciones acerca del acceso al servidor del proyecto. Requerimiento de personal (2 profesionales técnicos) Requerimiento de maquinaria y equipos (Drone) Requerimiento de repuestos y accesorios (Batería y memoria de Dron) Suscripción de cartas de confidencialidad Comisión general del GADP Chimborazo autorizada. Autorización por parte de la máxima autoridad, resolución No. 013-R-PLAN-UNACH-2.015 Habilitación del proyecto por parte del Ministerio de Finanzas	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	02/07/2015 - 02:54 PM
Abril 2015: Autorización para asumir la dirección del proyecto Proyecto actualizado y modificado Instrumentos de planificación anual 2015 elaborados, aprobados y legalizados (POA, PAC, PPC, resumen de partidas y requerimiento de personal) Actualización de información técnica del proyecto en el sistema de SIPeIP Reuniones técnicas direccionadas por el Ing. Vicente Benítez.	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	05/06/2015 - 05:36 PM
diciembre: fueron instalados los equipos, El equipo técnico destinado al proyecto fue asignado a otras funciones en la institución	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:49 PM
noviembre: fueron cancelados los equipos	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:48 PM
octubre: El equipo técnico destinado al proyecto fue asignado a otras funciones en la institución	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:48 PM
mayo a septiembre: El equipo técnico destinado al proyecto fue asignado a otras funciones en la institución	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:47 PM
"Generación de Saberes Locales"es un programa de largo plazo para insertar a la Universidad en los procesos de gestión de conocimiento de la provincia de Chimborazo. Constituir a la	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:46 PM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Universidad en un centro especializado en la obtención, creación, organización, capitalización y difusión del conocimiento en el territorio.		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>Organizacional.9. Otros.</b> Daño en redes y sistemas informáticos de la UNACH CAUSARÍA la imposibilidad de poner en funcionamiento el sistema que se plantea realizar	08/05/2014	Ronny Santiago Echeverría Benalcazar	20 %	50	10	1/1
<b>Organizacional.4. Jurídico.</b> No se establece la normativa para el uso del Sistema de Gestión de Conocimiento CAUSARÍA dificultades en la incorporación del Sistema a la actividad académica e investigativas de la Institución	08/05/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	10 %	70	7	0/1
<b>Organizacional.9. Otros.</b> La UNACH no asume la operación del Sistema de Gestión del Conocimiento CAUSARÍA la imposibilidad de operar del proyecto	08/05/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	10 %	70	7	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Equipamiento IMPLEMENTADO	4. Ejecución	31/05/2014		31/05/2014		Sí	20.0
2	Instrumentos de planificación anual 2015 LEGALIZADOS	4. Ejecución	30/04/2015		30/04/2015		Sí	2.0
3	Maquinaria, equipo, respuestos y accesorios SOLICITADOS	4. Ejecución	21/05/2015		21/05/2015		Sí	2.0
4	Contratación de profesional técnico SOLICITADO	4. Ejecución	22/05/2015		22/05/2015		Sí	2.0
5	Consultoría para el desarrollo de un sistema web SOLICITADA	4. Ejecución	31/07/2015		31/07/2015		Sí	2.0
6	Reforma de los instrumentos de planificación anual 2015 APROBADOS	4. Ejecución	29/09/2015		29/09/2015		Sí	4.0
7	Base de datos del proyecto/ programa Generación de Saberes Locales CARGADA	4. Ejecución	28/10/2016	28/10/2016			No	20.0
8	Desarrollo de la aplicación WEB	4. Ejecución	30/11/2016	30/11/2016			No	18.0
9	Página web del sistema HABILITADA	5. Cierre	30/12/2016	30/12/2016			No	30.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de proyectos de investigación integrados al sistema de Gestión del Conocimiento	—	-	-	-	15/07/2015	-
2	Número de proyectos de investigación incorporados al sistema	—	-	-	-	01/01/2014	-


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	77,230.70 **
Costo Total:	138,553.92
Total Devengado:	77,230.70
% Costo Total Devengado:	55.74 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 55.74 %

### Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	83,668.92	0.00	0.00	83,668.92
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	83,668.92	0.00	0.00	83,668.92
Ppto. Codificado	71,811.80	0.00	0.00	71,811.80
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado	191,024.85	0.00	0.00	191,024.85
Ppto. Devengado	77,230.70	0.00	0.00	77,230.70
Estimado a fin de año	* 77,230.70	0.00	0.00	77,230.70
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	113,794.15	0.00	0.00	113,794.15
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 40.43 %	0.00 %	0.00 %	40.43 %

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

2	Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos.
4	Incrementar el rigor científico de los resultados del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional, la implementación del Reglamento de Movilidad Docente y la implementación del Reglamento para la Selección de Profesionales con Titulación PhD.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Abril 2015	Resumen_Ejecutivo.pdf	12/05/2015
2	Agosto 2015	Resumen_Ejecutivo.pdf	25/09/2015
3	Diciembre 2015	Resumen_Ejecutivo.docx	23/12/2015
4	General matriz financiera 2014 - 2015	Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx	01/06/2015
5	Hito 1.	Evidencias_de_equipamiento_.rar	06/06/2014
6	Hito 2.	Instrumentos_anuales_legalizados.pdf	05/06/2015
7	Hito 3.	Maquinaria_equipos_repuestos.pdf	05/06/2015
8	Hito 4.	Personal_contratado.pdf	05/06/2015
9	Hito 5.	Consultoría_solicitada.pdf	25/09/2015

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
10	Hito 6.	Reforma_Instrumentos_anuales.pdf	21/12/2015
11	instrumentos planificación 2016	POA.pdf	05/04/2016
12	instrumentos planificación 2016 PAC	PAC.pdf	05/04/2016
13	Julio 2015	Resumen_Ejecutivo.pdf	25/09/2015
14	Junio 2015	Resumen_ejecutivo.docx	06/07/2015
15	Mayo 2015	Resumen_Ejecutivo.pdf	05/06/2015
16	Noviembre 2015	Resumen_Ejecutivo.docx	21/12/2015
17	Octubre 2015	Resumen_Ejecutivo.pdf	21/12/2015
18	Página web sistema de gestión de conocimiento	PÁGINA_WEB_SISTEMA.pdf	20/11/2014
19	Septiembre 2015	Resumen_Ejecutivo.pdf	14/10/2015

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	Director del proyecto	Coordinadora del CID de Ingeniería	lespinoza@unach.edu.ec	
