



UNACH

Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación

Dirección de Investigación

PROYECTO: I033 Identificación y georeferenciación de las víctimas de trata de personas en la provincia de Chimborazo en el período comprendido entre los años 2011-junio 2013. Convocatoria 2013

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Veloz Avendaño, Ana del Rocío (anavelapci@hotmail.com aveloz@unach.edu.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto | Programas Relacionados: | Plan de Mejora UNACH |
| Titular: | Pomboza, Margarita | Prioridad: | 1 |
| Tipo de Proyecto: | Procesos | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 2 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 23,416.60 |
| Tipo de Ppto. Externo: | Recursos Propios, Recusos Externos | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/05/2014 - 30/12/2016 |
| Fecha de última actualización: | 28/10/2016 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2015 |
| Modificado por: | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | Fecha del siguiente Hito: | |

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACIÓN ACTUAL:

En la ciudad de Riobamba no existen datos georeferenciados y estadísticos de las víctimas del delito de Trata de Personas por cantones en la provincia de Chimborazo.

PROPÓSITO:

Identificar y georeferenciar a las víctimas de trata de personas en la Provincia de Chimborazo, en el periodo comprendido entre los años 2011- Junio 2013.

PRODUCTO:

Entrega de un Informe Final en medio físico y magnético con los resultados del estudio de víctimas de Trata de Personas en la provincia de Chimborazo al Consejo de Seguridad Ciudadana de la Provincia y demás instituciones involucradas en el tema de Trata de Personas.

Beneficios Cualitativos

Al tener espacialmente ubicadas a las víctimas de Trata de Personas en los cantones de la provincia de Chimborazo y al ser identificados los factores socioeconómicos se podrá aplicar fácilmente la política pública.

Tipo de Beneficiario

Grupo de personas Vulnerables: Niñ@s, Adolescentes, Mujeres y Hombres.

Restricciones

TIEMPO: 20 MESES

COSTO: 29.363,00


ALCANCE: Contar con una línea base de la información actualizada, georeferenciada y caracterizada de las víctimas de Trata de Personas, la misma que ayudará a generar y aplicar política pública focalizada a los sectores más vulnerables en esta problemática social.

Fase Actual:

- Anteproyecto
- Definición
- Planeación
- Ejecución
- Cierre
- Completado
- Congelado
- Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/05/2014 Fecha de Fin: 30/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

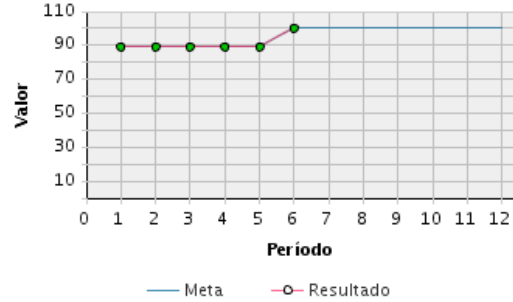

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2016 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 100 % | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| JUNIO 2016 Impresión del folleto del proyecto. Elaboración y entrega del informe de cierre del proyecto. Elaboración del Informe Técnico del proyecto con corte al mes de junio. | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 14/07/2016 - 04:21 PM |
| MAYO 2016 Revisión del folleto de Trata de Personas, para la debida impresión. Elaboración del informe técnico del proyecto con corte a mayo | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 14/06/2016 - 04:55 PM |
| ABRIL 2016 Edición, revisión e impresión del folleto de TDP. Revisión por parte del Ing. Miguel Alejandro Cruz Pérez, referente al diseño del folleto de TDP. Elaboración del informe técnico del proyecto. | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 06/06/2016 - 04:48 PM |
| MARZO 2016 Envío del documento para revisión, edición e impresión del folleto del Proyecto de TDP. | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 04/05/2016 - 04:24 PM |
| FEBRERO 2016 Elaboración y validación del informe final de los resultados del Proyecto de TDP | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 04/05/2016 - 04:23 PM |
| ENERO 2016 Elaboración y validación del informe final de los resultados del Proyecto de TDP. | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 04/05/2016 - 04:20 PM |
| DICIEMBRE: Se coordinó el evento "ARTE Y MEMORIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, LA TRATA DE PERSONAS, EL FEMICIDIO Y FOMENTANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE", por conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se solicitó prórroga de cuatro meses para la entrega de resultados del proyecto. Elaboración del informe técnico con corte al mes de diciembre. | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 07/01/2016 - 09:53 AM |
| NOVIEMBRE Aplicación de encuestas a familiares de tres víctimas de Trata de Personas. | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 14/12/2015 - 01:03 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <p>Entrevista al Sr. Marco Maquisaca, Alcalde del GADM. Cumandá. Sistematización y análisis de las encuestas realizadas. Elaboración, Reproducción y Transferencia el documento final del proyecto, esta actividad tuvo un avance del 10% quedando por ejecutar el 30%. Elaboración de informe técnico con corte al mes de noviembre Se realizó trámites administrativos.</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2015 Ubicación de los domicilios de las víctimas de TDP en los diferentes cantones de la provincia de Chimborazo, en el presente mes se avanzó el 5% con esta actividad quedando concluida esta actividad. Las evidencias consta en el ordenador No. 4 carpeta José Luis/trata de personas 2015/ carpeta 3 evidencias/componente 2. Identificación de la víctima del delito así como a un familiar cercano a la víctima, en el presente se avanzó el 5% con esta actividad quedando concluida esta actividad. Las evidencias consta en el ordenador No. 4 carpeta José Luis/trata de personas 2015/carpeta 3 evidencias/componente 2. Elaboración del documento final del proyecto. En el presente mes se avanzó el 20%, quedando pendiente el 40% por ejecutarse. Realización de trámites administrativos. Elaboración del informe técnico correspondiente al mes de octubre</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>12/11/2015 - 12:27 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2015 Ubicación de los domicilios de las víctimas de TDP en los diferentes cantones de la provincia de Chimborazo, en el presente se avanzó el 10% con esta actividad quedando pendiente por ejecutarse el 5%. Las evidencias consta en el ordenador No. 4 carpeta José Luis/trata de personas 2015/carpeta 3 evidencias/componente 2. Identificación de la víctima del delito así como a un familiar cercano a la víctima, en el presente se avanzó el 10% con esta actividad quedando pendiente por ejecutarse el 5%. Las evidencias consta en el ordenador No. 4 carpeta José Luis/trata de personas 2015/carpeta 3 evidencias/ componente 2. Elaboración del documento final del proyecto. En el presente mes se avanzó el 20% obteniendo hasta la fecha un avance del 40%. Realización de trámites administrativos. Elaboración del informe técnico correspondiente al mes de septiembre.</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>13/10/2015 - 11:48 AM</p> |
| <p>AGOSTO 2015 - Elaboración de oficios dirigidos a la Director/a de la Comisaría de Chambo, Director/a de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Guamote y Director/a de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Chambo. - Se realizó entrevistas a la Comisaria de Policía del cantón Chambo, Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Guamote y a la Coordinadora de la Zonal 3 de Turismo. En este mes estas actividades se cumplió con el 10%, acumulando hasta la presente fecha un avance total del 85%. Con lo que respecta a las evidencias de audios y entrevistas transcritas consta en el ordenador No. 4 Disco D/Jose Luis/Trata de Personas 2015/evidencias/Componente 2. - Participación en el Taller sobre Trata de Personas organizado por Visión Mundial. - Avance en la elaboración del documento final del Proyecto. - Elaboración del informe técnico con corte al mes de agosto de 2015.</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>08/09/2015 - 09:45 AM</p> |
| <p>JULIO 2015 Coordinación y dirección para establecer los circuitos y subcircuitos en los cuales se radican la mayor cantidad de víctimas de TP., esta actividad tiene un avance del 75%. Oficio enviado al Dr. José Luis Sancho, DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE RIOBAMBA. Oficio dirigido a la Ing. Sara Rojas Pérez, COORDINADORA PROVINCIAL DE MIGRACIÓN DE CHIMBORAZO Participación en la Feria "ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO"</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>05/08/2015 - 09:57 AM</p> |
| <p>JUNIO 2015 Realización de trámites administrativos. (Pedido de pagos del personal del proyecto y elaboración de oficios dirigidos a actores sociales involucrados en materia de TDP, solicitando entrevistas, con la finalidad de levantar diagnósticos en esta materia. Coordinación en el diseño, validación y aplicación de la ficha de entrevistas a autoridades. Coordinación y dirección en la sistematización y análisis de las entrevistas realizadas. Recepción de informes del personal</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>06/07/2015 - 11:38 AM</p> |
| <p>MAYO 2015 Coordinación y dirección para establecer los circuitos y subcircuitos en los cuales se radican la mayor cantidad de víctimas de TP.</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>08/06/2015 - 06:31 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|---|
| <p>Coordinación y dirección para diseñar, validar y aplicar encuestas con la finalidad de conocer si han sido víctimas de este tipo de delito. Información adquirida de las fiscalías, comisarias, UPC y otras instancias judiciales o administrativas de los cantones de la Provincia de Chimborazo. Entrevistas realizadas a los actores sociales de Chunchi, Alausí, Riobamba y Penipe</p> | | |
| <p>ABRIL 2015 Trámites administrativos, para contratación de personal. Ubicar los domicilios de las víctimas de trata de personas en los diferentes cantones de la provincia Identificar a la víctima del delito así como a un familiar cercano a la víctima</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>08/05/2015 - 06:33 PM</p> |
| <p>MARZO 2015 Elaboración y entrega del Informe Técnico de Avance con corte al mes de febrero. En este mes no se realizó actividades por falta de contratación de personal.</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>07/04/2015 - 11:38 AM</p> |
| <p>FEBRERO 2015 Entrega de los instrumentos de planificación POA-PAC y PPC, - Resumen de Partidas y Requerimientos de Personal. Control y evaluación de lo ejecutado en el año 2014</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>10/03/2015 - 09:28 AM</p> |
| <p>ENERO 2015 Ejecución de los instrumentos POA-PAC-PPC- PARTIDAS PRESUPUESTARIAS-PERSONAL</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>09/03/2015 - 09:58 AM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2014 Justificación del pasante Jonny Javier Pinduisaca Pinduisaca de la inasistencia del 1 de Diciembre del 2014 Entrega del informe mensual correspondiente a Noviembre 2014 de Mishel Mancheno Asistente administrativo Entrega de informes semanales de las pasantes María Azucena Aucancela Guacho, Sonia Margoth Padilla Buñay y Patricia Tenelanda. Oficio al Master Jorge Fernández Director de Planificación de la UNACH de la entrega del POA, PAC y PPC Y Resumen de partidas del año 2015 aprobadas para el proyecto TdP. Informe al Master Jorge Fernández Director de Planificación de la UNACH de las actividades del Segundo Semestre Julio-Diciembre 2014 del proyecto TdP. Oficio al Ing. Diego Barahona Director de ICITS sobre la evaluación del desempeño personal administrativo contratado dentro del proyecto TdP. Informe de cumplimiento de Tareas Oficiales o Servicios Institucionales correspondientes de las salidas a los cantones Colta y Guamote para el levantamiento de información de TdP Informe de cumplimiento de Tareas Oficiales o Servicios Institucionales correspondientes de las salidas a los cantones Pallatanga y Cumanda para el levantamiento de información de TdP Oficio al Fiscal Distrital del cantón Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Señor José Nugzhe Jefe Político del Cantón Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio a la Ing. Mishel Mancheno Administrativa social del proyecto TdP solicitando el traslado al cantón Cumanda el día viernes 5 de Diciembre del año 2014 para realizar trabajo de campo. Oficio al Doctor Carlos Romero Secretario Ejecutivo del Concejo de Protección de derechos del Cantón Colta solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP al Fiscal Distrital del cantón Guamote solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio a la Ing. Carmita Hernández Comisaria Nacional de Policía de Guamote solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Señor Luis Ángel Chuquimarca Alcalde del GADM de Guamote solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Fiscal Distrital del cantón Colta solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Abogado Julián Yépez Comisario Nacional de Policía de Colta solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al señor Jefe Político del cantón Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al señor Comisario Nacional de Policía de Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Fiscal Distrital del cantón Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Ingeniero Carlos Coloma Director del Departamento de Talento Humano para poner en conocimiento que el pasante Alex Cepeda procederá a registrar su asistencia de 08h00 a 14h00 desde el 2 de diciembre del 2014</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>09/03/2015 - 09:25 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <p>Oficio al Señor Robinson Velastegui Alcalde del GADM de Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Abogado Segundo Criollo Comisario Nacional de Policía de Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Señor Manuel Vargas Alcalde del GADM de Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el di</p> | | |
| <p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Acta de entrega recepción de equipos para el proyecto TdP Oficio al Ing. Carlos Coloma Director del Departamento de Talento Humano para comunicar el cambio de horario de trabajo dl pasante Alex Cepeda Balla. Acta entrega de materiales y equipos a la Ing. Mishel Mancheno, Lcda. Sonia Padilla, Lcda. Patricia Tenelanda, María Azucena Aucancela para los talleres de Trata de personas que se realizaran en la provincia de Chimborazo. Gestión a los señores fiscales distritales, jefatura política,comisarias,GADM municipales, delegaciones provinciales de trabajo, gobernador de la provincia, comandante de policia ,fiscales, coordinaciones zonales del ministerio de turismo,intendencia,defensoria del pueblo,MIESS correspondientes a los diez cantones de la provincia de Chimborazo. Entrega de Manual de Metodologias de TdP,cronograma de las entrevistas a los actores sociales e informes correspondientes a los talleres realizados en el Centro de Salud no.1 Riobamba por parte de la Ing.Mishel Mancheno a la Doctora.Ana Veloz . Gestión a la Doctora Nelly Recalde, Directora del Centro de Salud No. 1 Riobamba con el fin de levantar información a través de encuestas dirigidas a las trabajadoras sexuales. Respuesta al oficio No. 139-CSCCH-2014 de la Ing. Mónica Galán, Gestora de Seguridad Ciudadana sobre el proceso de investigación del proyecto "Identificación y Georeferenciación de las víctimas de Trata de Personas en la provincia de Chimborazo en el periodo comprendido entre los años 2011-2013". Gestión al Ing. Napoleón Cadena Alcalde del GADM Riobamba para coordinar talleres sobe trata de personas. Solicitud a la Lcda. Sonia Padilla solicitando el traslado al cantón Chunchi y Alausí para el lunes 24 y martes 25 del mes de Noviembre para realizar trabajo de campo. Solicitud a la Lcda. Sonia Padilla solicitando el traslado al cantón Cumanda y Pallatanga para el jueves 13 y viernes 14 del mes de Noviembre para realizar trabajo de campo. Oficio al doctor Fabián Guerrero Jefe de Control e Bienes y Compras Públicas-UNACH con la información necesaria para la contratación de un consultor para el desarrollo del software. Talleres y encuestas dirigidas a las trabajadoras sexuales en el Auditorio del Centro de Salud No.1 Riobamba los días jueves 6,jueves 13 y viernes 14 de Noviembre del 2014 Solicitud de viáticos y subsistencias para el cumplimiento de las actividades del proyecto TdP referente al levantamiento de información en los cantones de Colta, Guamote, Pallatanga, Alausi, Chunchi. Informes de actividades realizadas en el Auditorio del Centro de Salud No.1 Riobamba con las trabajadoras sexuales. Recibimiento de material difusivo e informático acerca de la Trata de Personas por parte del Ministerio del Interior y la Gobernación de Chimborazo. Participación en la Campaña contra la Trata de Personas por parte del Ministerio del Interior el día 29 de Noviembre del 2014 en el Parque Maldonado a las 10h30 con material difusivo y presentación de títeres sobre la temática involucrada. Informe del levantamiento total de todos los locales controlados por el Ministerio del Interior en la ciudad de Riobamba.</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>02/12/2014 - 04:30 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2014</p> <p>Gestión a la Gobernación de Chimborazo para levantar información con los actores locales de cada cantón. Gestión a la Coordinadora Zonal de Salud para levantamiento de información a las trabajadoras sexuales. Gestión al Ministerio del Interior ,Doctor Jose Serrano para levantamiento de la información en la Unidad de Trata de Personas -Dirección Nacional de la DINAPEN Gestion para la autorizacion de un vehiculo del Ministerio del Interior para recoleccion de la informacion de TdP Recolección de información en la Fiscalía de Riobamba Planificación y organización para realizar talleres de Trata de Personas Gestión para recabar información en las dependencias del Ministerio del Interior de Chimborazo y Directora de Salud e la provincia.</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>02/12/2014 - 04:06 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2014</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>22/10/2014 - 08:37 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <p>Solicitud para el pago y conocimiento de la renuncia de la Ing.Cecilia Mendoza por servicios profesionales.Contratación de la Ing.Mishel Mancheno Dávila - Administrativa social del proyecto. Contratos de pasantes (Luis Vera, Hector Cepeda, Jonny Pinduisaca) Entrega de materiales de oficina. (5 resmas de papel bond, 125 lápices, 130 tableros, 125 borradores, 125 esferos, 150 sobres de manila, 100 fundas plásticas y 7 chalecos)26/09/2014 Coordinación para trabajo de campo Informe Cuatrimestral presentado Solicitud para la contratación de un software Gestión para recabar información en las dependencias del Ministerio del Interior de Chimborazo y Directora de Salud de la provincia</p> | | |
| <p>JUNIO 2014</p> <p>Conocimiento de la Cédula Presupuestaria del proyecto aprobada por el Ministerio de Finanzas Requerimiento para la adquisición de maquinaria y equipo (4GPS) Requerimiento para la adquisición de vestuario, lencería y prendas de vestir (8 chalecos) Requerimiento para la adquisición de materiales de oficina (10 resmas de papel, 1 tóner Samsung 4835, 100 esferos, 260 tableros, 300 sobres de manila A4, 250 borradores de goma blanco, 100 fundas plasticas para documentos, 250 lapices HB) Contratación de la Ingeniera Cecilia Mendoza -Administrativa social- Informe de cumplimiento de actividades del proyecto Elaboración del formulario para la presentación de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico Gestión, creación e implementación de aplicaciones en el NODO SENPLADES Recopilación de ponentes del 1er Congreso Internacional " Generación de políticas públicas para eliminar la violencia de género y la trata de personas" Presentación del proyecto en formato SENPLADES conforme a la disposición de las autoridades</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>02/10/2014 - 06:19 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2014</p> <p>Gestión para recabar información en la Unidad de Trata de Personas-DINAPEN de Chimborazo y Quito, Jefe de la Policía Judicial de Chimborazo y Ministerio del Interior Quito. C1. A2 Información de todas las instancias judiciales y administrativas recabadas, casificadas y ordenadas. Entrega de un equipo de cómputo. POA, PAC y PPC 2014 legalizados. Contrato firmado y legalizado del Administrativo Social y pasantes Entrega del informe del segundo cuatrimestre.</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>01/10/2014 - 08:37 AM</p> |
| <p>JULIO 2014</p> <p>Participación en un taller "Atención Psicosocial a Personas Víctimas de Trata de Personas Elaboración y legalización de PAC y PPC 2015 (TDP). PAC está elaborado falta legalizar. Proceso de contratación de cuatro pasantes Seguimiento trámite de adquisición de Materiales y Equipos de Oficina. Equipos de computo . Máquinas y Equipos de acuerdo al POA- PAC y PPC del año fiscal 2014. Control interno y evaluación de los indicadores de gestión de los proyectos de TDP. Actualización de datos en la matriz SIPEIP.</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>05/08/2014 - 09:51 AM</p> |
| <p>JUNIO 2014:</p> <p>Solicitud de contratación Administrativo Social/Ayudante Administrativo Solicitud de Máquinas y Equipos (4 GPS); Vestuario, lencería y prendas de vestir (8 Chalecos); y, Materiales de Oficina (Resmas de papel, Tonner, Esferos, Tableros porta papeles, Porta credenciales, Sobres de manila, Borradores, Fundas plásticas y Lápices). Metodologías diseñadas para el taller de trata de personas Cédula Presupuestaria VIF otorgada. Actualización de información en el SIPEiP Proyecto presentado en el nuevo formato SENPLADES.</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>31/07/2014 - 01:37 PM</p> |
| <p>MAYO 2014:</p> <p>C1.A2 Gestión para recabar información sobre TdP: MIES, FGE-Quito, Ministerio del Interior- Quito, Gobernación de Ch. Estudio y diseño de metodologías para talleres planificados a nivel local, parroquial y provincial en la temática de TdP. Recurso Humano contratado Administrativo Social/Ayudante Administrativo. POA, PAC y PPC aprobados.</p> | <p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p> | <p>09/07/2014 - 03:09 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Estudio y diseño de metodologías para talleres a nivel local, parroquial y provincial en la temática de VIF. Campos para Plantillas sistema NODO SENPLADES. | | |
| ABRIL 2014: Participación y capacitación taller "Socialización del protocolo nacional unificado para la protección y asistencia integral a personas víctimas de trata de personas". | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 10/06/2014 - 02:48 PM |
| ENERO-MARZO 2014: Gestión y autorización para levantar información de denuncias de delitos de Trata de Personas en entidades del ministerio del Interior, Fiscalía y Organizaciones legalmente constituidas de la Provincia de Chimborazo. | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 10/04/2014 - 04:29 PM |
| JUNIO-DICIEMBRE 2013: En la Convocatoria ICITS 2013 se postuló este estudio, superando exitosamente la evaluación externa realizada por la SENESCYT al obtener uno de los primeros lugares. Plan estratégico de la RIDECH-Eje Trata de Personas. | Veloz Avendaño, Ana del Rocío | 10/04/2014 - 04:28 PM |

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| Proyecto.2. Alcance. No contar con la información de víctimas de Trata de Personas que reposa en las las instancias de la Fiscalía de la P.CH. CAUSARIA la falta de información de todas las denuncias de este delito | 13/05/2014 | Ana del Rocío Veloz Avendaño | 30 % | 80 | 24 | 0/0 |
| Proyecto.2. Alcance. Falta de colaboración de las víctimas o un familiar cercano CAUSARÍA la falta de información de este delito | 13/05/2014 | Ana del Rocío Veloz Avendaño | 40 % | 30 | 12 | 0/0 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|---------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | Recurso Humano-Administrativo Social/Ayudante Administrativo CONTRATADO | 4. Ejecución | 02/05/2014 | | 02/05/2014 | | Sí | 2.0 |
| 2 | POA, PAC y PPC 2014 APROBADOS | 3. Planeación | 12/05/2014 | | 12/05/2014 | | Sí | 2.0 |
| 3 | Ministerio de Finanzas-Cédula Presupuestaria APROBADA | 4. Ejecución | 20/06/2014 | | 20/06/2014 | | Sí | 2.0 |
| 4 | C.1.A.1.Fichas de vaciado de información ELABORADAS Y VALIDADAS. | 4. Ejecución | 24/06/2014 | | 24/06/2014 | | Sí | 1.0 |
| 5 | Recurso Humano-Pasantes CONTRATADOS | 4. Ejecución | 05/08/2014 | | 05/08/2014 | | Sí | 4.0 |
| 6 | Informe I Cuatrimestral PRESENTADO | 4. Ejecución | 05/09/2014 | | 05/09/2014 | | Sí | 3.0 |
| 7 | C.1.A.2. Información en todas las instancias judiciales y administrativas 50% RECABADAS, CLASIFICADAS y ORDENADAS. | 4. Ejecución | 03/10/2014 | | 03/10/2014 | | Sí | 11.0 |
| 8 | C.1.A.2. Información en todas las instancias judiciales | 4. Ejecución | 28/11/2014 | | 28/11/2014 | | Sí | 11.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | y administrativas 50% RECABADAS, CLASIFICADAS y ORDENADAS. | | | | | | | |
| 9 | Informe I Semestral PRESENTADO | 4. Ejecución | 29/12/2014 | | 29/12/2014 |  | Sí | 3.0 |
| 10 | C.2.A.1. Mapeo de las víctimas de Trata de personas en la provincia de Chimborazo REALIZADO. | 4. Ejecución | 31/12/2014 | | 31/12/2014 |  | Sí | 5.0 |
| 11 | C.2.A.2. C.2.A.3 Domicilios y víctimas de trata de personas en los diferentes cantones de la provincia UBICADAS e IDENTIFICADAS. | 4. Ejecución | 10/11/2015 | | 10/11/2015 |  | Sí | 10.0 |
| 12 | C3.A1. Encuestas DISEÑADAS, VALIDADAS y APLICADAS. | 4. Ejecución | 10/11/2015 | | 10/11/2015 |  | Sí | 15.0 |
| 13 | C3.A2. Encuestas SISTEMATIZADAS y ANALIZADAS | 4. Ejecución | 30/11/2015 | | 30/11/2015 |  | Sí | 20.0 |
| 14 | C4. A1. Documento final del proyecto ELABORADO y REPRODUCIDO. | 4. Ejecución | 30/06/2016 | | 30/06/2016 |  | Sí | 7.0 |
| 15 | C4.A2. Información a instituciones involucradas TRANSFERIDAS. | 5. Cierre | 30/06/2016 | | 30/06/2016 |  | Sí | 4.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 23,416.60 ** |
| Costo Total: | 29,363.00 |
| Total Devengado: | 23,416.60 |
| % Costo Total Devengado: | 79.75 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 79.75 %

Perfil Económico 2016

| | Años Previos | Año Actual (2016) | Años Futuros | Total |
|--|--------------|-------------------|--------------|-----------|
| Ppto. Planeado | 84,672.80 | 0.00 | 0.00 | 84,672.80 |
| Ppto. Externo Planeado | 51,095.28 | 0.00 | 0.00 | 51,095.28 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| Ppto. Codificado | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2016) | | 0.00 | | |
| Ppto. Programado | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| Ppto. Devengado | 23,416.60 | 0.00 | 0.00 | 23,416.60 |
| Estimado a fin de año | * 23,416.60 | 0.00 | 0.00 | 23,416.60 |
| Variación Proyectada (Programado - Estimado) | 6,583.40 | 0.00 | 0.00 | 6,583.40 |
| % de Ppto. Programado vs. Devengado | * 78.06 % | 0.00 % | 0.00 % | 78.06 % |

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Feb | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Mar | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Abr | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| May | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 0.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2016 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Jul | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Total | 0.00 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 2 | Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos. |
| 4 | Incrementar el rigor científico de los resultados del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional, la implementación del Reglamento de Movilidad Docente y la implementación del Reglamento para la Selección de Profesionales con Titulación PhD. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | ANEXO INFORME TÉCNICO DE AVANCE P.T.P. 2015 CON CORTE A FEBRERO | AVANCE_2015-_TRATA_DE_PERSONAS.xlsx | 09/03/2015 |
| 2 | ANEXO: EVIDENCIAS ENTREGA DE INFORME TÉCNICO CON CORTE AL MES DE FEBRERO | EVIDENCIAS_DE_ENTREGA_DEL_INFORME_TÉCNICO.docx | 09/03/2015 |
| 3 | ANEXO: INFORME TÉCNICO CON CORTE A ABRIL | Informe_Técnico_con_corte_a_Abril.docx | 11/05/2015 |
| 4 | ANEXO: INFORME TÉCNICO CON CORTE A JUNIO | Informe_Técnico_TDP.PDF | 14/07/2016 |
| 5 | ANEXO: INFORME TÉCNICO MAYO 2016 | Informe_Técnico_TDP_Mayo_2016.PDF | 10/06/2016 |
| 6 | APLICACIÓN DE ENCUESTAS | evidencias_entrevistas.pdf | 15/12/2015 |
| 7 | AVANCE FOLLETO | Informe_encuesta_(1).pdf | 11/11/2015 |
| 8 | AVANCE FOLLETO | Informe_encuesta.pdf | 11/11/2015 |
| 9 | AVANCE FOLLETO PRELIMINAR | AVANCE_DEL_FOLLETO_(1).pdf | 15/12/2015 |
| 10 | AVANCE INFORME TÉCNICO JULIO 2015 | Informe_técnico_julio.docx | 03/08/2015 |
| 11 | C.4. OFICIO AUTORIZACIÓN IMPRESIÓN FOLLETO | Oficio_autorización_para_impresión_folleto.PDF | 14/07/2016 |
| 12 | C.4: FOLLETO DEFINITIVO TDP | VICTIMAS_TRATA_DE_PERSONAS.pdf | 14/07/2016 |
| 13 | CARTOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO (POR CANTONES TDP.) | Cartografía_SHP_de_víctimas_de_TDP..pdf | 30/07/2015 |
| 14 | CARTOGRAFÍA FORMATO ESRI (SHP) de las víctimas de TDP | TDP.rar | 05/06/2015 |
| 15 | DENUNCIAS OBTENIDAS DE LA FISCALIA DE TDP. 2011-2013 | fichas_trata.pdf | 08/06/2015 |
| 16 | DIFERENTES TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVO.PDF | 08/06/2015 |
| 17 | ENTREVISTA COORDINADORA DE LA POLÍTICA | ENTREVISTA_A_LA_COOR._POL._MUJ.CH.docx | 03/07/2015 |
| 18 | ENTREVISTA DINAPEN | INFORME_ENTREVISTA.docx | 03/07/2015 |
| 19 | ENTREVISTA FUNDACIÓN NOSOTRAS | INFORME_ENTREVISTA.docx | 03/07/2015 |
| 20 | ENTREVISTA FUNDESICH | INFORME_ENTREVISTA.docx | 03/07/2015 |
| 21 | ENTREVISTA FUNJUSTICIA | INFORME_ENTREVISTA.docx | 03/07/2015 |
| 22 | ENTREVISTAS REALIZADAS | tecnico.PDF | 08/06/2015 |
| 23 | EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS | AFICHE_DERECHOS_HUMANOS.pdf | 07/01/2016 |
| 24 | EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS | AGENDA_DÍA_DE_LOS_DERECHOS_HUMANOS.pdf | 07/01/2016 |
| 25 | EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS | INFORME_EVENTO_ARTE_Y_MEMORIA.pdf | 07/01/2016 |
| 26 | EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS | RegistroEntregaRegriferios1.PDF | 07/01/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 27 | EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS | RegistroEntregaTableros1.PDF | 07/01/2016 |
| 28 | Evidencias Diciembre 2014 TdP | Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_color_1.PDF | 30/12/2014 |
| 29 | Evidencias Diciembre 2014 TdP | Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_color_1.PDF | 30/12/2014 |
| 30 | Evidencias Junio 2014 | EVIDENCIAS.PDF | 02/10/2014 |
| 31 | EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2014 | evidencias_UPR_Noviembre_2014.PDF | 02/12/2014 |
| 32 | Evidencias Octubre 2014 | Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_blanco_y_negro_10.PDF | 07/12/2014 |
| 33 | FOTO ENTREVISTA | Entrevista_Chambo.docx | 04/09/2015 |
| 34 | FOTO ENTREVISTA- | GUÍA_DE_ENTREVISTA_(Ministerio_Turismo).docx | 04/09/2015 |
| 35 | FOTO ENTREVISTA. | ENTREVISTA_Guamote.docx | 04/09/2015 |
| 36 | FOTOS EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2014 | FOTOS_EVIDENCIAS.docx | 02/12/2014 |
| 37 | FOTOS PARTICIPACION TALLER AGOSTO 2015 | TALLER_CINE_FOROTDP.rar | 04/09/2015 |
| 38 | FOTOS UBICACIÓN DE DOMICILIOS E IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS O A UN FAMILIAR CERCANO | FOTOS SOBRE UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DOMICILIOS (FOTOS).rar | 04/09/2015 |
| 39 | GENERAL. matriz financiera 2014 - 2015 | Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx | 01/06/2015 |
| 40 | HITO 11, 12 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 2015 | Trámites_administrativos.docx | 08/05/2015 |
| 41 | HITO 14 DOCUMENTO PRELIMINAR | FOLLETO-TRATA-DE-PERSONAS-OBSERVATORIO-OSCUNACH..pdf | 04/09/2015 |
| 42 | HITO 14 FOLLETO TDP PRELIMINAR | TRATA-DE-PERSONAS-_FOLLETO.pdf | 14/10/2015 |
| 43 | HITO 1: Recurso Humano-Administrativo Social. | RECURSO_HUMANO_TRATA_DE_PERSONAS_GPR..docx | 10/06/2014 |
| 44 | HITO 2: POA, PAC y PPC 2014 | POA_PAC_y_PPC_2014.PDF | 10/06/2014 |
| 45 | HITO 3: Cédula Presupuestaria | TdP..docx | 23/06/2014 |
| 46 | HITO 4: Aprobada y Validada | Ficha.pdf | 15/07/2014 |
| 47 | HITO 5: Recurso Humano contratado | Cuatro_Pasantes.pdf | 05/10/2014 |
| 48 | Hito 6: Informe Cuatrimestral | Informe_Cuatrimstral.pdf | 05/10/2014 |
| 49 | HITO 7: Información recabada/ Se dispone de toda la información de VTdP desagregada M.I-Quito | Información_recabada.pdf | 05/10/2014 |
| 50 | INFORME DEL PERSONAL DEL PROYECTO | Informe_de_actividades_del_personal_del_proyecto.docx | 03/07/2015 |
| 51 | INFORME ENTREVISTAS | INFORME_ENTREVISTAS.docx | 30/07/2015 |
| 52 | INFORME TERMINACIÓN DE FUNCIONES | Informe_terminación_de_funciones.docx | 10/03/2015 |
| 53 | INFORME TÉCNICO CON CORTE A AGOSTO 2015 | Informe_técnico_Agosto.docx | 08/09/2015 |
| 54 | INFORME TÉCNICO CON CORTE A DICIEMBRE 2015 | Informe_Técnico_diciembre_TDP.pdf | 07/01/2016 |
| 55 | INFORME TÉCNICO CON CORTE A JUNIO 2015 | Informe_técnico_junio.docx | 03/07/2015 |
| 56 | INFORME TÉCNICO CON CORTE A NOVIEMBRE 2015 | INFORME_TECNICO_CON_CORTE_NOVIEMBRE.pdf | 15/12/2015 |
| 57 | INFORME TÉCNICO CON CORTE A OCTUBRE 2015 | INFORME_TÉCNICO_OCTUBRE.docx | 12/11/2015 |
| 58 | INFORME TÉCNICO CON CORTE A SEPTIEMBRE 2015 | INFORME_TÉCNICO_SEPTIEMBRE.docx | 14/10/2015 |
| 59 | INFORME TÉCNICO DE AVANCE P.T.P. 2015 CON CORTE A MAYO | Informe_Técnico_con_corte_a_Mayo.docx | 08/06/2015 |
| 60 | INFORME_CIERRE_PROYECTO | Informe_Cierre_Proyecto_TDP.PDF | 14/07/2016 |
| 61 | INFORME_CIERRE_PROYECTO | Of_Entrega_Inform_Cierre_Proyecto_VIF.PDF | 14/07/2016 |
| 62 | MAPEO DE VICTIMAS DE T.P | BASE_DE_TRATA_DE_PERSONAS_2012_01_VALIDADA_(05/06/2015 Geografica).xlsx | 05/06/2015 |
| 63 | OFICIO ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 2015 | ENTREGA_DE_POA-PAC-PPC_P.T.P.docx | 09/03/2015 |
| 64 | OFICIOS ENVIADOS AGOSTO 2015 | Oficios_TDP-_Agosto.docx | 04/09/2015 |
| 65 | OFICIOS ENVIADOS SEPTIEMBRE | oficios_enviados.PDF | 15/10/2015 |
| 66 | OFICIOS RECIBIDOS SEPTIEMBRE | oficios_recibidos.PDF | 15/10/2015 |
| 67 | OFICIOS SOLICITANDO ENTREVISTAS | Oficios_solicitando_entrevistas_a_actores_sociales.docx | 03/07/2015 |
| 68 | PARTICIPACION EN FERIA ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO | EVIDENCIAS_FERIA_ABRAMOS_LOS_OJOS_LA_TRATA ES UN DELITO.rar | 03/07/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 69 | POA, PAC, PPC, RESUMEN DE PARTIDAS REFORMADOS JULIO 2015 | INSTRUMENTOS_DE_PLANIF._REFORMADO_TDP.docx | 28/10/2015 |
| 70 | POA-PAC-PPC 2015 | POAPACPPC_2015_P.T.P_ESCANEADOxls.docx | 09/03/2015 |
| 71 | PRÓRROGA_TDP | RESOLUCIÓN_PRORROGA.PDF | 22/07/2016 |
| 72 | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN | Oficio_dirigido_a_la_Coordinadora_de_Migración_de_Chimborazo | 30/07/2015 |
| 73 | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN | Oficio_dirigido_al_Director_del_Centro_de_Rehabilitación_Rico | 30/07/2015 |
| 74 | REFORMA INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | SOLICITUD_DE_REFORMA_DEL_PROYECTO_TDP.docx | 30/07/2015 |
| 75 | Resumen Ejecutivo Abril 2014. | ABRIL_2014.docx | 29/05/2014 |
| 76 | Resumen Ejecutivo Agosto 2014 | Resumen_Ejecutivo_Agosto.pdf | 05/10/2014 |
| 77 | Resumen Ejecutivo Enero-Marzo 2014. | ENERO-MARZO_2014..PDF | 19/05/2014 |
| 78 | Resumen Ejecutivo Julio 2014 | RESUMEN_EJECUTIVO_JULIO_2014.PDF | 05/08/2014 |
| 79 | Resumen Ejecutivo Junio 2014 | Junio_2014.docx | 15/07/2014 |
| 80 | Resumen Ejecutivo Junio-Diciembre 2013 | TdP..JPG | 19/05/2014 |
| 81 | Resumen Ejecutivo Mayo 2014 | MAYO_2014.PDF | 10/06/2014 |
| 82 | Resumen Ejecutivo Septiembre 2014 | Resumen_Ejecutivo_Septiembre.pdf | 05/10/2014 |
| 83 | SOLICITUD PRÓRROGA | Socilitud_prórroga.pdf | 07/01/2016 |
| 84 | Taller "Atención Psicosocial a víctimas de Tdp" | ATENCIÓN_SICOSOCIAL_A_PERSONAS_VÍCTIMAS_TDP. | 05/08/2014 |
| 85 | TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 2015 | Oficio_TDP_enviados_noviembre.PDF | 15/12/2015 |
| 86 | TRÁMITES ADMINISTRATIVOS OCTUBRE 2015 | OFICIO.PDF | 11/11/2015 |
| 87 | Trámites para la solicitud de pago al personal | Oficios_solicitud_de_pago.pdf | 03/07/2015 |
| 88 | UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS DE TDP. | Caso_1_TDP_(Guamote).PDF | 11/11/2015 |
| 89 | UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS DE TDP. | Caso_2_TDP_(Guamote).PDF | 11/11/2015 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------|
| Veloz Avendaño, Ana del Rocío | Directora del proyecto | Directora del Proyecto | anavelapci@hotmail.com aveloz@unach.edu.ec | |
