



**UNACH**

**Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación**

**Dirección de Investigación**

**PROYECTO: I033** Identificación y georeferenciación de las víctimas de trata de personas en la provincia de Chimborazo en el período comprendido entre los años 2011-junio 2013. Convocatoria 2013

Líder del Proyecto:	Veloz Avendaño, Ana del Rocío (anavelapci@hotmail.com aveloz@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:	Pomboza, Margarita	Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,416.60
Tipo de Ppto. Externo:	Recursos Propios, Recusos Externos	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/05/2014 - 30/12/2016
Fecha de última actualización:	28/10/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**SITUACIÓN ACTUAL:**

En la ciudad de Riobamba no existen datos georeferenciados y estadísticos de las víctimas del delito de Trata de Personas por cantones en la provincia de Chimborazo.

**PROPÓSITO:**

Identificar y georeferenciar a las víctimas de trata de personas en la Provincia de Chimborazo, en el periodo comprendido entre los años 2011- Junio 2013.

**PRODUCTO:**

Entrega de un Informe Final en medio físico y magnético con los resultados del estudio de víctimas de Trata de Personas en la provincia de Chimborazo al Consejo de Seguridad Ciudadana de la Provincia y demás instituciones involucradas en el tema de Trata de Personas.

**Beneficios Cualitativos**

Al tener espacialmente ubicadas a las víctimas de Trata de Personas en los cantones de la provincia de Chimborazo y al ser identificados los factores socioeconómicos se podrá aplicar fácilmente la política pública.

**Tipo de Beneficiario**

Grupo de personas Vulnerables: Niñ@s, Adolescentes, Mujeres y Hombres.

**Restricciones**

TIEMPO: 20 MESES


COSTO: 29.363,00

ALCANCE: Contar con una línea base de la información actualizada, georeferenciada y caracterizada de las víctimas de Trata de Personas, la misma que ayudará a generar y aplicar política pública focalizada a los sectores más vulnerables en esta problemática social.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	<b>Cierre</b>	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/05/2014 Fecha de Fin: 30/12/2016

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

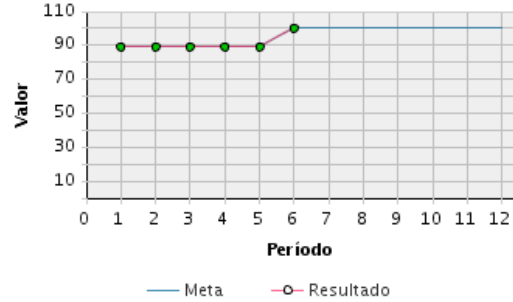

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %	100 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>JUNIO 2016</b> Impresión del folleto del proyecto. Elaboración y entrega del informe de cierre del proyecto. Elaboración del Informe Técnico del proyecto con corte al mes de junio.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	14/07/2016 - 04:21 PM
<b>MAYO 2016</b> Revisión del folleto de Trata de Personas, para la debida impresión. Elaboración del informe técnico del proyecto con corte a mayo	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	14/06/2016 - 04:55 PM
<b>ABRIL 2016</b> Edición, revisión e impresión del folleto de TDP. Revisión por parte del Ing. Miguel Alejandro Cruz Pérez, referente al diseño del folleto de TDP. Elaboración del informe técnico del proyecto.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	06/06/2016 - 04:48 PM
<b>MARZO 2016</b> Envío del documento para revisión, edición e impresión del folleto del Proyecto de TDP.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/05/2016 - 04:24 PM
<b>FEBRERO 2016</b> Elaboración y validación del informe final de los resultados del Proyecto de TDP	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/05/2016 - 04:23 PM
<b>ENERO 2016</b> Elaboración y validación del informe final de los resultados del Proyecto de TDP.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/05/2016 - 04:20 PM
<b>DICIEMBRE:</b> Se coordinó el evento "ARTE Y MEMORIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, LA TRATA DE PERSONAS, EL FEMICIDIO Y FOMENTANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE", por conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se solicitó prórroga de cuatro meses para la entrega de resultados del proyecto. Elaboración del informe técnico con corte al mes de diciembre.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	07/01/2016 - 09:53 AM
<b>NOVIEMBRE</b> Aplicación de encuestas a familiares de tres víctimas de Trata de Personas.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	14/12/2015 - 01:03 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Entrevista al Sr. Marco Maquisaca, Alcalde del GADM. Cumandá. Sistematización y análisis de las encuestas realizadas. Elaboración, Reproducción y Transferencia el documento final del proyecto, esta actividad tuvo un avance del 10% quedando por ejecutar el 30%. Elaboración de informe técnico con corte al mes de noviembre Se realizó trámites administrativos.</p>		
<p><b>OCTUBRE 2015</b> Ubicación de los domicilios de las víctimas de TDP en los diferentes cantones de la provincia de Chimborazo, en el presente mes se avanzó el 5% con esta actividad quedando concluida esta actividad. Las evidencias consta en el ordenador No. 4 carpeta José Luis/trata de personas 2015/ carpeta 3 evidencias/componente 2. Identificación de la víctima del delito así como a un familiar cercano a la víctima, en el presente se avanzó el 5% con esta actividad quedando concluida esta actividad. Las evidencias consta en el ordenador No. 4 carpeta José Luis/trata de personas 2015/carpeta 3 evidencias/componente 2. Elaboración del documento final del proyecto. En el presente mes se avanzó el 20%, quedando pendiente el 40% por ejecutarse. Realización de trámites administrativos. Elaboración del informe técnico correspondiente al mes de octubre</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>12/11/2015 - 12:27 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2015</b> Ubicación de los domicilios de las víctimas de TDP en los diferentes cantones de la provincia de Chimborazo, en el presente se avanzó el 10% con esta actividad quedando pendiente por ejecutarse el 5%. Las evidencias consta en el ordenador No. 4 carpeta José Luis/trata de personas 2015/carpeta 3 evidencias/componente 2. Identificación de la víctima del delito así como a un familiar cercano a la víctima, en el presente se avanzó el 10% con esta actividad quedando pendiente por ejecutarse el 5%. Las evidencias consta en el ordenador No. 4 carpeta José Luis/trata de personas 2015/carpeta 3 evidencias/ componente 2. Elaboración del documento final del proyecto. En el presente mes se avanzó el 20% obteniendo hasta la fecha un avance del 40%. Realización de trámites administrativos. Elaboración del informe técnico correspondiente al mes de septiembre.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>13/10/2015 - 11:48 AM</p>
<p><b>AGOSTO 2015</b> - Elaboración de oficios dirigidos a la Director/a de la Comisaría de Chambo, Director/a de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Guamote y Director/a de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Chambo. - Se realizó entrevistas a la Comisaria de Policía del cantón Chambo, Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Guamote y a la Coordinadora de la Zonal 3 de Turismo. En este mes estas actividades se cumplió con el 10%, acumulando hasta la presente fecha un avance total del 85%. Con lo que respecta a las evidencias de audios y entrevistas transcritas consta en el ordenador No. 4 Disco D/Jose Luis/Trata de Personas 2015/evidencias/Componente 2. - Participación en el Taller sobre Trata de Personas organizado por Visión Mundial. - Avance en la elaboración del documento final del Proyecto. - Elaboración del informe técnico con corte al mes de agosto de 2015.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>08/09/2015 - 09:45 AM</p>
<p><b>JULIO 2015</b> Coordinación y dirección para establecer los circuitos y subcircuitos en los cuales se radican la mayor cantidad de víctimas de TP., esta actividad tiene un avance del 75%. Oficio enviado al Dr. José Luis Sancho, DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE RIOBAMBA. Oficio dirigido a la Ing. Sara Rojas Pérez, COORDINADORA PROVINCIAL DE MIGRACIÓN DE CHIMBORAZO Participación en la Feria "ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO"</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>05/08/2015 - 09:57 AM</p>
<p><b>JUNIO 2015</b> Realización de trámites administrativos. (Pedido de pagos del personal del proyecto y elaboración de oficios dirigidos a actores sociales involucrados en materia de TDP, solicitando entrevistas, con la finalidad de levantar diagnósticos en esta materia. Coordinación en el diseño, validación y aplicación de la ficha de entrevistas a autoridades. Coordinación y dirección en la sistematización y análisis de las entrevistas realizadas. Recepción de informes del personal</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>06/07/2015 - 11:38 AM</p>
<p><b>MAYO 2015</b> Coordinación y dirección para establecer los circuitos y subcircuitos en los cuales se radican la mayor cantidad de víctimas de TP.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>08/06/2015 - 06:31 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Coordinación y dirección para diseñar, validar y aplicar encuestas con la finalidad de conocer si han sido víctimas de este tipo de delito.                      Información adquirida de las fiscalías, comisarias, UPC y otras instancias judiciales o administrativas de los cantones de la Provincia de Chimborazo.                      Entrevistas realizadas a los actores sociales de Chunchi, Alausí, Riobamba y Penipe</p>		
<p>ABRIL 2015                      Trámites administrativos, para contratación de personal.                      Ubicar los domicilios de las víctimas de trata de personas en los diferentes cantones de la provincia                      Identificar a la víctima del delito así como a un familiar cercano a la víctima</p>	<p>Veloz Avendaño,                      Ana del Rocío</p>	<p>08/05/2015 -                      06:33 PM</p>
<p>MARZO 2015                      Elaboración y entrega del Informe Técnico de Avance con corte al mes de febrero.                      En este mes no se realizó actividades por falta de contratación de personal.</p>	<p>Veloz Avendaño,                      Ana del Rocío</p>	<p>07/04/2015 -                      11:38 AM</p>
<p>FEBRERO 2015                      Entrega de los instrumentos de planificación POA-PAC y PPC, - Resumen de Partidas y Requerimientos de Personal.                      Control y evaluación de lo ejecutado en el año 2014</p>	<p>Veloz Avendaño,                      Ana del Rocío</p>	<p>10/03/2015 -                      09:28 AM</p>
<p>ENERO 2015                      Ejecución de los instrumentos POA-PAC-PPC- PARTIDAS PRESUPUESTARIAS-PERSONAL</p>	<p>Veloz Avendaño,                      Ana del Rocío</p>	<p>09/03/2015 -                      09:58 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2014                      Justificación del pasante Jonny Javier Pinduisaca Pinduisaca de la inasistencia del 1 de Diciembre del 2014                      Entrega del informe mensual correspondiente a Noviembre 2014 de Mishel Mancheno Asistente administrativo                      Entrega de informes semanales de las pasantes María Azucena Aucancela Guacho, Sonia Margoth Padilla Buñay y Patricia Tenelanda.                      Oficio al Master Jorge Fernández Director de Planificación de la UNACH de la entrega del POA, PAC y PPC Y Resumen de partidas del año 2015 aprobadas para el proyecto TdP.                      Informe al Master Jorge Fernández Director de Planificación de la UNACH de las actividades del Segundo Semestre Julio-Diciembre 2014 del proyecto TdP.                      Oficio al Ing. Diego Barahona Director de ICITS sobre la evaluación del desempeño personal administrativo contratado dentro del proyecto TdP.                      Informe de cumplimiento de Tareas Oficiales o Servicios Institucionales correspondientes de las salidas a los cantones Colta y Guamote para el levantamiento de información de TdP                      Informe de cumplimiento de Tareas Oficiales o Servicios Institucionales correspondientes de las salidas a los cantones Pallatanga y Cumanda para el levantamiento de información de TdP                      Oficio al Fiscal Distrital del cantón Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio al Señor José Nugzhe Jefe Político del Cantón Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio a la Ing. Mishel Mancheno Administrativa social del proyecto TdP solicitando el traslado al cantón Cumanda el día viernes 5 de Diciembre del año 2014 para realizar trabajo de campo.                      Oficio al Doctor Carlos Romero Secretario Ejecutivo del Concejo de Protección de derechos del Cantón Colta solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP al Fiscal Distrital del cantón Guamote solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio a la Ing. Carmita Hernández Comisaria Nacional de Policía de Guamote solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio al Señor Luis Ángel Chuquimarca Alcalde del GADM de Guamote solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio al Fiscal Distrital del cantón Colta solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio al Abogado Julián Yépez Comisario Nacional de Policía de Colta solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio al señor Jefe Político del cantón Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio al señor Comisario Nacional de Policía de Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio al Fiscal Distrital del cantón Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio al Ingeniero Carlos Coloma Director del Departamento de Talento Humano para poner en conocimiento que el pasante Alex Cepeda procederá a registrar su asistencia de 08h00 a 14h00 desde el 2 de diciembre del 2014</p>	<p>Veloz Avendaño,                      Ana del Rocío</p>	<p>09/03/2015 -                      09:25 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Oficio al Señor Robinson Velastegui Alcalde del GADM de Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio al Abogado Segundo Criollo Comisario Nacional de Policía de Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.                      Oficio al Señor Manuel Vargas Alcalde del GADM de Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el di</p>		
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Acta de entrega recepción de equipos para el proyecto TdP                      Oficio al Ing. Carlos Coloma Director del Departamento de Talento Humano para comunicar el cambio de horario de trabajo dl pasante Alex Cepeda Balla.                      Acta entrega de materiales y equipos a la Ing. Mishel Mancheno, Lcda. Sonia Padilla, Lcda. Patricia Tenelanda, María Azucena Aucancela para los talleres de Trata de personas que se realizaran en la provincia de Chimborazo.                      Gestión a los señores fiscales distritales, jefatura política,comisarias,GADM municipales, delegaciones provinciales de trabajo, gobernador de la provincia, comandante de policía ,fiscales, coordinaciones zonales del ministerio de turismo,intendencia,defensoria del pueblo,MIESS correspondientes a los diez cantones de la provincia de Chimborazo.                      Entrega de Manual de Metodologías de TdP,cronograma de las entrevistas a los actores sociales e informes correspondientes a los talleres realizados en el Centro de Salud no.1 Riobamba por parte de la Ing.Mishel Mancheno a la Doctora.Ana Veloz .                      Gestión a la Doctora Nelly Recalde, Directora del Centro de Salud No. 1 Riobamba con el fin de levantar información a través de encuestas dirigidas a las trabajadoras sexuales.                      Respuesta al oficio No. 139-CSCCH-2014 de la Ing. Mónica Galán, Gestora de Seguridad Ciudadana sobre el proceso de investigación del proyecto "Identificación y Georeferenciación de las víctimas de Trata de Personas en la provincia de Chimborazo en el periodo comprendido entre los años 2011-2013".                      Gestión al Ing. Napoleón Cadena Alcalde del GADM Riobamba para coordinar talleres sobe trata de personas.                      Solicitud a la Lcda. Sonia Padilla solicitando el traslado al cantón Chunchi y Alausí para el lunes 24 y martes 25 del mes de Noviembre para realizar trabajo de campo.                      Solicitud a la Lcda. Sonia Padilla solicitando el traslado al cantón Cumanda y Pallatanga para el jueves 13 y viernes 14 del mes de Noviembre para realizar trabajo de campo.                      Oficio al doctor Fabián Guerrero Jefe de Control e Bienes y Compras Públicas-UNACH con la información necesaria para la contratación de un consultor para el desarrollo del software.                      Talleres y encuestas dirigidas a las trabajadoras sexuales en el Auditorio del Centro de Salud No.1 Riobamba los días jueves 6,jueves 13 y viernes 14 de Noviembre del 2014                      Solicitud de viáticos y subsistencias para el cumplimiento de las actividades del proyecto TdP referente al levantamiento de información en los cantones de Colta, Guamote, Pallatanga, Alausi, Chunchi.                      Informes de actividades realizadas en el Auditorio del Centro de Salud No.1 Riobamba con las trabajadoras sexuales.                      Recibimiento de material difusivo e informático acerca de la Trata de Personas por parte del Ministerio del Interior y la Gobernación de Chimborazo.                      Participación en la Campaña contra la Trata de Personas por parte del Ministerio del Interior el día 29 de Noviembre del 2014 en el Parque Maldonado a las 10h30 con material difusivo y presentación de títeres sobre la temática involucrada.                      Informe del levantamiento total de todos los locales controlados por el Ministerio del Interior en la ciudad de Riobamba.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>02/12/2014 - 04:30 PM</p>
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Gestión a la Gobernación de Chimborazo para levantar información con los actores locales de cada cantón.                      Gestión a la Coordinadora Zonal de Salud para levantamiento de información a las trabajadoras sexuales.                      Gestión al Ministerio del Interior ,Doctor Jose Serrano para levantamiento de la información en la Unidad de Trata de Personas -Dirección Nacional de la DINAPEN                      Gestion para la autorizacion de un vehiculo del Ministerio del Interior para recoleccion de la informacion de TdP                      Recolección de información en la Fiscalía de Riobamba                      Planificación y organización para realizar talleres de Trata de Personas                      Gestión para recabar información en las dependencias del Ministerio del Interior de Chimborazo y Directora de Salud e la provincia.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>02/12/2014 - 04:06 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>22/10/2014 - 08:37 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Solicitud para el pago y conocimiento de la renuncia de la Ing.Cecilia Mendoza por servicios profesionales.Contratación de la Ing.Mishel Mancheno Dávila - Administrativa social del proyecto. Contratos de pasantes (Luis Vera, Hector Cepeda, Jonny Pinduisaca) Entrega de materiales de oficina. (5 resmas de papel bond, 125 lápices, 130 tableros, 125 borradores, 125 esferos, 150 sobres de manila, 100 fundas plásticas y 7 chalecos)26/09/2014 Coordinación para trabajo de campo Informe Cuatrimestral presentado Solicitud para la contratación de un software Gestión para recabar información en las dependencias del Ministerio del Interior de Chimborazo y Directora de Salud de la provincia</p>		
<p>JUNIO 2014</p> <p>Conocimiento de la Cédula Presupuestaria del proyecto aprobada por el Ministerio de Finanzas Requerimiento para la adquisición de maquinaria y equipo (4GPS) Requerimiento para la adquisición de vestuario, lencería y prendas de vestir (8 chalecos) Requerimiento para la adquisición de materiales de oficina ( 10 resmas de papel,1 tóner Samsung 4835, 100 esferos, 260 tableros, 300 sobres de manila A4, 250 borradores de goma blanco, 100 fundas plasticas para documentos, 250 lapices HB) Contratación de la Ingeniera Cecilia Mendoza -Administrativa social- Informe de cumplimiento de actividades del proyecto Elaboración del formulario para la presentación de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico Gestión, creación e implementación de aplicaciones en el NODO SENPLADES Recopilación de ponentes del 1er Congreso Internacional " Generación de políticas públicas para eliminar la violencia de género y la trata de personas" Presentación del proyecto en formato SENPLADES conforme a la disposición de las autoridades</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>02/10/2014 - 06:19 PM</p>
<p>AGOSTO 2014</p> <p>Gestión para recabar información en la Unidad de Trata de Personas-DINAPEN de Chimborazo y Quito, Jefe de la Policía Judicial de Chimborazo y Ministerio del Interior Quito. C1. A2 Información de todas las instancias judiciales y administrativas recabadas, casificadas y ordenadas. Entrega de un equipo de cómputo. POA, PAC y PPC 2014 legalizados. Contrato firmado y legalizado del Administrativo Social y pasantes Entrega del informe del segundo cuatrimestre.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>01/10/2014 - 08:37 AM</p>
<p>JULIO2014</p> <p>Participación en un taller "Atención Psicosocial a Personas Víctimas de Trata de Personas Elaboración y legalización de PAC y PPC 2015 (TDP). PAC está elaborado falta legalizar. Proceso de contratación de cuatro pasantes Seguimiento trámite de adquisición de Materiales y Equipos de Oficina. Equipos de computo . Máquinas y Equipos de acuerdo al POA- PAC y PPC del año fiscal 2014. Control interno y evaluación de los indicadores de gestión de los proyectos de TDP. Actualización de datos en la matriz SIPEIP.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>05/08/2014 - 09:51 AM</p>
<p>JUNIO 2014:</p> <p>Solicitud de contratación Administrativo Social/Ayudante Administrativo Solicitud de Máquinas y Equipos ( 4 GPS); Vestuario, lencería y prendas de vestir (8 Chalecos); y, Materiales de Oficina (Resmas de papel, Tonner, Esferos, Tableros porta papeles, Porta credenciales, Sobres de manila, Borradores, Fundas plásticas y Lápices). Metodologías diseñadas para el taller de trata de personas Cédula Presupuestaria VIF otorgada. Actualización de información en el SIPEiP Proyecto presentado en el nuevo formato SENPLADES.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>31/07/2014 - 01:37 PM</p>
<p>MAYO 2014:</p> <p>C1.A2 Gestión para recabar información sobre TdP: MIES, FGE-Quito, Ministerio del Interior- Quito, Gobernación de Ch. Estudio y diseño de metodologías para talleres planificados a nivel local, parroquial y provincial en la temática de TdP. Recurso Humano contratado Administrativo Social/Ayudante Administrativo. POA, PAC y PPC aprobados.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>09/07/2014 - 03:09 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Estudio y diseño de metodologías para talleres a nivel local, parroquial y provincial en la temática de VIF. Campos para Plantillas sistema NODO SENPLADES.		
ABRIL 2014: Participación y capacitación taller "Socialización del protocolo nacional unificado para la protección y asistencia integral a personas víctimas de trata de personas".	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/06/2014 - 02:48 PM
ENERO-MARZO 2014: Gestión y autorización para levantar información de denuncias de delitos de Trata de Personas en entidades del ministerio del Interior, Fiscalía y Organizaciones legalmente constituidas de la Provincia de Chimborazo.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/04/2014 - 04:29 PM
JUNIO-DICIEMBRE 2013: En la Convocatoria ICITS 2013 se postuló este estudio, superando exitosamente la evaluación externa realizada por la SENESCYT al obtener uno de los primeros lugares. Plan estratégico de la RIDECH-Eje Trata de Personas.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/04/2014 - 04:28 PM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>Proyecto.2. Alcance.</b> No contar con la información de víctimas de Trata de Personas que reposa en las las instancias de la Fiscalía de la P.CH. CAUSARIA la falta de información de todas las denuncias de este delito	13/05/2014	Ana del Rocío Veloz Avendaño	30 %	80	24	0/0
<b>Proyecto.2. Alcance.</b> Falta de colaboración de las víctimas o un familiar cercano CAUSARÍA la falta de información de este delito	13/05/2014	Ana del Rocío Veloz Avendaño	40 %	30	12	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Recurso Humano-Administrativo Social/Ayudante Administrativo CONTRATADO	4. Ejecución	02/05/2014		02/05/2014		Sí	2.0
2	POA, PAC y PPC 2014 APROBADOS	3. Planeación	12/05/2014		12/05/2014		Sí	2.0
3	Ministerio de Finanzas-Cédula Presupuestaria APROBADA	4. Ejecución	20/06/2014		20/06/2014		Sí	2.0
4	C.1.A.1.Fichas de vaciado de información ELABORADAS Y VALIDADAS.	4. Ejecución	24/06/2014		24/06/2014		Sí	1.0
5	Recurso Humano-Pasantes CONTRATADOS	4. Ejecución	05/08/2014		05/08/2014		Sí	4.0
6	Informe I Cuatrimestral PRESENTADO	4. Ejecución	05/09/2014		05/09/2014		Sí	3.0
7	C.1.A.2. Información en todas las instancias judiciales y administrativas 50% RECABADAS, CLASIFICADAS y ORDENADAS.	4. Ejecución	03/10/2014		03/10/2014		Sí	11.0
8	C.1.A.2. Información en todas las instancias judiciales	4. Ejecución	28/11/2014		28/11/2014		Sí	11.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y administrativas 50% RECABADAS, CLASIFICADAS y ORDENADAS.							
9	Informe I Semestral PRESENTADO	4. Ejecución	29/12/2014		29/12/2014		Sí	3.0
10	C.2.A.1. Mapeo de las víctimas de Trata de personas en la provincia de Chimborazo REALIZADO.	4. Ejecución	31/12/2014		31/12/2014		Sí	5.0
11	C.2.A.2. C.2.A.3 Domicilios y víctimas de trata de personas en los diferentes cantones de la provincia UBICADAS e IDENTIFICADAS.	4. Ejecución	10/11/2015		10/11/2015		Sí	10.0
12	C3.A1. Encuestas DISEÑADAS, VALIDADAS y APLICADAS.	4. Ejecución	10/11/2015		10/11/2015		Sí	15.0
13	C3.A2. Encuestas SISTEMATIZADAS y ANALIZADAS	4. Ejecución	30/11/2015		30/11/2015		Sí	20.0
14	C4. A1. Documento final del proyecto ELABORADO y REPRODUCIDO.	4. Ejecución	30/06/2016		30/06/2016		Sí	7.0
15	C4.A2. Información a instituciones involucradas TRANSFERIDAS.	5. Cierre	30/06/2016		30/06/2016		Sí	4.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						




**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,416.60 **
Costo Total:	29,363.00
Total Devengado:	23,416.60
% Costo Total Devengado:	79.75 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 79.75 %

**Perfil Económico 2016**

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	84,672.80	0.00	0.00	84,672.80
Ppto. Externo Planeado	51,095.28	0.00	0.00	51,095.28
Ppto. Aprobado Inicial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Ppto. Codificado	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Ppto. Devengado	23,416.60	0.00	0.00	23,416.60
Estimado a fin de año	* 23,416.60	0.00	0.00	23,416.60
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	6,583.40	0.00	0.00	6,583.40
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 78.06 %	0.00 %	0.00 %	78.06 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016**



**Presupuesto Mensual 2016**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos.
4	Incrementar el rigor científico de los resultados del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional, la implementación del Reglamento de Movilidad Docente y la implementación del Reglamento para la Selección de Profesionales con Titulación PhD.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ANEXO INFORME TÉCNICO DE AVANCE P.T.P. 2015 CON CORTE A FEBRERO	AVANCE_2015-_TRATA_DE_PERSONAS.xlsx	09/03/2015
2	ANEXO: EVIDENCIAS ENTREGA DE INFORME TÉCNICO CON CORTE AL MES DE FEBRERO	EVIDENCIAS_DE_ENTREGA_DEL_INFORME_TÉCNICO.docx	09/03/2015
3	ANEXO: INFORME TÉCNICO CON CORTE A ABRIL	Informe_Técnico_con_corte_a_Abril.docx	11/05/2015
4	ANEXO: INFORME TÉCNICO CON CORTE A JUNIO	Informe_Técnico_TDP.PDF	14/07/2016
5	ANEXO:INFORME TÉCNICO MAYO 2016	Informe_Técnico_TDP_Mayo_2016.PDF	10/06/2016
6	APLICACIÓN DE ENCUESTAS	evidencias_entrevistas.pdf	15/12/2015
7	AVANCE FOLLETO	Informe_encuesta_(1).pdf	11/11/2015
8	AVANCE FOLLETO	Informe_encuesta.pdf	11/11/2015
9	AVANCE FOLLETO PRELIMINAR	AVANCE_DEL_FOLLETO_(1).pdf	15/12/2015
10	AVANCE INFORME TÉCNICO JULIO 2015	Informe_técnico_julio.docx	03/08/2015
11	C.4. OFICIO AUTORIZACIÓN IMPRESIÓN FOLLETO	Oficio_autorización_para_impresión_folleto.PDF	14/07/2016
12	C.4: FOLLETO DEFINITIVO TDP	VICTIMAS_TRATA_DE_PERSONAS.pdf	14/07/2016
13	CARTOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO (POR CANTONES TDP.)	Cartografía_SHP_de_víctimas_de_TDP..pdf	30/07/2015
14	CARTOGRAFÍA FORMATO ESRI (SHP) de las víctimas de TDP	TDP.rar	05/06/2015
15	DENUNCIAS OBTENIDAS DE LA FISCALIA DE TDP. 2011-2013	fichas_trata.pdf	08/06/2015
16	DIFERENTES TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	ADMINISTRATIVO.PDF	08/06/2015
17	ENTREVISTA COORDINADORA DE LA POLÍTICA	ENTREVISTA_A_LA_COOR._POL._MUJ.CH.docx	03/07/2015
18	ENTREVISTA DINAPEN	INFORME_ENTREVISTA.docx	03/07/2015
19	ENTREVISTA FUNDACIÓN NOSOTRAS	INFORME_ENTREVISTA.docx	03/07/2015
20	ENTREVISTA FUNDESICH	INFORME_ENTREVISTA.docx	03/07/2015
21	ENTREVISTA FUNJUSTICIA	INFORME_ENTREVISTA.docx	03/07/2015
22	ENTREVISTAS REALIZADAS	tecnico.PDF	08/06/2015
23	EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	AFICHE_DERECHOS_HUMANOS.pdf	07/01/2016
24	EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	AGENDA_DÍA_DE_LOS_DERECHOS_HUMANOS.pdf	07/01/2016
25	EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	INFORME_EVENTO_ARTE_Y_MEMORIA.pdf	07/01/2016
26	EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	RegistroEntregaRegriferios1.PDF	07/01/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
27	EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	RegistroEntregaTableros1.PDF	07/01/2016
28	Evidencias Diciembre 2014 TdP	Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_color_1.PDF	30/12/2014
29	Evidencias Diciembre 2014 TdP	Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_color_1.PDF	30/12/2014
30	Evidencias Junio 2014	EVIDENCIAS.PDF	02/10/2014
31	EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2014	evidencias_UPR_Noviembre_2014.PDF	02/12/2014
32	Evidencias Octubre 2014	Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_blanco_y_negro_10.PDF	07/12/2014
33	FOTO ENTREVISTA	Entrevista_Chambo.docx	04/09/2015
34	FOTO ENTREVISTA-	GUÍA_DE_ENTREVISTA_(Ministerio_Turismo).docx	04/09/2015
35	FOTO ENTREVISTA.	ENTREVISTA_Guamote.docx	04/09/2015
36	FOTOS EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2014	FOTOS_EVIDENCIAS.docx	02/12/2014
37	FOTOS PARTICIPACION TALLER AGOSTO 2015	TALLER_CINE_FOROTDP.rar	04/09/2015
38	FOTOS UBICACIÓN DE DOMICILIOS E IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS O A UN FAMILIAR CERCANO	FOTOS SOBRE UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DOMICILIOS (FOTOS).rar	04/09/2015
39	GENERAL. matriz financiera 2014 - 2015	Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx	01/06/2015
40	HITO 11, 12 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 2015	Trámites_administrativos.docx	08/05/2015
41	HITO 14 DOCUMENTO PRELIMINAR	FOLLETO-TRATA-DE-PERSONAS-OBSERVATORIO-OSCUNACH..pdf	04/09/2015
42	HITO 14 FOLLETO TDP PRELIMINAR	TRATA-DE-PERSONAS-_FOLLETO.pdf	14/10/2015
43	HITO 1: Recurso Humano-Administrativo Social.	RECURSO_HUMANO_TRATA_DE_PERSONAS_GPR..docx	10/06/2014
44	HITO 2: POA, PAC y PPC 2014	POA_PAC_y_PPC_2014.PDF	10/06/2014
45	HITO 3: Cédula Presupuestaria	TdP..docx	23/06/2014
46	HITO 4: Aprobada y Validada	Ficha.pdf	15/07/2014
47	HITO 5: Recurso Humano contratado	Cuatro_Pasantes.pdf	05/10/2014
48	Hito 6: Informe Cuatrimestral	Informe_Cuatrimstral.pdf	05/10/2014
49	HITO 7: Información recabada/ Se dispone de toda la información de VTdP desagregada M.I-Quito	Información_recabada.pdf	05/10/2014
50	INFORME DEL PERSONAL DEL PROYECTO	Informe_de_actividades_del_personal_del_proyecto.docx	03/07/2015
51	INFORME ENTREVISTAS	INFORME_ENTREVISTAS.docx	30/07/2015
52	INFORME TERMINACIÓN DE FUNCIONES	Informe_terminación_de_funciones.docx	10/03/2015
53	INFORME TÉCNICO CON CORTE A AGOSTO 2015	Informe_técnico_Agosto.docx	08/09/2015
54	INFORME TÉCNICO CON CORTE A DICIEMBRE 2015	Informe_Técnico_diciembre_TDP.pdf	07/01/2016
55	INFORME TÉCNICO CON CORTE A JUNIO 2015	Informe_técnico_junio.docx	03/07/2015
56	INFORME TÉCNICO CON CORTE A NOVIEMBRE 2015	INFORME_TECNICO_CON_CORTE_NOVIEMBRE.pdf	15/12/2015
57	INFORME TÉCNICO CON CORTE A OCTUBRE 2015	INFORME_TÉCNICO_OCTUBRE.docx	12/11/2015
58	INFORME TÉCNICO CON CORTE A SEPTIEMBRE 2015	INFORME_TÉCNICO_SEPTIEMBRE.docx	14/10/2015
59	INFORME TÉCNICO DE AVANCE P.T.P. 2015 CON CORTE A MAYO	Informe_Técnico_con_corte_a_Mayo.docx	08/06/2015
60	INFORME_CIERRE_PROYECTO	Informe_Cierre_Proyecto_TDP.PDF	14/07/2016
61	INFORME_CIERRE_PROYECTO	Of_Entrega_Inform_Cierre_Proyecto_VIF.PDF	14/07/2016
62	MAPEO DE VICTIMAS DE T.P	BASE_DE_TRATA_DE_PERSONAS_2012_01_VALIDADA_(05/06/2015_geografica).xlsx	05/06/2015
63	OFICIO ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 2015	ENTREGA_DE_POA-PAC-PPC_P.T.P.docx	09/03/2015
64	OFICIOS ENVIADOS AGOSTO 2015	Oficios_TDP-_Agosto.docx	04/09/2015
65	OFICIOS ENVIADOS SEPTIEMBRE	oficios_enviados.PDF	15/10/2015
66	OFICIOS RECIBIDOS SEPTIEMBRE	oficios_recibidos.PDF	15/10/2015
67	OFICIOS SOLICITANDO ENTREVISTAS	Oficios_solicitando_entrevistas_a_actores_sociales.docx	03/07/2015
68	PARTICIPACION EN FERIA ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO	EVIDENCIAS_FERIA_ABRAMOS_LOS_OJOS_LA_TRATA ES UN DELITO.rar	03/07/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
69	POA, PAC, PPC, RESUMEN DE PARTIDAS REFORMADOS JULIO 2015	INSTRUMENTOS_DE_PLANIF._REFORMADO_TDP.docx	28/10/2015
70	POA-PAC-PPC 2015	POAPACPPC_2015_P.T.P_ESCANEADOxls.docx	09/03/2015
71	PRÓRROGA_TDP	RESOLUCIÓN_PRORROGA.PDF	22/07/2016
72	RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	Oficio_dirigido_a_la_Coordinadora_de_Migración_de_Chimborazo	30/07/2015
73	RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	Oficio_dirigido_al_Director_del_Centro_de_Rehabilitación_Rico	30/07/2015
74	REFORMA INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN	SOLICITUD_DE_REFORMA_DEL_PROYECTO_TDP.docx	30/07/2015
75	Resumen Ejecutivo Abril 2014.	ABRIL_2014.docx	29/05/2014
76	Resumen Ejecutivo Agosto 2014	Resumen_Ejecutivo_Agosto.pdf	05/10/2014
77	Resumen Ejecutivo Enero-Marzo 2014.	ENERO-MARZO_2014..PDF	19/05/2014
78	Resumen Ejecutivo Julio 2014	RESUMEN_EJECUTIVO_JULIO_2014.PDF	05/08/2014
79	Resumen Ejecutivo Junio 2014	Junio_2014.docx	15/07/2014
80	Resumen Ejecutivo Junio-Diciembre 2013	TdP..JPG	19/05/2014
81	Resumen Ejecutivo Mayo 2014	MAYO_2014.PDF	10/06/2014
82	Resumen Ejecutivo Septiembre 2014	Resumen_Ejecutivo_Septiembre.pdf	05/10/2014
83	SOLICITUD PRÓRROGA	Socilitud_prórroga.pdf	07/01/2016
84	Taller "Atención Psicosocial a víctimas de Tdp"	ATENCIÓN_SICOSOCIAL_A_PERSONAS_VÍCTIMAS_TDP.	05/08/2014
85	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 2015	Oficio_TDP_enviados_noviembre.PDF	15/12/2015
86	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS OCTUBRE 2015	OFICIO.PDF	11/11/2015
87	Trámites para la solicitud de pago al personal	Oficios_solicitud_de_pago.pdf	03/07/2015
88	UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS DE TDP.	Caso_1_TDP_(Guamote).PDF	11/11/2015
89	UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS DE TDP.	Caso_2_TDP_(Guamote).PDF	11/11/2015

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Veloz Avendaño, Ana del Rocío	Directora del proyecto	Directora del Proyecto	anavelapci@hotmail.com aveloz@unach.edu.ec	
