



Universidad Nacional de Chimborazo
Vicerrectorado Académico
Dirección Académica

PROYECTO: 1002 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNACH

Líder del Proyecto:	Director, Académico (direccionacademica@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barba Maggi, Lida Mercedes	Programas Relacionados:	
Titular:	Velasco, Danny	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91800000.0000.385392	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2020 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	04/07/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Director, Académico	Fecha del siguiente Hito:	06/02/2022

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACIÓN DEL PROYECTO:
 SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
 PROPÓSITO:
 EL PROYECTO BUSCA FORTALECER LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA ALCANZAR EL ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD, LO QUE PERMITIRÁ QUE ESTE PREPARADA PARA CUALQUIER PROCESO DE EVALUACIÓN SEA INTERNO O EXTERNO.
 PRODUCTO:
 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA

Beneficios Cualitativos

EL PROYECTO BUSCA FORTALECER LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA ALCANZAR EL ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD, LO QUE PERMITIRÁ QUE ESTE PREPARADA PARA CUALQUIER PROCESO DE EVALUACIÓN SEA INTERNO O EXTERNO.

Tipo de Beneficiario

ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO


Restricciones

EL PROYECTO ESTÁ PLANIFICADO A EJECUTARSE EN EL LAPSO DE ABRIL DEL 2020 HASTA DICIEMBRE DEL 2022. EL COSTO SE ACTUALIZARÁ CADA AÑO SEGÚN LOS REQUIRIMIENTOS Y LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 85.07 %
 Fecha de Inicio: 01/04/2020 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

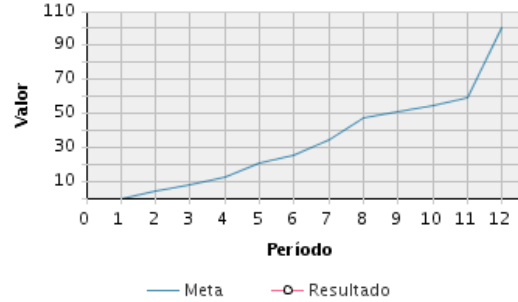

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	0 %	4 %	8 %	12 %	21 %	25 %	34 %	47 %	51 %	55 %	59 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
En el mes de marzo se revisaron y validaron 27 informes de los técnicos de apoyo académico de carrera que realizan actividades que aportan al fortalecimiento de la Gestión Académica para el Aseguramiento de la Calidad Institucional.	Director, Académico	05/04/2022 - 12:18 PM
En el mes de febrero se revisaron y validaron 27 informes de los técnicos de apoyo académico de carrera que realizan actividades que aportan al fortalecimiento de la Gestión Académica para el Aseguramiento de la Calidad Institucional.	Director, Académico	04/03/2022 - 04:41 PM
En el mes de enero se revisaron y validaron 27 informes de los técnicos de apoyo académico de carrera que realizan actividades que aportan al fortalecimiento de la Gestión Académica para el Aseguramiento de la Calidad Institucional.	Director, Académico	05/02/2022 - 01:19 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Organizacional.3. Económico. Posible falta de recursos en la asignación presupuestaria para las actividades del Proyecto	05/02/2022	Académico Director	30 %	40	12	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Ecuador > Chimborazo > Ríobamba

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	H01 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del	4. Ejecución	06/02/2022	06/02/2022	⚠	No	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mes de enero de los técnicos de apoyo académico de carrera.							
2	H02 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de febrero de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	05/03/2022	05/03/2022			No	4.0
3	H03 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de marzo de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	05/04/2022	05/04/2022			No	4.0
4	H04 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de abril de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	05/05/2022	05/05/2022			No	4.0
5	H05 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de las Matrices de alineación de la oferta académica de cada carrera con visión, misión y objetivo institucionales y el modelo educativo y pedagógico.	4. Ejecución	31/05/2022	31/05/2022			No	5.0
6	H06 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de mayo de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	05/06/2022	05/06/2022			No	4.0
7	H07 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de junio de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	05/07/2022	05/07/2022			No	4.0
8	H08 Reporte semestral realizado de Becas y Ayudas económicas otorgadas a los estudiantes	4. Ejecución	31/07/2022	31/07/2022			No	5.0
9	H09 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de julio de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	05/08/2022	05/08/2022			No	4.0
10	H10 Reporte semestral realizado de los cursos de capacitación del profesorado.	4. Ejecución	10/08/2022	10/08/2022			No	9.0
11	H11 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de agosto de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	05/09/2022	05/09/2022			No	4.0
12	H12 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de septiembre de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	05/10/2022	05/10/2022			No	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	H13 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de octubre de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	05/11/2022	05/11/2022			No	4.0
14	H14 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de noviembre de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	05/12/2022	05/12/2022			No	4.0
15	H15 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de las Matrices de alineación de la oferta académica de cada carrera con visión, misión y objetivo institucionales y el modelo educativo y pedagógico.	4. Ejecución	10/12/2022	10/12/2022			No	5.0
16	H16 Reporte anual realizado de los cursos de capacitación del profesorado.	4. Ejecución	31/12/2022	31/12/2022			No	9.0
17	H17 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de diciembre de los técnicos de apoyo académico de carrera.	4. Ejecución	31/12/2022	31/12/2022			No	4.0
18	H18 Reporte Final realizado de Becas y Ayudas económicas otorgadas a los estudiantes	4. Ejecución	31/12/2022	31/12/2022			No	5.0
19	H19 Adquisición realizada de entrenadores de soldadura para la capacitación de los estudiantes y como fortalecimiento de los laboratorios de docencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, 2021.	4. Ejecución	31/12/2022	31/12/2022			No	14.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial				
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Ppto. Programado				
Ppto. Programado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	H01 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de enero de los técnicos de apoyo académico de carrera.	Informe_de_revisión_y_validación_de_informes_-_Enero.pdf	05/02/2022
2	H02 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de enero de los técnicos de apoyo académico de carrera	Informe_de_revisión_y_validación_de_informes_-_Febrero.pdf	04/03/2022
3	H03 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de marzo de los técnicos de apoyo académico de carrera.	Informe_de_revisión_y_validación_de_informes_-_Marzo.pdf	04/04/2022
4	H04 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de marzo de los técnicos de apoyo académico de carrera.	Informe_de_revisión_y_validación_de_informes_-_Abril.pdf	09/05/2022
5	H05 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de las Matrices de alineación de la oferta académica de cada carrera con visión, misión y objetivo institucionales y el modelo educativo y pedagógico.	Informe_de_recopilación_de_matrices_de_alineación_2022_13105	13/05/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
6	H06 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de mayo de los técnicos de apoyo académico de carrera.	Informe_de_revisión_y_validación_de_informes_-_Mayo.pdf	07/06/2022
7	H07 Consolidación, revisión, validación y organización realizada de los informes del mes de junio de los técnicos de apoyo académico de carrera.	Informe_de_revisión_y_validación_de_informes_-_Mayo.pdf	04/07/2022
