



UNACH
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación
Instituto de Investigaciones ICITS

PROYECTO: I016 Becas Cuarto Nivel PhD

Líder del Proyecto:	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto (lcepeda@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barba Maggi, María Angélica	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:		Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91510000.727.7353	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,661,074.73
Tipo de Ppto. Externo:	Recursos Propios	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	18/04/2012 - 31/12/2016
Fecha de Última Actualización:	18/02/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Avendaño Herrera, Fernando Octavio	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2015


DATOS GENERALES

Descripción
<p>SITUACION ACTUAL: El mejoramiento académico de la UNACH está en función de la formación académica de los docentes y por tanto se requiere un programa que impulse y apoye para que los docentes titulares realicen estudios de Cuarto Nivel PhD.</p> <p>PROPOSITO: Desarrollar un programa de becas y ayudas económicas que brinde apoyo con el financiamiento para la realización de estudios en el exterior a nivel de Doctorado PhD a los Docentes titulares de la UNACH durante la ejecución del proyecto.</p> <p>PRODUCTOS Al menos 12 becas otorgadas por año a docentes agregados a tiempo completo de la UNACH para que cursen estudios Phd en el exterior.</p>
Beneficios Cualitativos
<p>Considerando la necesidad que tienen conforme a la Ley de Educación Superior los docentes de tener el grado de PhD, la UNACH ha formulado un programa de becas de 4to nivel; para lo cual inicialmente se prevee que se cuente con la reglamentación correspondiente que viabilice el financiamiento para otorgar becas a los docentes de la UNACH para que realicen estudios de PhD.</p> <p>La UNACH cumpla con los indicadores establecidos por los organismos de control de Educación Superior para la acreditación institucional y para su recategorización.</p> <p>Al término de la ejecución del proyecto se dispone de una nómina definitiva de al menos 36 docentes titulares de la UNACH que se benefician con las becas o ayudas económicas para estudios de PhD.</p> <p>La UNACH contará con una planta docente con alto nivel formativo que contribuye directamente al incremento del nivel académico.</p>
Restricciones
<p>TIEMPO: 5 años COSTO: 1.661.347,74 USD ALCANCE: Institucional dirigido a docentes titulares agregados y auxiliares.</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 62.40 %
 Fecha de Inicio: 18/04/2012 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

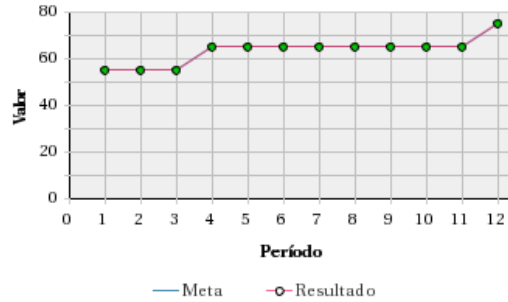

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	Avance programado acumulado											
	55 %	55 %	55 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	75 %
	Avance real acumulado											
	55 %	55 %	55 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	75 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
Durante el período comprendido entre los meses de enero a mayo del 2014 en el Proyecto Becas de Cuarto Nivel PhD se ha cumplido con: La obtención del Dictámen de Prioridad otorgado por la Señora Rectora de la Institución. La obtención del Dictámen Favorable otorgado por la SENPLADES. Se obtiene la Certificación Presupuestaria emitida por la Dirección Financiera de la UNACH. Se realiza la Convocatoria 2014 para la postulación a Becas Cuarto nivel PhD. El H. Consejo Universitario aprueba a dos Docentes de la UNACH la licencia con la remuneración total de funciones de Docentes para que realicen estudio de PhD en el exterior. Se adjunta listado de Docentes beneficiados en el año 2013 con becas y ayudas económicas para cursar estudio de PhD. Se realiza los primeros desembolsos a dos docentes becados. El avance técnico del proyecto se cumple de acuerdo a lo programada. Los beneficiarios de las becas y ayudas económicas presentan justificativos de los recursos entregados para solicitar el siguiente desembolso.	Avendaño Herrera, Fernando Octavio	08/12/2014 - 12:48 PM
PERIODO 2013: Se encuentra aprobado el Reglamento e Instructivo para el otorgamiento de Becas para cursar estudios de PhD en el exterior y Año Sabático para los Docentes agregados a tiempo completo de la UNACH. Se cumple la promoción y la convocatoria 2013 para la adjudicación de becas. Se encuentra aprobada la reforma el Reglamento vigente para incluir Ayudas Económicas a Docentes para cursar estudios de PhD en el exterior. El avance técnico es del 99%. Se han beneficiado a 31 docentes con el financiamiento de las becas y ayudas económicas; para realizar estudios de PhD en países de latinoamérica y Europa. Hasta la fecha se ha devengado el 100% del presupuesto del proyecto	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	24/03/2014 - 03:57 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Proyecto.2. Alcance. No aprobación de los estudios por parte de los becarios CAUSARIA el incumplimiento de las exigencias que tiene la	10/04/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	10 %	70	7	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
UNACH con los organismos de control de Educación Superior						

Riesgos cerrados: 0

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 Reglamento de Becas, revisado, analizado por el H. Consejo Universitario y APROBADO.	3. Planeación	18/04/2012		18/04/2012		Sí	15.0
2 Convocatoria 2012 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA	4. Ejecución	30/04/2012		30/04/2012		Sí	10.0
3 Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2012 ENTREGADO	4. Ejecución	19/12/2012		19/12/2012		Sí	10.0
4 Convocatoria 2013 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA	4. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	10.0
5 Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2013 ENTREGADO	4. Ejecución	18/12/2013		18/12/2013		Sí	10.0
6 Convocatoria 2014 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA	4. Ejecución	30/04/2014		30/04/2014		Sí	10.0
7 Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2014 ENTREGADO	4. Ejecución	30/12/2014		30/12/2014		Sí	10.0
8 Convocatoria 2015 para postulación de docentes a Becas para cursar estudios de PhD REALIZADA	4. Ejecución	30/04/2015	30/04/2015			No	5.0
9 Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2015 ENTREGADO	4. Ejecución	30/12/2015	30/12/2015			No	10.0
10 Adjudicación de Becas a postulantes seleccionados el 2016 ENTREGADO	4. Ejecución	30/12/2016	30/12/2016			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,661,074.73 **
Costo Total:	1,661,347.74
Total Devengado:	731,197.21
% Costo Total Devengado:	44.01 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 44.01 %

Perfil Económico 2014

	Años Previos	Año Actual (2014)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	461,347.74	400,000.00	800,000.00	1,661,347.74
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
Ppto. Codificado	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
Planeado - Codificado (2014)		0.00		
Ppto. Programado	461,347.74	400,000.00	800,000.00	1,661,347.74
Ppto. Devengado	461,074.73	270,122.48	0.00	731,197.21
Estimado a fin de año	* 461,074.73	400,000.00	0.00	861,074.73
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	273.01	0.00	800,000.00	800,273.01
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 99.94 %	67.53 %	0.00 %	44.01 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2014



Presupuesto Mensual 2014								
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual	
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	

Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	100,000.00	77,776.00	100,000.00	77,776.00	77.78 %		19.44 %
Oct	100,000.00	74,546.48	200,000.00	152,322.48	76.16 %		38.08 %
Nov	200,000.00	0.00	400,000.00	152,322.48	38.08 %		38.08 %
Dic	0.00	117,800.00	400,000.00	270,122.48	67.53 %		67.53 %
Total	400,000.00	270,122.48					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|---|
| 2 | Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos. |
|---|---|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Becas_entregadas_2014.pdf	Evidencia de comprobantes de pago de becas- año 2014	05/10/2014
2	certificacion_financiera_becas_2014.pdf		12/06/2014
3	CONVOCATORIA_BECAS_2014.pdf		12/06/2014
4	DICTAMEN_BECAS_2014.pdf		12/06/2014
5	DICTAMEN_FAVORABLE_BECAS_2014.pdf		12/06/2014
6	NOMINA_DE_BECADOS_2013.pdf		12/06/2014
7	POA_BECAS_2014.pdf		12/06/2014
8	RES_HCU_OTORGA_BECAS_2014.pdf		12/06/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	Director del proyecto
